

KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

# LAPORAN AKHIR

PEKERJAAN:

*PENGAWASAN TEKNIS :*

*LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA  
(RUAS PEKALOA-TOLE)*


KONSULTAN PENGAWAS



**TraxIAL Consultant**

PERENCANAAN, SURVEY, PENGUKURAN, PEMETAAN & PENGAWASAN

Dusun Muhajirin, Desa Komba,  
Kecamatan Larompong, Kab. Luwu  
Sulawesi Selatan



KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

# LAPORAN AKHIR

PEKERJAAN:

*PENGAWASAN TEKNIK :*

*LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA  
(RUAS PEKALOA-TOLE)*

KONSULTAN PENGAWAS



**TraxIAL Consultant**  
PERENCANAAN, SURVEY, PENGUKURAN, PEMETAAN & PENGAWASAN  
Dusun Muhajirin, Desa Komba,  
Kecamatan Larompon, Kab. Luwu  
Sulawesi Selatan

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur pada Allah SWT, Laporan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Pengawasan Teknis ini disusun untuk persyaratan dari tugas akhir atau laporan akhir dari konsultan pengawas sebagai tanda selesainya pekerjaan Konsultan Pengawas.

Secara umum Laporan Pengawasan Teknis ini berisi tentang :

A. Pengawasan Teknis pekerjaan;

➤ Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru-Mahalona (Ruas Pekaloa-Tole)

B. Dokumentasi Pengawasan

C. Lampiran-Lampirannya

Dan akhirnya, Kami dari CV. TRAXIAL CONSULTANT mengucapkan banyak terima kasih.

Malili, Desember 2022  
CV. TRAXIAL CONSULTANT

# DAFTAR ISI

|                     |  |
|---------------------|--|
| KATA PENGANTAR..... |  |
| DAFTAR ISI.....     |  |

## BAB. I PENDAHULUAN

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| 1.1 Latar Belakang .....                     |  |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....                  |  |
| 1.3 Acuan Kerja.....                         |  |
| 1.4 Nama dan Organisasi Penggunaan Jasa..... |  |
| 1.5 Sumber Pendanaan.....                    |  |
| 1.6 Lokasi Pekerjaan.....                    |  |
| 1.7 Metodologi.....                          |  |
| 1.8 Jangka Waktu Pelaksanaan.....            |  |
| 1.9 Tenaga Ahli.....                         |  |
| 1.10 Keluaran.....                           |  |
| 1.11 Laporan.....                            |  |
| 1.12 Sistematika Pembahasan.....             |  |

## BAB II PAKET PENGAWASAN

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1 Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru-Mahalona (Ruas Pekaloa-Tole) .. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran :

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Faktor Peningkatan Jalan sangat menunjang perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karenanya Jalan merupakan sarana yang sangat penting yang akan memberikan suatu layanan kepada masyarakat guna lebih mengembangkan wilayah sekitarnya dan juga mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Peningkatan Jalan di Kabupaten Luwu Timur, dalam upaya untuk menjaga agar Jalan tetap dalam keadaan/kondisi yang baik, dan mengusahakan agar Jalan yang bersangkutan tidak bertambah rusak agar dapat menunjang perkembangan perekonomian, dan menyediakan prasarana yang cukup dimasa yang akan datang.

### 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan adanya keterbatasan tenaga pihak Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap kelancaran pekerjaan maupun hasil pekerjaannya yang harus sesuai dengan ketentuan serta persyaratan-persyaratan dalam Dokumen Kontrak, maka untuk itu diperlukan adanya bantuan Jasa Konsultan yang akan bertugas di lokasi Pekerjaan.

Pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan mewujudkan merupakan upaya kepada masyarakat mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna jalan.

Pembangunan Peningkatan Jalan tersebut di atas, merupakan salah satu upaya Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur dalam menunjang kelancaran Jalan yang bersangkutan.

Pekerjaan dimaksud, berlokasi pada Wilayah yang menghubungkan daerah-daerah yang cukup potensial, sehingga diharapkan setelah selesainya pembangunan Jalan tersebut, secara tidak langsung dapat mempercepat peningkatan kemajuan pada semua sektor kehidupan masyarakat di daerah yang bersangkutan, sejalan dengan kemajuan/perkembangan ekonomi dan bidang lainnya di Kabupaten Luwu Timur.

Memenuhi hal tersebut di atas, Kegiatan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Luwu Timur akan mengupayakan untuk menyediakan Jasa Konsultan dengan peran sebagai Konsultan Pengawasan Teknis pada Proyek tersebut.

Tugas-tugas dan wewenang serta tanggung jawab Konsultan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan, selain diatur dalam Bab III Syarat-Syarat Umum Kontrak, juga tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja.

### 1.3 ACUAN KERJA

Jasa Konsultan yang dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja Ini, adalah untuk Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan.

Sasaran pengadaan Jasa Konsultan ini yaitu untuk membantu Pelaksanaan Kegiatan mengamati serta mengawasi pekerjaan dan menguji serta meneliti setiap bahan yang akan dipakai atau mutu pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor, sehingga hasil pekerjaan memenuhi persyaratan Kontrak dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan biaya dan tenaga Konsultan, Pelaksanaan Jasa akan diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tahapan atau tingkat kegiatan kontraktor di lokasi pekerjaan

#### 1.4 NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur

#### 1.5 SUMBER PENDANAAN

Untuk petaksanaan kegiatan ini dipertukan biaya kurang lebih **Rp. 98.851.000,- ( Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah,-)**, termasuk PPN dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2022

#### 1.6 LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG SERTA ALIH PENGETAHUAN

##### a. Lingkup Pekerjaan.

Lingkup jasa konsultan mencakup pekerjaan-pekerjaan, antara lain sebagai berikut :

- Mengadakan pemeriksaan keadaan pekerjaan serta mengadakan penilaian atas ketepatan rancangan yang ada untuk disesuaikan dengan keadaan/kebutuhan lapangan yang sebenarnya (rekayasa lapangan).
- Atas dasar data dari (a) di atas, membuat suatu program terperinci untuk kepentingan pemeriksaan/pengambilan data lapangan yang masih diperlukan (tambahan) dan menangani pengawasan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Kontraktor.
- Memeriksa gambar hasil perencanaan atau hasil survey ulang Kontraktor dan atas dasar gambar tersebut membuat gambar rencana teknis untuk diserahkan kepada Kontraktor pada waktu yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan Pinbagpro.
- Memeriksa serta memberikan rekomendasi atas jadwal pelaksanaan Kontraktor atau perubahan-perubahannya untuk pelaksanaan kontrak, serta setiap rencana atau programprogram serupa yang harus diajukan oleh Kontraktor untuk mendapatkan persetujuan dari Pelaksana Kegiatan.

- Menilai kecukupan pemakaian, antara lain bahan-bahan dan tenaga kerja yang disediakan oleh Kontraktor, serta cara kerja Kontraktor sehubungan dengan besarnya tingkat kemajuan yang ditargetkan, dan bila perlu, mengambil tindakan kemajuan yang tepat untuk meningkatkan laju pekerjaan.
- Melaksanakan pengawasan yang efektif dan terus menerus terhadap pekerjaan yang telah disetujui untuk dilaksanakan serta menjamin bahwa mutu pekerjaan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.
- Memeriksa serta membuat rekomendasi tertulis terhadap semua permintaan/tuntutan kontraktor untuk mendapatkan perpanjangan waktu, pembayaran tambahan. pekerjaan atau biaya tambahan atau hal-hal lain semacamnya.
- Menghitung kuantitas pekerjaan serta material yang telah disetujui dan diterima baik, kemudian memeriksa dan menerangkan dengan sebenarnya mengenai tagihan kontraktor yang berupa pembayaran bulanan dan pembayaran akhir.
- Melaporkan secara berkala tentang kemajuan pekerjaan, Cara pelaksanaan kontraktor. mutu pekerjaan serta status keuangan berikut apa yang dapat diantisipasi.
- Membuat usulan perubahan serta menyajikannya untuk mendapatkan persetujuan Pelaksana Kegiatan pada setiap adanya perubahan yang berkaitan dengan rencana yang mungkin dirasa perlu, seraya menunjukkan dampak apa saja yang diakibatkan oleh perubahan tersebut terhadap kontrak dan sekaligus menyiapkan semua perintah perubahan yang diperlukan.
- Menjamin bahwa "Shop drawing" (gambar sebenarnya terbangun/terpasang)" dibuat untuk semua pekerjaan dan bersama-sama Kontraktor mengupayakan untuk menyelesaikannya sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan.

- Menyerahkan Laporan akhir yang merupakan ringkasan kegiatan konstruksi seraya menampakkan, antara lain, realisasi pembayaran pekerjaan, prestasi kerja, hasil pengujian mutu pekerjaan selama pelaksanaan dan pada saat Serah Terima Pertama, perubahan kontrak, tuntutan atau perselisihan atau hal-hal penting lainnya yang ada dampaknya terhadap kuantitas, biaya serta pelaksanaan pekerjaan.

b. Lokasi Kegiatan antara lain :

Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur

c. Data dan Fasilitas Penunjang Penyediaan oleh pengguna jasa.

Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan harus dipelihara oleh penyedia jasa:

a.) Laporan dan Data

Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi (nyatakan bila ada laporan dan data Informasi yang dapat dipakai sebagai referensi oleh penyedia jasa)

b.) Akomodasi dan Ruang Kantor

akomodasi dan ruangan kantor yang akan disediakan oleh kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek misalnya ruangan kantor luas/ukurannya dan keadaannya atau harus disediakan oleh penyedia jasa sendiri dengan cara sewa)

c.) Staf Pengawas/Pendamping

(Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping (counterpart), atau project officer (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi).

d.) Fasilitas oleh penyedia jasa

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan

#### d. Alih Pengetahuan

Apabila dipandang perlu oleh pengguna jasa, maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf proyek

### 1.7 METODOLOGI

Penawaran Konsultan harus menggambarkan cara pendekatan dan metodologi yang akan dilaksanakan oleh konsultan yang tercakup dalam rencana kerja. Rencana kerja dilengkapi dengan jadwal pekerjaan dan jadwal penugasan personil, tugas masing-masing tenaga ahli, tempat tugas , serta pengaturan logistik / fasilitas pendukung. Tanggung jawab masing-masing tenaga ahli dan hubungan kerja antar tenaga ahli dalam melaksanakan tugas digambarkan dalam organisasi pelaksanaan yang mencakup struktur organisasi dan uraian tugas Organisasi konsultan harus menggambarkan juga hubungan kerja konsultan dengan organisasi Pekerjaan pengawasan Teknis Peningkatan Jalan (BM) Kabupaten Luwu Timur.

### 1.8 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari

### 1.9 TENAGA AHLI

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

#### a. Site Engineer

Site Engineer adalah Pemimpin Tim Konsultan atau Wakil Direksi Pekerjaan yang bertanggung jawab langsung kepada Pelaksana Kegiatan dimana timnya ditugaskan untuk melaksanakan Jasa.

Site Engineer adalah seorang Sarjana (S1) Teknik Sipil dari suatu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang telah disamakan atau perguruan tinggi internasional yang diakui. Untuk perguruan tinggi swasta yang belum disamakan, harus telah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Negara. Site Engineer harus memiliki pengalaman minimal 1 (Satu) tahun dalam bidang pengawasan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan (BM) sejak lulus.

Site Engineer harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Panitia Sertifikasi Tenaga Inti Konsultan Supervisi Direktorat Jenderal Peningkatan Jalan (BM), dan dinyatakan tulus sebagai "Site Engineer".

Tugas-tugas Site Engineer akan meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal yang tersebut di bawah ini:

- Mengkoordinir dan memimpin layanan pengawasan oleh tenaga ahli yang dibawah kendalanya/dipimpinnya (Quality Engineer/chief Inspector dan Quantity Engineer).
- Memeriksa dan menanda tangani berita acara pemeriksaan fisik dan segala laporan-laporan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana.
- Membuat pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pengengali Kegiatan jika terdapat perubahan lingkup kegiatan (CCO) pekerjaan fisik.
- Memeriksa dan menandatangani gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawing) dan gambar hasil pelaksanaan (As Built Drawing).
- Memeriksa dan menyetujui permintaan/usulan pelaksanaan suatu tahapan item pekerjaan secara bertahap ( Request sheet)
- Metasanakan ahli pengetahuan tentang manajemen proyek kepada kontraktor petaksana maupun pengawas lapangan.

#### b. Inspector

Inspector bertanggung jawab atas pengawasan teknis pekerjaan dan pengecekan semua pengukuran yang diselenggarakan untuk menentukan kuatitas pekerjaan dan bertanggung jawab kepada Site Engineer dan

### Quantity Engineer

Tugas - tugasnya tetap tidak terbatas kepada hal-hal sebagai berikut.

- berkedudukan dilokasi pekerjaan
- melakukan perjalanan untuk meninjau kemajuan pekerjaan yang merupakan kegiatan pengawasan hariannya
- setiap saat mengikuti petunjuk teknis dan nasehat Site Engineer dan Quantity Engineer dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

### 1.10 KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Laporan pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan.

### 1.11 LAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Penggun Jasa adalah :

#### a) Laporan Pendahuluan

Tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Jasa, Konsultan harus menyerahkan 2 (Dua) rangkap/buku laporan pertama yang isinya melaporkan mengenai jadual rencana kerja dan tahapan pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan terperinci termasuk kuantitas masing-masing pekerjaan serta personil-personil penejukung Konsultan yang telah disetujui aktif di lapangan.

#### b) Laporan Bulanan

Pada setiap akhir bulan kalender, Konsultan harus membuat kemajuan laporan bulanan sebanyak 2 (Dua) rangkap/buku setiap paket proyek. Laporan ini merupakan laporan singkat mengenai kemajuan kegiatan Kontraktor, keadaan cuaca, juga permasalahan yang dialami oleh Kontraktor/Konsultan bila ada (menyangkut administrasi, teknik atau keuangan) dan memberikan rekomendasi atau saran-saran bagaimana

menanggulangi/menyelesaikan permasalahan tersebut.

Buku laporan ini paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya.

c) Laporan Akhir

Pada akhir masa layanan jasa. Konsultan harus menyerahkan laporan akhir sebanyak 2 (Dua) set bersama-sama dengan Gambar Sebenarnya Terbangun/Terpasang (as built drawing) dan dilengkapi dengan foto dokumentasi proyek.

Isi laporan akhir secara garis besarnya harus menceritakan secara ringkas dan jelas mengenai metode pelaksanaan konstruksi, realisasi biaya proyek dan perubahan-perubahan kontrak yang terjadi, lokasi-lokasi sumber material dan hasil pengujian mutu pekerjaan, personil konsultan dan kontraktor yang terlibat, pelaksanaan pengawasan konstruksi yang telah dilaksanakan. rekomendasi tentang cara pemeliharaan di kemudian hari, segala permasalahan yang kemungkinan besar akan timbul pada pekerjaan yang baru saja dilaksanakan, dan saran-saran tentang perbaikan yang perlu dilakukan pada proyek-proyek berikutnya untuk pekerjaan yang serupa / sejenis yang akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.

Untuk memudahkan penjilidan dan penggunaannya, laporan akhir ini dibuat menjadi beberapa buku.

## 1.12 SISTEMATIKA PEMBAHASAN USULAN TEKNIS

### Sistematika Pembahasan

Dalam Usulan Teknis Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan (BM) Kabupaten Luwu Timur. Konsultan akan memaparkan pembahasan yang akan tersusun dalam bab-bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

## **BAB. I . PENDAHULUAN**

Didalam BAB ini dibahas tentang Uraian singkat latar belakang Pekerjaan, tujuan dan sasaran kegiatan, serta lingkup kegiatan secara garis besar.

## **BAB. II. PEKET PENGAWASAN**

Berisi tentang Paket pengawasan, laporan bulan, laporan mingguan, time scedule dan data-data pengawasan.

## BAB II

# PAKET PANGAWASAN

- LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA  
(RUAS PEKALOA-TOLE)



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGU DAN BULAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

**BULAN. 01**

**CV. TRAXIAL CONSULTANT**

**TA. 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN BULANAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

| BULAN   | 01        |
|---------|-----------|
| PERIODE | JULI 2022 |

| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |           |              | NILAI PEKERJAAN BULAN INI | BOBOT           |                          |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |           |              |                           | BOBOT INDIVIDU  | TERHADAP INDUK PEKERJAAN |       |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Bulan Lalu      | Bulan Ini | sd Bulan Ini |                           |                 |                          |       |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           |                 |                          |       |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | -                  | -         | 0,550        | 4.111.250,00              | 55,00           | 0,050                    |       |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           |                 |                          |       |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | -                  | -         | 0,600        | 420.000,00                | 60,00           | 0,005                    |       |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | -                  | -         | 0,195        | 117.000,00                | 19,50           | 0,001                    |       |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | -                  | -         | 0,195        | 663.975,00                | 19,50           | 0,008                    |       |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | -                  | -         | 0,195        | 2.142.993,98              | 19,50           | 0,026                    |       |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | -                  | -         | 0,195        | 624.000,00                | 19,50           | 0,008                    |       |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | -                  | -         | 0,195        | 68.250,00                 | 19,50           | 0,001                    |       |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | -                  | -         | 0,195        | 352.950,00                | 19,50           | 0,004                    |       |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | -                  | -         | 0,195        | 633.750,00                | 19,50           | 0,008                    |       |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | -                  | -         | 0,195        | 204.750,00                | 19,50           | 0,002                    |       |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |           |              |                           |                 |                          |       |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           |                 |                          |       |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | -         | -            | -                         | -               | -                        |       |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |           |              |                           |                 |                          |       |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           |                 |                          |       |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | -                  | -         | -            | -                         | -               | -                        |       |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | -                  | 120,0     | 116,2        | 231.815.544,12            | 11,444          | 2,810                    |       |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |           |              |                           |                 |                          |       |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           |                 |                          |       |
| 9.2.(1)               | Marka Jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -         | -            | -                         | -               | -                        |       |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |           |              |                           |                 |                          |       |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |           |              | 241.154.463,10            | JUMLAH          | 2,923                    |       |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |           |              | 26.526.990,94             | % Bulan Lalu    | -                        |       |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |           |              | 267.681.454,04            | % Bulan Ini     | 2,923                    |       |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |           |              | 267.681.454,04            | % sd. Bulan Ini | 2,923                    |       |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           | RENCANA         | 0,074                    |       |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           |                 | DEVIASI                  | 2,850 |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
(PPK)

WAHYUDDIN, ST  
NIP. 19790712 201001 1 017

Diketahui Oleh,  
Konsultan Supervisi  
TRAXIAL CONSULTAN  
Traxial ST  
Site Engineer



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN MINGGUAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

MINGGU KE- 01

PERIODE

29 Juni 2022

s.d

05 Juli 2022

| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI | BOBOT            |                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                            | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDIK PEKERJAAN |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | -                  | 0,020      | 0,020          | 14.000,00                  | 2,00             | 0,000                    |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | -                  | 0,015      | 0,015          | 9.000,00                   | 1,50             | 0,000                    |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | -                  | 0,015      | 0,015          | 51.075,00                  | 1,50             | 0,001                    |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | -                  | 0,015      | 0,015          | 164.845,69                 | 1,50             | 0,002                    |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | -                  | 0,015      | 0,015          | 48.000,00                  | 1,50             | 0,001                    |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | -                  | 0,015      | 0,015          | 5.250,00                   | 1,50             | 0,000                    |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | -                  | 0,015      | 0,015          | 27.150,00                  | 1,50             | 0,000                    |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | -                  | 0,015      | 0,015          | 48.750,00                  | 1,50             | 0,001                    |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | -                  | 0,015      | 0,015          | 15.750,00                  | 1,50             | 0,000                    |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |            |                |                            |                  |                          |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |            |                | 383.820,69                 | JUMLAH           | 0,005                    |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |            |                | 42.220,28                  | % Minggu Lalu    | -                        |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 426.040,97                 | % Minggu Ini     | 0,005                    |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 426.040,97                 | % sd. Minggu Ini | 0,005                    |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            | RENCANA          | 0,001                    |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            | DEVIASI          | 0,003                    |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

SURYADI, ST

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
Konsultan Supervisi  
CV. TRAXIAL CONSULTAN

SURYADI, ST  
TRAXIAL



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGUAN**

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
 NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
 NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
 KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

| KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | MINGGU KE-         |            |                | 02                            |                  |                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | PERIODE            |            |                | 06 Juli 2022 s.d 12 Juli 2022 |                  |                          |
| MATA PEMBAYARAN                             | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI    | BOBOT            |                          |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                               | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDUK PEKERJAAN |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                               |                  |                          |
|                                             | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |
| 1.2                                         | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | -                  | 0,350      | 0,350          | 2.616.250,00                  | 35,00            | 0,032                    |
| 1.19                                        | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |
|                                             | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 0,020              | 0,150      | 0,170          | 119.000,00                    | 17,00            | 0,001                    |
|                                             | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,015              | 0,020      | 0,035          | 21.000,00                     | 3,50             | 0,000                    |
|                                             | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,015              | 0,020      | 0,035          | 119.175,00                    | 3,50             | 0,001                    |
|                                             | 4 Asuransi dan Pertzinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,015              | 0,020      | 0,035          | 384.639,94                    | 3,50             | 0,005                    |
|                                             | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,015              | 0,020      | 0,035          | 112.000,00                    | 3,50             | 0,001                    |
|                                             | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,015              | 0,020      | 0,035          | 12.250,00                     | 3,50             | 0,000                    |
|                                             | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,015              | 0,020      | 0,035          | 63.350,00                     | 3,50             | 0,001                    |
|                                             | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,015              | 0,020      | 0,035          | 113.750,00                    | 3,50             | 0,001                    |
|                                             | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,015              | 0,020      | 0,035          | 36.750,00                     | 3,50             | 0,000                    |
|                                             | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |            |                |                               |                  |                          |
|                                             | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |
| 3.2.(2a)                                    | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | -          | -              | -                             | -                | -                        |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |
|                                             | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |            |                |                               |                  |                          |
|                                             | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |
| 5.3.(1)                                     | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | -                  | -          | -              | -                             | -                | -                        |
| 5.3.(3)                                     | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | -                  | -          | -              | -                             | -                | -                        |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |
|                                             | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |            |                |                               |                  |                          |
|                                             | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |
| 9.2.(1)                                     | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -          | -              | -                             | -                | -                        |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |
|                                             | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |            |                |                               |                  |                          |
| JUMLAH                                      |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |            |                | 3.598.164,94                  | JUMLAH           | 0,044                    |
| PPN 11 %                                    |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |            |                | 395.798,14                    | % Minggu Lalu    | 0,005                    |
| TOTAL                                       |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 3.993.963,09                  | % Minggu Ini     | 0,039                    |
| PEMBULATAN                                  |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 3.993.963,09                  | % sd. Minggu Ini | 0,044                    |
| KETERANGAN/ CATATAN :                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               | RENCANA          | 0,010                    |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               | DEVIASI          | 0,033                    |

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)

**SULAN ST**

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
 Konsultan Supervisi  
 TRAXIAL CONSULTAN

**Traxial**  
 Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGUAN**

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
 NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
 NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
 KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| MINGGU KE- | 03                            |
| PERIODE    | 13 Juli 2022 s.d 19 Juli 2022 |

| MATA PEMBAYARA<br>RAN | URAIAN PEKERJAAN                                                                                                    | SAT. | HARGA<br>SATUAN | ESTIMASI<br>VOLUME | JUMLAH<br>HARGA  | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |               |                      | NILAI PEKERJAAN<br>MINGGU INI | BOBOT             |                                |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |               |                      |                               | BOBOT<br>INDIVIDU | TERHADAP<br>INDUK<br>PEKERJAAN |       |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        | sd.Minggu<br>Lalu  | Minggu<br>Ini | s.d<br>Minggu<br>Ini |                               |                   |                                |       |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                                      |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |       |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                         | LS   | 7.475.000,0     | 1,00               | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,350              | 0,100         | 0,450                | 3.363.750,00                  | 45,00             | 0,041                          |       |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |       |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                                    | LS   | 700.000,0       | 1,00               | 700.000,00       | 0,008  | 0,170              | 0,200         | 0,370                | 259.000,00                    | 37,00             | 0,003                          |       |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                                | LS   | 600.000,0       | 1,00               | 600.000,00       | 0,007  | 0,035              | 0,010         | 0,045                | 27.000,00                     | 4,50              | 0,000                          |       |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan<br>Alat Pelindung Diri (APD)                                                       | LS   | 3.405.000,0     | 1,00               | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,035              | 0,010         | 0,045                | 153.225,00                    | 4,50              | 0,002                          |       |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                            | LS   | 10.989.712,7    | 1,00               | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,035              | 0,010         | 0,045                | 494.537,07                    | 4,50              | 0,006                          |       |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                            | LS   | 3.200.000,0     | 1,00               | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,035              | 0,010         | 0,045                | 144.000,00                    | 4,50              | 0,002                          |       |
|                       | 6 Pasilitas, sarana, prasarana, dan<br>alat kesehatan                                                               | LS   | 350.000,0       | 1,00               | 350.000,00       | 0,004  | 0,035              | 0,010         | 0,045                | 15.750,00                     | 4,50              | 0,0002                         |       |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                                       | LS   | 1.810.000,0     | 1,00               | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,035              | 0,010         | 0,045                | 81.450,00                     | 4,50              | 0,001                          |       |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait<br>Keselamatan Konstruksi sesuai<br>Lingkup pekerjaan dengan<br>kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0     | 1,00               | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,035              | 0,010         | 0,045                | 146.250,00                    | 4,50              | 0,002                          |       |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian<br>risiko Keselamatan Konstruksi                                                  | LS   | 1.050.000,0     | 1,00               | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,035              | 0,010         | 0,045                | 47.250,00                     | 4,50              | 0,001                          |       |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                                     |      |                 |                    | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |               |                      |                               |                   |                                |       |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                           |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |       |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                                 | m3   | 203.763,70      | 507,69             | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | -             | -                    | -                             | -                 | -                              |       |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                                     |      |                 |                    | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |               |                      |                               |                   |                                |       |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                                       |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |       |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                              | m3   | 2.985.117,87    | 2.030,76           | 6.062.057.975,52 | 73,480 | -                  | -             | -                    | -                             | -                 | -                              |       |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                                     | m3   | 1.994.970,26    | 1.015,38           | 2.025.652.901,79 | 24,554 | -                  | -             | -                    | -                             | -                 | -                              |       |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                                     |      |                 |                    | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |               |                      |                               |                   |                                |       |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                            |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |       |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                            | m2   | 212.961,8       | 121,85             | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -             | -                    | -                             | -                 | -                              |       |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                                     |      |                 |                    | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |               |                      |                               |                   |                                |       |
| JUMLAH                |                                                                                                                     |      |                 |                    | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |               |                      | 4.732.212,07                  | JUMLAH            | 0,057                          |       |
| PPN 11 %              |                                                                                                                     |      |                 |                    | 907.493.265,20   |        |                    |               |                      | 520.543,33                    | % Minggu Lalu     | 0,044                          |       |
| TOTAL                 |                                                                                                                     |      |                 |                    | 9.157.432.039,73 |        |                    |               |                      | 5.252.755,40                  | % Minggu Ini      | 0,014                          |       |
| PEMBULATAN            |                                                                                                                     |      |                 |                    | 9.157.432.039,73 |        |                    |               |                      | 5.252.755,40                  | % sd. Minggu Ini  | 0,057                          |       |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   | RENCANA                        | 0,033 |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   | DEVIASI                        | 0,024 |

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)

**SULAN ST**

Nip. 19810109 200604 1 009

Diketahui Oleh,  
 Konsultan Supervisi  
 L. CONSULTAN

**SURYADI ST**  
 Inspector



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN MINGGUAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

| KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | MINGGU KE-         |            |                | 04                            |                  |                          |       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------|
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | PERIODE            |            |                | 20 Juli 2022 s.d 26 Juli 2022 |                  |                          |       |
| MATA PEMBAYARAN                             | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI    | BOBOT            |                          |       |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                               | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDUK PEKERJAAN |       |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                               |                  |                          |       |
|                                             | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |       |
| 1.2                                         | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,450              | 0,100      | 0,550          | 4.111.250,00                  | 55,00            | 0,050                    |       |
| 1.19                                        | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |       |
|                                             | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 0,370              | 0,230      | 0,600          | 420.000,00                    | 60,00            | 0,005                    |       |
|                                             | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,045              | 0,150      | 0,195          | 117.000,00                    | 19,50            | 0,001                    |       |
|                                             | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,045              | 0,150      | 0,195          | 663.975,00                    | 19,50            | 0,008                    |       |
|                                             | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,045              | 0,150      | 0,195          | 2.142.993,98                  | 19,50            | 0,026                    |       |
|                                             | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,045              | 0,150      | 0,195          | 624.000,00                    | 19,50            | 0,008                    |       |
|                                             | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,045              | 0,150      | 0,195          | 68.250,00                     | 19,50            | 0,001                    |       |
|                                             | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,045              | 0,150      | 0,195          | 352.950,00                    | 19,50            | 0,004                    |       |
|                                             | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,045              | 0,150      | 0,195          | 633.750,00                    | 19,50            | 0,008                    |       |
|                                             | 9 Lain-lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                             | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,045              | 0,150      | 0,195          | 204.750,00                    | 19,50            | 0,002                    |       |
|                                             | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |            |                |                               |                  |                          |       |
|                                             | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |       |
| 3.2.(2a)                                    | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | -          | -              | -                             | -                | -                        |       |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |       |
|                                             | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |            |                |                               |                  |                          |       |
|                                             | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |       |
| 5.3.(1)                                     | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | -                  | -          | -              | -                             | -                | -                        |       |
| 5.3.(3)                                     | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,30        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | -                  | 116,20     | 116,20         | 231.815.544,12                | 11,44            | 2,810                    |       |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |       |
|                                             | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |            |                |                               |                  |                          |       |
|                                             | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |       |
| 9.2.(1)                                     | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -          | -              | -                             | -                | -                        |       |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  |                          |       |
|                                             | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |            |                |                               |                  |                          |       |
| JUMLAH                                      |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |            |                | 241.154.463,10                | JUMLAH           | 2,923                    |       |
| PPN 11 %                                    |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |            |                | 26.526.990,94                 | % Minggu Lalu    | 0,057                    |       |
| TOTAL                                       |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 267.681.454,04                | % Minggu Ini     | 2,866                    |       |
| PEMBULATAN                                  |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 267.681.454,04                | % sd. Minggu Ini | 2,923                    |       |
| KETERANGAN/ CATATAN :                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  | RENCANA                  | 0,074 |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                               |                  | DEVIASI                  | 2,850 |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

SULAN ST

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
Konsultan Supervisi  
TRAXIAL CONSULTAN  
  
Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGU DAN BULAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

**BULAN. 02**

**CV. TRAXIAL CONSULTANT**

**TA. 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN BULANAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

| KONSULTAN SUPERVISI   |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | : CV. TRAXIAL CONSULTAN |           |               | BULAN                     |                 | 02                       |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|-------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--|--|--|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | PERIODE                 |           |               | AGUSTUS                   |                 | 2022                     |  |  |  |
| MATA PEMDAYA RAN      | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN      |           |               | NILAI PEKERJAAN BULAN INI | BOBOT           |                          |  |  |  |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA       |           |               |                           | BOBOT INDIVIDU  | TERHADAP INDIK PEKERJAAN |  |  |  |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Bulan Lalu           | Bulan Ini | s.d Bulan Ini |                           |                 |                          |  |  |  |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                         |           |               |                           |                 |                          |  |  |  |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,550                   |           | 0,550         | 4.111.250,00              | 55,00           | 0,050                    |  |  |  |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                         |           |               |                           |                 |                          |  |  |  |
|                       | 1 Penyelapan RKK,                                                                                          | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 0,600                   |           | 0,600         | 420.000,00                | 60,00           | 0,005                    |  |  |  |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,195                   |           | 0,195         | 117.000,00                | 19,50           | 0,001                    |  |  |  |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,195                   |           | 0,195         | 663.975,00                | 19,50           | 0,008                    |  |  |  |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,195                   |           | 0,195         | 2.142.993,98              | 19,50           | 0,026                    |  |  |  |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,195                   |           | 0,195         | 624.000,00                | 19,50           | 0,008                    |  |  |  |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,195                   |           | 0,195         | 68.250,00                 | 19,50           | 0,001                    |  |  |  |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,195                   |           | 0,195         | 352.950,00                | 19,50           | 0,004                    |  |  |  |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,195                   |           | 0,195         | 633.750,00                | 19,50           | 0,008                    |  |  |  |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,195                   |           | 0,195         | 204.750,00                | 19,50           | 0,002                    |  |  |  |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                         |           |               |                           |                 |                          |  |  |  |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                         |           |               |                           |                 |                          |  |  |  |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | -                       | -         | -             | -                         | -               | -                        |  |  |  |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                         |           |               |                           |                 |                          |  |  |  |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                         |           |               |                           |                 |                          |  |  |  |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | -                       | 428,70    | 428,70        | 1.279.720.032,95          | 21,11           | 15,512                   |  |  |  |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 116,20                  | 182,40    | 298,60        | 595.698.119,40            | 29,41           | 7,221                    |  |  |  |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                         |           |               |                           |                 |                          |  |  |  |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                         |           |               |                           |                 |                          |  |  |  |
| 9.2.(1)               | Marka Jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                       | -         | -             | -                         | -               | -                        |  |  |  |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                         |           |               |                           |                 |                          |  |  |  |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                         |           |               | 1.884.757.071,32          | JUMLAH          | 22,846                   |  |  |  |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                         |           |               | 207.323.277,85            | % Bulan Lalu    | 2,923                    |  |  |  |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                         |           |               | 2.092.080.349,17          | % Bulan Ini     | 19,923                   |  |  |  |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                         |           |               | 2.092.080.349,17          | % sd. Bulan Ini | 22,846                   |  |  |  |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                         |           |               |                           | RENCANA         | 0,171                    |  |  |  |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                         |           |               |                           | DEVIASI         | 22,675                   |  |  |  |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
(PPK)

WAHYUDIN ST  
NIP. 19790712 201001 1 017

Diketahui Oleh,  
Konsultan Supervisi  
TRAXIAL CONSULTAN  
Site Engineer



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGUAN**

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
 NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
 NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
 KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| MINGGU KE- | 05                               |
| PERIODE    | 27 Juli 2022 s.d 02 Agustus 2022 |

|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | PERIODE            |            |                | 27 Juli 2022               | s.d              | 02 Agustus 2022          |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|
| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI | BOBOT            |                          |       |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                            | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDUK PEKERJAAN |       |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                            |                  |                          |       |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |       |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,55               | -          | 0,550          | 4.111.250,00               | 55,00            | 0,050                    |       |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |       |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 0,600              | -          | 0,600          | 420.000,00                 | 60,00            | 0,005                    |       |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,195              | -          | 0,195          | 117.000,00                 | 19,50            | 0,001                    |       |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,195              | -          | 0,195          | 663.975,00                 | 19,50            | 0,008                    |       |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,195              | -          | 0,195          | 2.142.993,98               | 19,50            | 0,026                    |       |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,195              | -          | 0,195          | 624.000,00                 | 19,50            | 0,008                    |       |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,195              | -          | 0,195          | 68.250,00                  | 19,50            | 0,001                    |       |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,195              | -          | 0,195          | 352.950,00                 | 19,50            | 0,004                    |       |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,195              | -          | 0,195          | 633.750,00                 | 19,50            | 0,008                    |       |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,195              | -          | 0,195          | 204.750,00                 | 19,50            | 0,002                    |       |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |            |                |                            |                  |                          |       |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |       |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |       |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |            |                |                            |                  |                          |       |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |       |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |       |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | -                  | 128,40     | 128,40         | 256.154.181,28             | 12,65            | 3,105                    |       |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |            |                |                            |                  |                          |       |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |       |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |       |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |            |                |                            |                  |                          |       |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |            |                | 265.493.100,26             | JUMLAH           | 3,218                    |       |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |            |                | 29.204.241,03              | % Minggu Lalu    | 2,923                    |       |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 294.697.341,29             | % Minggu Ini     | 0,295                    |       |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 294.697.341,29             | % sd. Minggu Ini | 3,218                    |       |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            | RENCANA          | 0,114                    |       |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  | DEVIASI                  | 3,104 |

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)

**SULAN ST**

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
 Konsultan Supervisi  
**TRAXIAL CONSULTAN**  
  
**Traxial ST**  
 Inspector



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN MINGGUAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

| MINGGU KE- | 06                                  |
|------------|-------------------------------------|
| PERIODE    | 03 Agustus 2022 s.d 09 Agustus 2022 |

| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI | BOBOT            |                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                            | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDUK PEKERJAAN |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,550              | -          | 0,550          | 4.111.250,00               | 55,00            | 0,050                    |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 0,600              | -          | 0,600          | 420.000,00                 | 60,00            | 0,005                    |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,195              | -          | 0,195          | 117.000,00                 | 19,50            | 0,001                    |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,195              | -          | 0,195          | 663.975,00                 | 19,50            | 0,008                    |
|                       | 4 Asuransi dan Pertizinan                                                                                  | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,195              | -          | 0,195          | 2.142.993,98               | 19,50            | 0,026                    |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,195              | -          | 0,195          | 624.000,00                 | 19,50            | 0,008                    |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,195              | -          | 0,195          | 68.250,00                  | 19,50            | 0,001                    |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,195              | -          | 0,195          | 352.950,00                 | 19,50            | 0,004                    |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,195              | -          | 0,195          | 633.750,00                 | 19,50            | 0,008                    |
|                       | 9 Lain-lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                             | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,195              | -          | 0,195          | 204.750,00                 | 19,50            | 0,002                    |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 128,40             | 170,20     | 298,60         | 595.698.119,40             | 29,41            | 7,221                    |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |            |                |                            |                  |                          |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |            |                | 605.037.038,37             | JUMLAH           | 7,334                    |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |            |                | 66.554.074,22              | % Minggu Lalu    | 3,218                    |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 671.591.112,60             | % Minggu Ini     | 4,116                    |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 671.591.112,60             | % sd. Minggu Ini | 7,334                    |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            | RENCANA          | 0,129                    |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            | DEVIASI          | 7,205                    |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

SULAN ST

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
Konsultan Supervisi  
TRAXIAL CONSULTAN  
  
SURYADI ST  
Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**




**LAPORAN MINGGUAN**

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
 NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
 NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
 KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

| KONTRAKTOR PELAKSANA |                                                                                                            | : CV. GATRA BUANA       |              | MINGGU KE-      |                  | 08                                  |                    |            |                |                            |                  |                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| KONSULTAN SUPERVISI  |                                                                                                            | : CV. TRAXIAL CONSULTAN |              | PERIODE         |                  | 17 Agustus 2022 s.d 23 Agustus 2022 |                    |            |                |                            |                  |                          |
| MATA PEMBAYARAN      | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT.                    | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT                               | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI | BOBOT            |                          |
|                      |                                                                                                            |                         |              |                 |                  |                                     | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                            | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDIK PEKERJAAN |
|                      |                                                                                                            |                         |              |                 |                  |                                     | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                            |                  |                          |
|                      | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |                         |              |                 |                  |                                     |                    |            |                | 4.111.250,00               | 55,00            | 0,050                    |
| 1.2                  | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS                      | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091                               | 0,550              | -          | 0,550          |                            |                  |                          |
| 1.19                 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |                         |              |                 |                  |                                     |                    |            |                | 420.000,00                 | 60,00            | 0,005                    |
|                      | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS                      | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008                               | 0,600              | -          | 0,600          | 117.000,00                 | 19,50            | 0,001                    |
|                      | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS                      | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007                               | 0,195              | -          | 0,195          | 663.975,00                 | 19,50            | 0,008                    |
|                      | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS                      | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041                               | 0,195              | -          | 0,195          | 2.142.993,98               | 19,50            | 0,026                    |
|                      | 4 Asuransi dan Pertzinan                                                                                   | LS                      | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133                               | 0,195              | -          | 0,195          | 624.000,00                 | 19,50            | 0,008                    |
|                      | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS                      | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039                               | 0,195              | -          | 0,195          | 68.250,00                  | 19,50            | 0,001                    |
|                      | 6 Pasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS                      | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004                               | 0,195              | -          | 0,195          | 352.950,00                 | 19,50            | 0,004                    |
|                      | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS                      | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022                               | 0,195              | -          | 0,195          | 633.750,00                 | 19,50            | 0,008                    |
|                      | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS                      | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039                               | 0,195              | -          | 0,195          | 204.750,00                 | 19,50            | 0,002                    |
|                      | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS                      | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013                               | 0,195              | -          | 0,195          |                            |                  |                          |
|                      | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |                         |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398                               |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                      | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |                         |              |                 |                  |                                     |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 3.2.(2a)             | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3                      | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254                               | -                  | -          | -              |                            |                  |                          |
|                      | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |                         |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254                               |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                      | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |                         |              |                 |                  |                                     |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 5.3.(1)              | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3                      | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480                              | 50,70              | 147,30     | 198,00         | 591.053.339,22             | 9,75             | 7,164                    |
| 5.3.(3)              | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus                                                                            | m3                      | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554                              | 298,60             | -          | 298,60         | 595.698.119,40             | 29,41            | 7,221                    |
|                      | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |                         |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034                              |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                      | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |                         |              |                 |                  |                                     |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 9.2.(1)              | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2                      | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315                               | -                  | -          | -              |                            |                  |                          |
|                      | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |                         |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315                               |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                      |                                                                                                            |                         |              |                 | JUMLAH           | 8.249.938.774,54                    | 100,00             |            |                | 1.196.090.377,59           | JUMLAH           | 14,498                   |
|                      |                                                                                                            |                         |              |                 | PPN 11 %         | 907.493.265,20                      |                    |            |                | 131.569.941,54             | % Minggu Lalu    | 9,168                    |
|                      |                                                                                                            |                         |              |                 | TOTAL            | 9.157.432.039,73                    |                    |            |                | 1.327.660.319,13           | % Minggu Ini     | 5,330                    |
|                      |                                                                                                            |                         |              |                 | PEMBULATAN       | 9.157.432.039,73                    |                    |            |                | 1.327.660.319,13           | % sd. Minggu Ini | 14,498                   |
|                      |                                                                                                            |                         |              |                 |                  |                                     |                    |            |                |                            | RENCANA          | 0,157                    |
|                      |                                                                                                            |                         |              |                 |                  |                                     |                    |            |                | DEVIASI                    | 14,341           |                          |

KETERANGAN/ CATATAN :

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)

  
 SUTAN ST

Nip. 19810109 200604 1 009

Diketahui Oleh,  
 Kepala Kantor Supervisi  
 TRAXIAL CONSULTAN  
  
 Inspector



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN MINGGUAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | MINGGU KE-         |            |                | 09                                  |                  |                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | PERIODE            |            |                | 24 Agustus 2022 s.d 27 Agustus 2022 |                  |                          |
| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI          | BOBOT            |                          |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                                     | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDIK PEKERJAAN |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                                     |                  |                          |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                     |                  |                          |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,550              | -          | 0,550          | 4.111.250,00                        | 55,00            | 0,050                    |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        | -                  | -          | -              |                                     |                  |                          |
|                       | 1 Penyalpan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 0,600              | -          | 0,600          | 420.000,00                          | 60,00            | 0,005                    |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,195              | -          | 0,195          | 117.000,00                          | 19,50            | 0,001                    |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,195              | -          | 0,195          | 663.975,00                          | 19,50            | 0,008                    |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,195              | -          | 0,195          | 2.142.993,98                        | 19,50            | 0,026                    |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,195              | -          | 0,195          | 624.000,00                          | 19,50            | 0,008                    |
|                       | 6 Pasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,195              | -          | 0,195          | 68.250,00                           | 19,50            | 0,001                    |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,195              | -          | 0,195          | 352.950,00                          | 19,50            | 0,004                    |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,195              | -          | 0,195          | 633.750,00                          | 19,50            | 0,008                    |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,195              | -          | 0,195          | 204.750,00                          | 19,50            | 0,002                    |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |            |                |                                     |                  |                          |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                     |                  |                          |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | -          | -              | -                                   | -                | -                        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |            |                |                                     |                  |                          |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                     |                  |                          |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | 198,00             | 230,70     | 428,70         | 1.279.720.032,95                    | 21,11            | 15,512                   |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 298,60             | -          | 298,60         | 595.698.119,40                      | 29,41            | 7,221                    |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |            |                |                                     |                  |                          |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                     |                  |                          |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -          | -              | -                                   | -                | -                        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |            |                |                                     |                  |                          |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |            |                | 1.884.757.071,32                    | JUMLAH           | 22,846                   |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |            |                | 207.323.277,85                      | % Minggu Lalu    | 14,498                   |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 2.092.080.349,17                    | % Minggu Ini     | 8,348                    |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 2.092.080.349,17                    | % sd. Minggu Ini | 22,846                   |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                     | RENCANA          | 0,171                    |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                     | DEVIASI          | 22,675                   |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

SYULAN ST

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
Konsultan Supervisi  
CV. TRAXIAL CONSULTAN  
  
SURYANA ST  
Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGU DAN BULAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

**BULAN. 03**

**CV. TRAXIAL CONSULTANT**

**TA. 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN BULANAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  | BULAN              |           |               | 03                        |                 |                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|---------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  | PERIODE            |           |               | SEPTEMBER 2022            |                 |                          |
| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT            | KEMAJUAN PEKERJAAN |           |               | NILAI PEKERJAAN BULAN INI | BOBOT           |                          |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  | VOLUME TERLAKSANA  |           |               |                           | BOBOT INDIVIDU  | TERHADAP INDUK PEKERJAAN |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  | sd.Bulan Lalu      | Bulan Ini | s.d Bulan Ini |                           |                 |                          |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                 |                          |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091            | 0,55               | -         | 0,550         | 4.111.250,00              | 55,00           | 0,050                    |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                 |                          |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008            | 0,60               | 0,40      | 1,000         | 700.000,00                | 100,00          | 0,008                    |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007            | 0,20               | 0,25      | 0,445         | 267.000,00                | 44,50           | 0,003                    |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041            | 0,20               | 0,25      | 0,445         | 1.515.225,00              | 44,50           | 0,018                    |
|                       | 4 Asuransi dan Pertizinan                                                                                  | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133            | 0,20               | 0,25      | 0,445         | 4.890.422,15              | 44,50           | 0,059                    |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039            | 0,20               | 0,25      | 0,445         | 1.424.000,00              | 44,50           | 0,017                    |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004            | 0,20               | 0,25      | 0,445         | 155.750,00                | 44,50           | 0,002                    |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022            | 0,20               | 0,25      | 0,445         | 805.450,00                | 44,50           | 0,010                    |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039            | 0,20               | 0,25      | 0,445         | 1.446.250,00              | 44,50           | 0,018                    |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013            | 0,20               | 0,25      | 0,445         | 467.250,00                | 44,50           | 0,006                    |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398            |                    |           |               |                           |                 |                          |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                 |                          |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254            | -                  | -         | -             | -                         | -               | -                        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254            |                    |           |               |                           |                 |                          |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                 |                          |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480           | 428,70             | 174,90    | 603,60        | 1.801.817.149,26          | 29,72           | 21,840                   |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554           | 298,60             | 589,60    | 888,20        | 1.771.932.584,22          | 87,47           | 21,478                   |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034           |                    |           |               |                           |                 |                          |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                 |                          |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315            | -                  | -         | -             | -                         | -               | -                        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315            |                    |           |               |                           |                 |                          |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 |                  | 8.249.938.774,54 | 100,00             |           |               | 3.589.532.330,63          | JUMLAH          | 43,510                   |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 |                  | 907.493.265,20   |                    |           |               | 394.848.556,37            | % Bulan Lalu    | 22,846                   |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 |                  | 9.157.432.039,73 |                    |           |               | 3.984.380.887,00          | % Bulan Ini     | 20,664                   |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 |                  | 9.157.432.039,73 |                    |           |               | 3.984.380.887,00          | % sd. Bulan Ini | 43,510                   |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                 |                          |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           | RENCANA         | 8,401                    |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           | DEVIASI         | 35,109                   |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Penandatangan Kontrak  
(PPK)

WAHYUDDIN, ST

NIP. 19790712 201001 1 017

Dikerjakan Oleh,  
Konsultan Supervisi  
CV. TRAXIAL CONSULTAN

TRAXIAL  
Site Engineer



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN MINGGUAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |                  | MINGGU KE-         |               |                      | 10                                    |                   |                                |        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |                  | PERIODE            |               |                      | 31 Agustus 2022 s.d 06 September 2022 |                   |                                |        |
| MATA PEMBAYARA<br>RAN | URAIAN PEKERJAAN                                                                                                    | SAT. | HARGA<br>SATUAN | ESTIMASI<br>VOLUME | JUMLAH<br>HARGA  | BOBOT            | KEMAJUAN PEKERJAAN |               |                      | NILAI PEKERJAAN<br>MINGGU INI         | BOBOT             |                                |        |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |                  | VOLUME TERLAKSANA  |               |                      |                                       | BOBOT<br>INDIVIDU | TERHADAP<br>INDUK<br>PEKERJAAN |        |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |                  | sd.Minggu<br>Lalu  | Minggu<br>Ini | s.d<br>Minggu<br>Ini |                                       |                   |                                |        |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                                      |      |                 |                    |                  |                  |                    |               |                      |                                       |                   |                                |        |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                         | LS   | 7.475.000,0     | 1,00               | 7.475.000,00     | 0,091            | 0,550              | -             | 0,550                | 4.111.250,00                          | 55,00             | 0,050                          |        |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                                     |      |                 |                    |                  |                  |                    |               |                      |                                       |                   |                                |        |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                                    | LS   | 700.000,0       | 1,00               | 700.000,00       | 0,008            | 0,600              | -             | 0,600                | 420.000,00                            | 60,00             | 0,005                          |        |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                                | LS   | 600.000,0       | 1,00               | 600.000,00       | 0,007            | 0,195              | -             | 0,195                | 117.000,00                            | 19,50             | 0,001                          |        |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan<br>Alat Pelindung Diri (APD)                                                       | LS   | 3.405.000,0     | 1,00               | 3.405.000,00     | 0,041            | 0,195              | -             | 0,195                | 663.975,00                            | 19,50             | 0,008                          |        |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                            | LS   | 10.989.712,7    | 1,00               | 10.989.712,70    | 0,133            | 0,195              | -             | 0,195                | 2.142.993,98                          | 19,50             | 0,026                          |        |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                            | LS   | 3.200.000,0     | 1,00               | 3.200.000,00     | 0,039            | 0,195              | -             | 0,195                | 624.000,00                            | 19,50             | 0,008                          |        |
|                       | 6 Pasilitas, sarana, prasarana, dan<br>alat kesehatan                                                               | LS   | 350.000,0       | 1,00               | 350.000,00       | 0,004            | 0,195              | -             | 0,195                | 68.250,00                             | 19,50             | 0,001                          |        |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                                       | LS   | 1.810.000,0     | 1,00               | 1.810.000,00     | 0,022            | 0,195              | -             | 0,195                | 352.950,00                            | 19,50             | 0,004                          |        |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait<br>Keselamatan Konstruksi sesuai<br>Lingkup pekerjaan dengan<br>kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0     | 1,00               | 3.250.000,00     | 0,039            | 0,195              | -             | 0,195                | 633.750,00                            | 19,50             | 0,008                          |        |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian<br>risiko Keselamatan Konstruksi                                                  | LS   | 1.050.000,0     | 1,00               | 1.050.000,00     | 0,013            | 0,195              | -             | 0,195                | 204.750,00                            | 19,50             | 0,002                          |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                                     |      |                 |                    | 32.829.712,70    | 0,398            |                    |               |                      |                                       |                   |                                |        |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                           |      |                 |                    |                  |                  |                    |               |                      |                                       |                   |                                |        |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                                 | m3   | 203.763,70      | 507,69             | 103.448.792,85   | 1,254            | -                  | -             | -                    | -                                     | -                 | -                              |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                                     |      |                 |                    | 103.448.792,85   | 1,254            |                    |               |                      |                                       |                   |                                |        |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                                       |      |                 |                    |                  |                  |                    |               |                      |                                       |                   |                                |        |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                              | m3   | 2.985.117,87    | 2.030,76           | 6.062.057.975,52 | 73,480           | 428,70             | 174,90        | 603,60               | 1.801.817.149,26                      | 29,72             | 21,840                         |        |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                                     | m3   | 1.994.970,26    | 1.015,38           | 2.025.652.901,79 | 24,554           | 298,60             | 17,60         | 316,20               | 630.809.595,96                        | 31,14             | 7,646                          |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                                     |      |                 |                    | 8.087.710.877,31 | 98,034           |                    |               |                      |                                       |                   |                                |        |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                            |      |                 |                    |                  |                  |                    |               |                      |                                       |                   |                                |        |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                            | m2   | 212.961,8       | 121,85             | 25.949.391,67    | 0,315            | -                  | -             | -                    | -                                     | -                 | -                              |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                                     |      |                 |                    | 25.949.391,67    | 0,315            |                    |               |                      |                                       |                   |                                |        |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    | JUMLAH           | 8.249.938.774,54 | 100,00             |               |                      |                                       | 2.441.965.664,19  | JUMLAH                         | 29,600 |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    | PPN 11 %         | 907.493.265,20   |                    |               |                      |                                       | 268.616.223,06    | % Minggu Lalu                  | 22,846 |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    | TOTAL            | 9.157.432.039,73 |                    |               |                      |                                       | 2.710.581.887,25  | % Minggu Ini                   | 6,754  |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    | PEMBULATAN       | 9.157.432.039,73 |                    |               |                      |                                       | 2.710.581.887,25  | % sd. Minggu Ini               | 29,600 |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |                  |                    |               |                      |                                       |                   | RENCANA                        | 0,185  |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |                  |                    |               |                      |                                       |                   | DEVIASI                        | 29,415 |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |                  |                    |               |                      |                                       |                   |                                |        |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

SULAN ST

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
Konsultan Supervisi  
CV. TRAXIAL CONSULTAN  
  
SURYADI ST  
Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGUAN**

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
 NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
 NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
 KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| MINGGU KE- | 11                                      |
| PERIODE    | 07 September 2022 s.d 13 September 2022 |

| MATA PEMBARAN         | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA            | BOBOT         | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI | BOBOT                   |                          |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                         |               | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                            | BOBOT INDIVIDU          | TERHADAP INDIK PEKERJAAN |  |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                         |               | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                            |                         |                          |  |
|                       | <b>DIVISI 1. UMUM</b>                                                                                      |      |              |                 |                         |               |                    |            |                |                            |                         |                          |  |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00            | 0,091         | 0,55               | -          | 0,55           | 4.111.250,00               | 55,00                   | 0,050                    |  |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                         |               |                    |            |                |                            |                         |                          |  |
|                       | 1 Penyalpan RKK                                                                                            | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00              | 0,008         | 0,60               | 0,40       | 1,00           | 700.000,00                 | 100,00                  | 0,008                    |  |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00              | 0,007         | 0,20               | 0,25       | 0,45           | 267.000,00                 | 44,50                   | 0,003                    |  |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00            | 0,041         | 0,20               | 0,25       | 0,45           | 1.515.225,00               | 44,50                   | 0,018                    |  |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70           | 0,133         | 0,20               | 0,25       | 0,45           | 4.890.422,15               | 44,50                   | 0,059                    |  |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00            | 0,039         | 0,20               | 0,25       | 0,45           | 1.424.000,00               | 44,50                   | 0,017                    |  |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00              | 0,004         | 0,20               | 0,25       | 0,45           | 155.750,00                 | 44,50                   | 0,002                    |  |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00            | 0,022         | 0,20               | 0,25       | 0,45           | 805.450,00                 | 44,50                   | 0,010                    |  |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00            | 0,039         | 0,20               | 0,25       | 0,45           | 1.446.250,00               | 44,50                   | 0,018                    |  |
|                       | 9 Lain-lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                             | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00            | 0,013         | 0,20               | 0,25       | 0,45           | 467.250,00                 | 44,50                   | 0,006                    |  |
|                       | <i>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1</i>                                                                     |      |              |                 | <b>32.829.712,70</b>    | <b>0,398</b>  |                    |            |                |                            |                         |                          |  |
|                       | <b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>                                                                           |      |              |                 |                         |               |                    |            |                |                            |                         |                          |  |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85          | 1,254         | -                  | -          | -              | -                          | -                       | -                        |  |
|                       | <i>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3</i>                                                                     |      |              |                 | <b>103.448.792,85</b>   | <b>1,254</b>  |                    |            |                |                            |                         |                          |  |
|                       | <b>DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR</b>                                                                       |      |              |                 |                         |               |                    |            |                |                            |                         |                          |  |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52        | 73,480        | 603,60             | -          | 603,60         | 1.801.817.149,26           | 29,72                   | 21,840                   |  |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79        | 24,554        | 316,20             | 145,90     | 462,10         | 921.875.756,78             | 45,51                   | 11,174                   |  |
|                       | <i>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5</i>                                                                     |      |              |                 | <b>8.087.710.877,31</b> | <b>98,034</b> |                    |            |                |                            |                         |                          |  |
|                       | <b>DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN</b>                                                            |      |              |                 |                         |               |                    |            |                |                            |                         |                          |  |
| 9.2.(1)               | Marka Jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67           | 0,315         | -                  | -          | -              | -                          | -                       | -                        |  |
|                       | <i>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9</i>                                                                     |      |              |                 | <b>25.949.391,67</b>    | <b>0,315</b>  |                    |            |                |                            |                         |                          |  |
|                       | <b>JUMLAH</b>                                                                                              |      |              |                 | <b>8.249.938.774,54</b> | <b>100,00</b> |                    |            |                | <b>2.739.475.503,19</b>    | <b>JUMLAH</b>           | <b>33,206</b>            |  |
|                       | <b>PPN 11 %</b>                                                                                            |      |              |                 | <b>907.493.265,20</b>   |               |                    |            |                | <b>301.342.305,35</b>      | <b>% Minggu Lalu</b>    | <b>29,600</b>            |  |
|                       | <b>TOTAL</b>                                                                                               |      |              |                 | <b>9.157.432.039,73</b> |               |                    |            |                | <b>3.040.817.808,54</b>    | <b>% Minggu Ini</b>     | <b>3,606</b>             |  |
|                       | <b>PEMBULATAN</b>                                                                                          |      |              |                 | <b>9.157.432.039,73</b> |               |                    |            |                | <b>3.040.817.808,54</b>    | <b>% sd. Minggu Ini</b> | <b>33,206</b>            |  |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                         |               |                    |            |                |                            | <b>RENCANA</b>          | <b>1,563</b>             |  |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                         |               |                    |            |                |                            | <b>DEVIASI</b>          | <b>31,643</b>            |  |

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)

**SULAN ST**

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
 Konsultan Supervisi  
 CV. TRAXIAL CONSULTAN

**Traxial**  
**SURYADI ST**  
 Inspector



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN MINGGUAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

| KONSULTAN SUPERVISI   |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | MINGGU KE-         |            |                | 12                         | PERIODE          |                          | 14 September 2022 s.d 20 September 2022 |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--|
| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI | BOBOT            |                          |                                         |  |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                            | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDUK PEKERJAAN |                                         |  |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                            |                  |                          |                                         |  |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |                                         |  |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,55               | -          | 0,550          | 4.111.250,00               | 55,00            | 0,050                    |                                         |  |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |                                         |  |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 1,00               | -          | 1,000          | 700.000,00                 | 100,00           | 0,008                    |                                         |  |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,45               | -          | 0,445          | 267.000,00                 | 44,50            | 0,003                    |                                         |  |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,45               | -          | 0,445          | 1.515.225,00               | 44,50            | 0,018                    |                                         |  |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,45               | -          | 0,445          | 4.890.422,15               | 44,50            | 0,059                    |                                         |  |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,45               | -          | 0,445          | 1.424.000,00               | 44,50            | 0,017                    |                                         |  |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,45               | -          | 0,445          | 155.750,00                 | 44,50            | 0,002                    |                                         |  |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,45               | -          | 0,445          | 805.450,00                 | 44,50            | 0,010                    |                                         |  |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,45               | -          | 0,445          | 1.446.250,00               | 44,50            | 0,018                    |                                         |  |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,45               | -          | 0,445          | 467.250,00                 | 44,50            | 0,006                    |                                         |  |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |            |                |                            |                  |                          |                                         |  |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |                                         |  |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |                                         |  |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |            |                |                            |                  |                          |                                         |  |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |                                         |  |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | 603,60             | -          | 603,60         | 1.801.817.149,26           | 29,72            | 21,840                   |                                         |  |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 462,10             | 280,40     | 742,50         | 1.481.265.417,46           | 73,13            | 17,955                   |                                         |  |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |            |                |                            |                  |                          |                                         |  |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |                                         |  |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |                                         |  |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |            |                |                            |                  |                          |                                         |  |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |            |                | 3.298.865.163,86           | JUMLAH           | 39,987                   |                                         |  |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |            |                | 362.875.168,03             | % Minggu Lalu    | 33,206                   |                                         |  |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 3.661.740.331,89           | % Minggu Ini     | 6,781                    |                                         |  |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 3.661.740.331,89           | % sd. Minggu Ini | 39,987                   |                                         |  |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            | RENCANA          | 2,941                    |                                         |  |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            | DEVIASI          | 37,046                   |                                         |  |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

S. L. A. S. T.

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
Konsultan Supervisi  
TRAXIAL CONSULTAN  
  
SURYADI S.  
Inspector



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN MINGGUAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

|                        |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  | MINGGU KE-         |            |                | 13                                      |                  |                          |        |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------|--------|--|
|                        |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  | PERIODE            |            |                | 21 September 2022 s.d 27 September 2022 |                  |                          |        |  |
| MATA PEMBAYARAN        | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT            | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI              | BOBOT            |                          |        |  |
|                        |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                                         | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDIK PEKERJAAN |        |  |
|                        |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                                         |                  |                          |        |  |
|                        | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |                  |                    |            |                |                                         |                  |                          |        |  |
| 1.2                    | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091            | 0,550              | -          | 0,550          | 4.111.250,00                            | 55,00            | 0,050                    |        |  |
| 1.19                   | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |                  |                    |            |                |                                         |                  |                          |        |  |
|                        | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008            | 1,00               | -          | 1,000          | 700.000,00                              | 100,00           | 0,008                    |        |  |
|                        | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007            | 0,445              | -          | 0,445          | 267.000,00                              | 44,50            | 0,003                    |        |  |
|                        | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041            | 0,445              | -          | 0,445          | 1.515.225,00                            | 44,50            | 0,018                    |        |  |
|                        | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133            | 0,445              | -          | 0,445          | 4.890.422,15                            | 44,50            | 0,059                    |        |  |
|                        | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039            | 0,445              | -          | 0,445          | 1.424.000,00                            | 44,50            | 0,017                    |        |  |
|                        | 6 Pasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004            | 0,445              | -          | 0,445          | 155.750,00                              | 44,50            | 0,002                    |        |  |
|                        | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022            | 0,445              | -          | 0,445          | 805.450,00                              | 44,50            | 0,010                    |        |  |
|                        | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039            | 0,445              | -          | 0,445          | 1.446.250,00                            | 44,50            | 0,018                    |        |  |
|                        | 9 Lain-lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                             | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013            | 0,445              | -          | 0,445          | 467.250,00                              | 44,50            | 0,006                    |        |  |
|                        | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398            |                    |            |                |                                         |                  |                          |        |  |
|                        | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |                  |                    |            |                |                                         |                  |                          |        |  |
| 3.2.(2a)               | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254            | -                  | -          | -              | -                                       | -                | -                        |        |  |
|                        | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254            |                    |            |                |                                         |                  |                          |        |  |
|                        | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |                  |                    |            |                |                                         |                  |                          |        |  |
| 5.3.(1)                | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480           | 603,60             | -          | 603,60         | 1.801.817.149,26                        | 29,72            | 21,840                   |        |  |
| 5.3.(3)                | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554           | 742,50             | 145,70     | 888,20         | 1.771.932.584,22                        | 87,47            | 21,478                   |        |  |
|                        | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034           |                    |            |                |                                         |                  |                          |        |  |
|                        | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |                  |                    |            |                |                                         |                  |                          |        |  |
| 9.2.(1)                | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315            | -                  | -          | -              | -                                       | -                | -                        |        |  |
|                        | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315            |                    |            |                |                                         |                  |                          |        |  |
|                        |                                                                                                            |      |              |                 | JUMLAH           | 8.249.938.774,54 | 100,00             |            |                | 3.589.532.330,63                        | JUMLAH           | 43,510                   |        |  |
|                        |                                                                                                            |      |              |                 | PPN 11 %         | 907.493.265,20   |                    |            |                | 394.848.556,37                          | % Minggu Lalu    | 39,987                   |        |  |
|                        |                                                                                                            |      |              |                 | TOTAL            | 9.157.432.039,73 |                    |            |                | 3.984.380.887,00                        | % Minggu Ini     | 3,523                    |        |  |
|                        |                                                                                                            |      |              |                 | PEMBULATAN       | 9.157.432.039,73 |                    |            |                | 3.984.380.887,00                        | % sd. Minggu Ini | 43,510                   |        |  |
|                        |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  |                    |            |                |                                         |                  |                          |        |  |
| KETERANGAN / CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  |                    |            |                |                                         |                  | RENCANA                  | 8,401  |  |
|                        |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  |                    |            |                |                                         |                  | DEVIASI                  | 35,109 |  |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

SELAN ST

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
Konsultan Supervisi  
TRAXIAL CONSULTAN

Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



***LAPORAN MINGGU DAN BULAN***  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

**BULAN. 04**

**CV. TRAXIAL CONSULTANT**

**TA. 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN BULANAN**

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
 NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
 NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
 KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  | BULAN              |           |               | 04                        |                  |                          |         |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|---------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------|--------|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  | PERIODE            |           |               | OKTOBER 2022              |                  |                          |         |        |
| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT            | KEMAJUAN PEKERJAAN |           |               | NILAI PEKERJAAN BULAN INI | BOBOT            |                          |         |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  | VOLUME TERLAKSANA  |           |               |                           | BOBOT INDIVIDU   | TERJADAP INDUK PEKERJAAN |         |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  | sd.Bulan Lalu      | Bulan Ini | s.d Bulan Ini |                           |                  |                          |         |        |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                  |                          |         |        |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091            | 0,55               | -         | 0,550         | 4.111.250,00              | 55,00            | 0,050                    |         |        |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                  |                          |         |        |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008            | 1,00               | -         | 1,000         | 700.000,00                | 100,00           | 0,008                    |         |        |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007            | 0,45               | -         | 0,445         | 267.000,00                | 44,50            | 0,003                    |         |        |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041            | 0,45               | -         | 0,445         | 1.515.225,00              | 44,50            | 0,018                    |         |        |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133            | 0,45               | -         | 0,445         | 4.890.422,15              | 44,50            | 0,059                    |         |        |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039            | 0,45               | -         | 0,445         | 1.424.000,00              | 44,50            | 0,017                    |         |        |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004            | 0,45               | -         | 0,445         | 155.750,00                | 44,50            | 0,002                    |         |        |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022            | 0,45               | -         | 0,445         | 805.450,00                | 44,50            | 0,010                    |         |        |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039            | 0,45               | -         | 0,445         | 1.446.250,00              | 44,50            | 0,018                    |         |        |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013            | 0,45               | -         | 0,445         | 467.250,00                | 44,50            | 0,006                    |         |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398            |                    |           |               |                           |                  |                          |         |        |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                  |                          |         |        |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254            | -                  | -         | -             | -                         | -                | -                        |         |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                  |                          |         |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254            |                    |           |               |                           |                  |                          |         |        |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                  |                          |         |        |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480           | 603,60             | 400,20    | 1.003,80      | 2.996.461.322,77          | 49,43            | 36,321                   |         |        |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554           | 888,20             | 127,18    | 1.015,38      | 2.025.652.901,79          | 100,00           | 24,554                   |         |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                  |                          |         |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034           |                    |           |               |                           |                  |                          |         |        |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                  |                          |         |        |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315            | -                  | -         | -             | -                         | -                | -                        |         |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                  |                          |         |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315            |                    |           |               |                           |                  |                          |         |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 | JUMLAH           | 8.249.938.774,54 | 100,00             |           |               |                           | 5.037.896.821,71 | JUMLAH                   | 61,066  |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 | PPN 11 %         | 907.493.265,20   |                    |           |               |                           | 554.168.650,39   | % Bulan Lalu             | 43,510  |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 | TOTAL            | 9.157.432.039,73 |                    |           |               |                           | 5.592.065.472,10 | % Bulan Ini              | 17,556  |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 | PEMBULATAN       | 9.157.432.039,73 |                    |           |               |                           | 5.592.065.472,10 | % sd. Bulan Ini          | 61,066  |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                  | RENCANA                  | 42,158  |        |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |                  |                    |           |               |                           |                  |                          | DEVIASI | 18,908 |

KETERANGAN/ CATATAN :

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Penandatanganan Kontrak  
 (PPK)

WAHYUDDIN, ST

NIP. 19790712 201001 1 017

Dikerjakan Oleh,  
 Konsultan Supervisi  
 CV. TRAXIAL CONSULTAN

**Traxial**  
 Site Engineer



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN MINGGUAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

| MINGGU KE- | 14                                    |
|------------|---------------------------------------|
| PERIODE    | 28 September 2022 s.d 04 Oktober 2022 |

| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI | BOBOT            |                          |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--------|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                            | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDUK PEKERJAAN |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                            |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,55               | -          | 0,550          | 4.111.250,00               | 55,00            | 0,050                    |        |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 1,00               | -          | 1,000          | 700.000,00                 | 100,00           | 0,008                    |        |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,45               | -          | 0,445          | 267.000,00                 | 44,50            | 0,003                    |        |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,45               | -          | 0,445          | 1.515.225,00               | 44,50            | 0,018                    |        |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,45               | -          | 0,445          | 4.890.422,15               | 44,50            | 0,059                    |        |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,45               | -          | 0,445          | 1.424.000,00               | 44,50            | 0,017                    |        |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,45               | -          | 0,445          | 155.750,00                 | 44,50            | 0,002                    |        |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,45               | -          | 0,445          | 805.450,00                 | 44,50            | 0,010                    |        |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,45               | -          | 0,445          | 1.446.250,00               | 44,50            | 0,018                    |        |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,45               | -          | 0,445          | 467.250,00                 | 44,50            | 0,006                    |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | 603,60             | 20,50      | 624,100        | 1.863.012.065,69           | 30,73            | 22,582                   |        |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 888,20             | 127,18     | 1.015,38       | 2.025.652.901,79           | 100,00           | 24,554                   |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 |                  | 100,00 |                    |            |                | 3.904.447.564,63           | JUMLAH           | 47,327                   |        |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                | 429.489.232,11             | % Minggu Lalu    | 43,510                   |        |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                | 4.333.936.796,74           | % Minggu Ini     | 3,817                    |        |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                | 4.333.936.796,74           | % sd. Minggu Ini | 47,327                   |        |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  | RENCANA                  | 15,054 |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  | DEVIASI                  | 32,273 |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

  
SULAN ST

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
Konsultan Supervisi  
CV. TRAXIAL CONSULTAN

  
Traxial ST  
Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGUAN**

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
 NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
 NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
 KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| MINGGU KE- | 15                                  |
| PERIODE    | 05 Oktober 2022 s.d 11 Oktober 2022 |

| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI | BOBOT            |                          |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--------|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                            | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDUK PEKERJAAN |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                            |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,55               | -          | 0,550          | 4.111.250,00               | 55,00            | 0,050                    |        |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 1,00               | -          | 1,000          | 700.000,00                 | 100,00           | 0,008                    |        |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,45               | -          | 0,445          | 267.000,00                 | 44,50            | 0,003                    |        |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,45               | -          | 0,445          | 1.515.225,00               | 44,50            | 0,018                    |        |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,45               | -          | 0,445          | 4.890.422,15               | 44,50            | 0,059                    |        |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,45               | -          | 0,445          | 1.424.000,00               | 44,50            | 0,017                    |        |
|                       | 6 Pasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,45               | -          | 0,445          | 155.750,00                 | 44,50            | 0,002                    |        |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,45               | -          | 0,445          | 805.450,00                 | 44,50            | 0,010                    |        |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,45               | -          | 0,445          | 1.446.250,00               | 44,50            | 0,018                    |        |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,45               | -          | 0,445          | 467.250,00                 | 44,50            | 0,006                    |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | 624,10             | 110,00     | 734,10         | 2.191.375.031,92           | 36,15            | 26,562                   |        |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 1.015,38           | -          | 1.015,38       | 2.025.652.901,79           | 100,00           | 24,554                   |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| 9.2.(1)               | Marka Jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |            |                | 4.232.810.530,86           | JUMLAH           | 51,307                   |        |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |            |                | 465.609.158,39             | % Minggu Lalu    | 47,327                   |        |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 4.698.419.689,26           | % Minggu Ini     | 3,980                    |        |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 4.698.419.689,26           | % sd. Minggu Ini | 51,307                   |        |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  | RENCANA                  | 21,707 |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  | DEVIASI                  | 29,600 |

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)

**SULAN ST**

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
 Konsultan Supervisi  
 CV. TRAXIAL CONSULTAN

**Traxial**  
 Inspector



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN MINGGUAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

| MINGGU KE- | 16                                  |
|------------|-------------------------------------|
| PERIODE    | 12 Oktober 2022 s.d 18 Oktober 2022 |

| MATA PEMBAYARA<br>RAN | URAIAN PEKERJAAN                                                                                                    | SAT. | HARGA<br>SATUAN | ESTIMASI<br>VOLUME | JUMLAH<br>HARGA  | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |               |                      | NILAI PEKERJAAN<br>MINGGU INI | BOBOT             |                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |               |                      |                               | BOBOT<br>INDIVIDU | TERHADAP<br>INDUK<br>PEKERJAAN |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        | sd.Minggu<br>Lalu  | Minggu<br>Ini | s d<br>Minggu<br>Ini |                               |                   |                                |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                                      |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                         | LS   | 7.475.000,0     | 1,00               | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,55               | -             | 0,550                | 4.111.250,00                  | 55,00             | 0,050                          |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                                    | LS   | 700.000,0       | 1,00               | 700.000,00       | 0,008  | 1,00               | -             | 1,000                | 700.000,00                    | 100,00            | 0,008                          |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                                | LS   | 600.000,0       | 1,00               | 600.000,00       | 0,007  | 0,45               | -             | 0,445                | 267.000,00                    | 44,50             | 0,003                          |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan<br>Alat Pelindung Diri (APD)                                                       | LS   | 3.405.000,0     | 1,00               | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,45               | -             | 0,445                | 1.515.225,00                  | 44,50             | 0,018                          |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                            | LS   | 10.989.712,7    | 1,00               | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,45               | -             | 0,445                | 4.890.422,15                  | 44,50             | 0,059                          |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                            | LS   | 3.200.000,0     | 1,00               | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,45               | -             | 0,445                | 1.424.000,00                  | 44,50             | 0,017                          |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan<br>alat kesehatan                                                               | LS   | 350.000,0       | 1,00               | 350.000,00       | 0,004  | 0,45               | -             | 0,445                | 155.750,00                    | 44,50             | 0,002                          |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                                       | LS   | 1.810.000,0     | 1,00               | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,45               | -             | 0,445                | 805.450,00                    | 44,50             | 0,010                          |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait<br>Keselamatan Konstruksi sesuai<br>Lingkup pekerjaan dengan<br>kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0     | 1,00               | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,45               | -             | 0,445                | 1.446.250,00                  | 44,50             | 0,018                          |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian<br>risiko Keselamatan Konstruksi                                                  | LS   | 1.050.000,0     | 1,00               | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,45               | -             | 0,445                | 467.250,00                    | 44,50             | 0,006                          |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                                     |      |                 |                    | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |               |                      |                               |                   |                                |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                           |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                                 | m3   | 203.763,70      | 507,69             | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | -             | -                    | -                             | -                 | -                              |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                                     |      |                 |                    | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |               |                      |                               |                   |                                |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                                       |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                              | m3   | 2.985.117,87    | 2.030,76           | 6.062.057.975,52 | 73,480 | 734,10             | 214,40        | 948,50               | 2.831.384.304,29              | 46,71             | 34,320                         |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus                                                                                     | m3   | 1.994.970,26    | 1.015,38           | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 1.015,38           | -             | 1.015,38             | 2.025.652.901,79              | 100,00            | 24,554                         |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                                     |      |                 |                    | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |               |                      |                               |                   |                                |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                            |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
| 9.2.(1)               | Marka Jalan termoplastik                                                                                            | m2   | 212.961,8       | 121,85             | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -             | -                    | -                             | -                 | -                              |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                                     |      |                 |                    | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |               |                      |                               |                   |                                |
| JUMLAH                |                                                                                                                     |      |                 |                    | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |               |                      | 4.872.819.803,23              | JUMLAH            | 59,065                         |
| PPN 11 %              |                                                                                                                     |      |                 |                    | 907.493.265,20   |        |                    |               |                      | 536.010.178,36                | % Minggu Lalu     | 51,307                         |
| TOTAL                 |                                                                                                                     |      |                 |                    | 9.157.432.039,73 |        |                    |               |                      | 5.408.829.981,58              | % Minggu Ini      | 7,758                          |
| PEMBULATAN            |                                                                                                                     |      |                 |                    | 9.157.432.039,73 |        |                    |               |                      | 5.408.829.981,58              | % sd. Minggu Ini  | 59,065                         |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               | RENCANA           | 31,932                         |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               | DEVIASI           | 27,132                         |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

S. L. S. T.

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
Konsultan Supervisi  
CV. TRAXIAL CONSULTAN

SURYADI ST  
Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGUAN**

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
 NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
 NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
 KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

| MINGGU KE- | 17                                  |
|------------|-------------------------------------|
| PERIODE    | 19 Oktober 2022 s.d 25 Oktober 2022 |


| MATA PEMBAYARA<br>RAN | URAIAN PEKERJAAN                                                                                                    | SAT. | HARGA<br>SATUAN | ESTIMASI<br>VOLUME | JUMLAH<br>HARGA  | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |               |                      | NILAI PEKERJAAN<br>MINGGU INI | BOBOT             |                                |        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |               |                      |                               | BOBOT<br>INDIVIDU | TERHADAP<br>INDUK<br>PEKERJAAN |        |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        | sd.Minggu<br>Lalu  | Minggu<br>Ini | s.d<br>Minggu<br>Ini |                               |                   |                                |        |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                                      |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |        |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                         | LS   | 7.475.000,0     | 1,00               | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,55               | -             | 0,550                | 4.111.250,00                  | 55,00             | 0,050                          |        |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                                     |      |                 |                    |                  |        | -                  |               |                      |                               |                   |                                |        |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                                    | LS   | 700.000,0       | 1,00               | 700.000,00       | 0,008  | 1,00               | -             | 1,000                | 700.000,00                    | 100,00            | 0,008                          |        |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                                | LS   | 600.000,0       | 1,00               | 600.000,00       | 0,007  | 0,45               | -             | 0,445                | 267.000,00                    | 44,50             | 0,003                          |        |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan<br>Alat Pelindung Diri (APD)                                                       | LS   | 3.405.000,0     | 1,00               | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,45               | -             | 0,445                | 1.515.225,00                  | 44,50             | 0,018                          |        |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                            | LS   | 10.989.712,7    | 1,00               | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,45               | -             | 0,445                | 4.890.422,15                  | 44,50             | 0,059                          |        |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                            | LS   | 3.200.000,0     | 1,00               | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,45               | -             | 0,445                | 1.424.000,00                  | 44,50             | 0,017                          |        |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan<br>alat kesehatan                                                               | LS   | 350.000,0       | 1,00               | 350.000,00       | 0,004  | 0,45               | -             | 0,445                | 155.750,00                    | 44,50             | 0,002                          |        |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                                       | LS   | 1.810.000,0     | 1,00               | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,45               | -             | 0,445                | 805.450,00                    | 44,50             | 0,010                          |        |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait<br>Keselamatan Konstruksi sesuai<br>Lingkup pekerjaan dengan<br>kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0     | 1,00               | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,45               | -             | 0,445                | 1.446.250,00                  | 44,50             | 0,018                          |        |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian<br>risiko Keselamatan Konstruksi                                                  | LS   | 1.050.000,0     | 1,00               | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,45               | -             | 0,445                | 467.250,00                    | 44,50             | 0,006                          |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                                     |      |                 |                    | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |               |                      |                               |                   |                                |        |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                           |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |        |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                                 | m3   | 203.763,70      | 507,69             | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | -             | -                    | -                             | -                 | -                              |        |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                                     |      |                 |                    | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |               |                      |                               |                   |                                |        |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                                       |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |        |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                              | m3   | 2.985.117,87    | 2.030,76           | 6.062.057.975,52 | 73,480 | 948,50             | 55,30         | 1.003,80             | 2.996.461.322,77              | 49,43             | 36,321                         |        |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                                     | m3   | 1.994.970,26    | 1.015,38           | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 1.015,38           | -             | 1.015,38             | 2.025.652.901,79              | 100,00            | 24,554                         |        |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                                     |      |                 |                    | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |               |                      |                               |                   |                                |        |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                            |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |        |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                            | m2   | 212.961,8       | 121,85             | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -             | -                    | -                             | -                 | -                              |        |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                                     |      |                 |                    | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |               |                      |                               |                   |                                |        |
| JUMLAH                |                                                                                                                     |      |                 |                    | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |               |                      | 5.037.896.821,71              | JUMLAH            | 61,066                         |        |
| PTN 11 %              |                                                                                                                     |      |                 |                    | 907.493.265,20   |        |                    |               |                      | 554.168.650,39                | % Minggu Lalu     | 59,065                         |        |
| TOTAL                 |                                                                                                                     |      |                 |                    | 9.157.432.039,73 |        |                    |               |                      | 5.592.065.472,10              | % Minggu Ini      | 2,001                          |        |
| PEMBULATAN            |                                                                                                                     |      |                 |                    | 9.157.432.039,73 |        |                    |               |                      | 5.592.065.472,10              | % sd. Minggu Ini  | 61,066                         |        |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   | RENCANA                        | 42,158 |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   | DEVIASI                        | 18,908 |

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)

  
 SULAN ST

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
 Konsultan Supervisi  
 CV. TRAXIAL CONSULTAN

  
 Traxial  
 Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGU DAN BULAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

**BULAN. 05**

**CV. TRAXIAL CONSULTANT**

**TA. 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN BULANAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

| KONSULTAN SUPERVISI   |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        | CV. TRAXIAL CONSULTAN |           |                  | BULAN                        |                   | 05                             |        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------|--------|-----------------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        | PERIODE               |           |                  | NOVEMBER                     |                   | 2022                           |        |
| MATA PEMBAYARA<br>N   | URAIAN PEKERJAAN                                                                                                    | SAT. | HARGA<br>SATUAN | ESTIMASI<br>VOLUME | JUMLAH<br>HARGA  | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN    |           |                  | NILAI PEKERJAAN<br>BULAN INI | BOBOT             |                                |        |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        | VOLUME TERLAKSANA     |           |                  |                              | BOBOT<br>INDIVIDU | TERHADAP<br>INDUK<br>PEKERJAAN |        |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        | sd.Bulan<br>Lalu      | Bulan Ini | s.d Bulan<br>Ini |                              |                   |                                |        |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                                      |      |                 |                    |                  |        |                       |           |                  |                              |                   |                                |        |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                         | LS   | 7.475.000,0     | 1,00               | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,55                  | 0,25      | 0,800            | 5.980.000,00                 | 80,00             | 0,072                          |        |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                       |           |                  |                              |                   |                                |        |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                                    | LS   | 700.000,0       | 1,00               | 700.000,00       | 0,008  | 1,00                  | -         | 1,000            | 700.000,00                   | 100,00            | 0,008                          |        |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                                | LS   | 600.000,0       | 1,00               | 600.000,00       | 0,007  | 0,45                  | 0,25      | 0,695            | 417.000,00                   | 69,50             | 0,005                          |        |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan<br>Alat Pelindung Diri (APD)                                                       | LS   | 3.405.000,0     | 1,00               | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,45                  | 0,25      | 0,695            | 2.366.475,00                 | 69,50             | 0,029                          |        |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                            | LS   | 10.989.712,7    | 1,00               | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,45                  | 0,25      | 0,695            | 7.637.850,33                 | 69,50             | 0,093                          |        |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                            | LS   | 3.200.000,0     | 1,00               | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,45                  | 0,25      | 0,695            | 2.224.000,00                 | 69,50             | 0,027                          |        |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan<br>alat kesehatan                                                               | LS   | 350.000,0       | 1,00               | 350.000,00       | 0,004  | 0,45                  | 0,25      | 0,695            | 243.250,00                   | 69,50             | 0,003                          |        |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                                       | LS   | 1.810.000,0     | 1,00               | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,45                  | 0,25      | 0,695            | 1.257.950,00                 | 69,50             | 0,015                          |        |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait<br>Keselamatan Konstruksi sesuai<br>Lingkup pekerjaan dengan<br>kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0     | 1,00               | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,45                  | 0,25      | 0,695            | 2.258.750,00                 | 69,50             | 0,027                          |        |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian<br>risiko Keselamatan Konstruksi                                                  | LS   | 1.050.000,0     | 1,00               | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,45                  | 0,25      | 0,695            | 729.750,00                   | 69,50             | 0,009                          |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                                     |      |                 |                    | 32.829.712,70    | 0,398  |                       |           |                  |                              |                   |                                |        |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                           |      |                 |                    |                  |        |                       |           |                  |                              |                   |                                |        |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                                 | m3   | 203.763,70      | 507,69             | 103.448.792,85   | 1,254  | -                     | 344,50    | 344,500          | 70.196.594,65                | 67,856            | 0,851                          |        |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                       |           |                  |                              |                   |                                |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                                     |      |                 |                    | 103.448.792,85   | 1,254  |                       |           |                  |                              |                   |                                |        |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                                       |      |                 |                    |                  |        |                       |           |                  |                              |                   |                                |        |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                              | m3   | 2.985.117,87    | 2.030,76           | 6.062.057.975,52 | 73,480 | 1.003,80              | 1.026,96  | 2.030,76         | 6.062.057.975,52             | 100,00            | 73,480                         |        |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                                     | m3   | 1.994.970,26    | 1.015,38           | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 1.015,38              | -         | 1.015,38         | 2.025.652.901,79             | 100,00            | 24,554                         |        |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                       |           |                  |                              |                   |                                |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                                     |      |                 |                    | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                       |           |                  |                              |                   |                                |        |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                            |      |                 |                    |                  |        |                       |           |                  |                              |                   |                                |        |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                            | m2   | 212.961,8       | 121,85             | 25.949.391,67    | 0,315  | -                     | -         | -                | -                            | -                 | -                              |        |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                       |           |                  |                              |                   |                                |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                                     |      |                 |                    | 25.949.391,67    | 0,315  |                       |           |                  |                              |                   |                                |        |
| JUMLAH                |                                                                                                                     |      |                 |                    | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                       |           |                  | 8.181.722.497,28             | JUMLAH            | 99,173                         |        |
| PPN 11 %              |                                                                                                                     |      |                 |                    | 907.493.265,20   |        |                       |           |                  | 899.989.474,70               | % Bulan Lalu      | 61,066                         |        |
| TOTAL                 |                                                                                                                     |      |                 |                    | 9.157.432.039,73 |        |                       |           |                  | 9.081.711.971,99             | % Bulan Ini       | 38,107                         |        |
| PEMBULATAN            |                                                                                                                     |      |                 |                    | 9.157.432.039,73 |        |                       |           |                  | 9.081.711.971,99             | % sd. Bulan Ini   | 99,173                         |        |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                       |           |                  |                              |                   | RENCANA                        | 91,509 |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                       |           |                  |                              |                   | DEVIASI                        | 7,664  |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Penandatangan Kontrak  
(PPK)

WAHYUDDIN, ST

NIP. 19790712 201001 1 017

Dikerjakan Oleh,  
Konsultan Supervisi  
TRAXIAL CONSULTAN

Traxial ST  
Site Engineer



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN MINGGUAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | MINGGU KE-         |            |                | 18                                   |                  |                          |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | PERIODE            |            |                | 26 Oktober 2022 s.d 01 November 2022 |                  |                          |        |
| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI           | BOBOT            |                          |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                                      | BOBOT INDIVIDU   | TERJADAP INDIK PEKERJAAN |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                                      |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                      |                  |                          |        |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,55               | -          | 0,550          | 4.111.250,00                         | 55,00            | 0,050                    |        |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                      |                  |                          |        |
|                       | 1 Penyelapan RKK,                                                                                          | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 1,00               | -          | 1,000          | 700.000,00                           | 100,00           | 0,008                    |        |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,45               | -          | 0,445          | 267.000,00                           | 44,50            | 0,003                    |        |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,45               | -          | 0,445          | 1.515.225,00                         | 44,50            | 0,018                    |        |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,45               | -          | 0,445          | 4.890.422,15                         | 44,50            | 0,059                    |        |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,45               | -          | 0,445          | 1.424.000,00                         | 44,50            | 0,017                    |        |
|                       | 6 Pasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,45               | -          | 0,445          | 155.750,00                           | 44,50            | 0,002                    |        |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,45               | -          | 0,445          | 805.450,00                           | 44,50            | 0,010                    |        |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,45               | -          | 0,445          | 1.446.250,00                         | 44,50            | 0,018                    |        |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,45               | -          | 0,445          | 467.250,00                           | 44,50            | 0,006                    |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |            |                |                                      |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                      |                  |                          |        |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | 183,80     | 183,80         | 37.451.768,06                        | 36,20            | 0,454                    |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                      |                  |                          |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |            |                |                                      |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                      |                  |                          |        |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | 1.003,80           | 248,70     | 1.252,50       | 3.738.860.138,24                     | 61,68            | 45,320                   |        |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 1.015,38           | -          | 1.015,38       | 2.025.652.901,79                     | 100,00           | 24,554                   |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                      |                  |                          |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |            |                |                                      |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                      |                  |                          |        |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -          | -              | -                                    | -                | -                        |        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                      |                  |                          |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |            |                |                                      |                  |                          |        |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |            |                | 5.817.747.405,24                     | JUMLAH           | 70,519                   |        |
| PTN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |            |                | 639.952.214,58                       | % Minggu Lalu    | 61,066                   |        |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 6.457.699.619,82                     | % Minggu Ini     | 9,453                    |        |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 6.457.699.619,82                     | % sd. Minggu Ini | 70,519                   |        |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                      |                  | RENCANA                  | 52,383 |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                                      |                  | DEVIASI                  | 18,136 |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

SULAN ST

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
Konsultan Supervisi  
CV. TRAXIAL CONSULTAN  
  
Inspector



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN MINGGUAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

| KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA      |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | MINGGU KE-         |            | 19                                    |                            |                  |                          |        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--------|
| KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | PERIODE            |            | 02 November 2022 s.d 08 November 2022 |                            |                  |                          |        |
| MATA PEMBAYARAN                             | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                                       | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI | BOBOT            |                          |        |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |            |                                       |                            | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDUK PEKERJAAN |        |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini                        |                            |                  |                          |        |
|                                             | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |            |                                       |                            |                  |                          |        |
| 1.2                                         | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,55               | -          | 0,550                                 | 4.111.250,00               | 55,00            | 0,050                    |        |
| 1.19                                        | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        | -                  |            |                                       |                            |                  |                          |        |
|                                             | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 1,00               | -          | 1,000                                 | 700.000,00                 | 100,00           | 0,008                    |        |
|                                             | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,45               | -          | 0,445                                 | 267.000,00                 | 44,50            | 0,003                    |        |
|                                             | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,45               | -          | 0,445                                 | 1.515.225,00               | 44,50            | 0,018                    |        |
|                                             | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,45               | -          | 0,445                                 | 4.890.422,15               | 44,50            | 0,059                    |        |
|                                             | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,45               | -          | 0,445                                 | 1.424.000,00               | 44,50            | 0,017                    |        |
|                                             | 6 Pasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,45               | -          | 0,445                                 | 155.750,00                 | 44,50            | 0,002                    |        |
|                                             | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,45               | -          | 0,445                                 | 805.450,00                 | 44,50            | 0,010                    |        |
|                                             | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,45               | -          | 0,445                                 | 1.446.250,00               | 44,50            | 0,018                    |        |
|                                             | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,45               | -          | 0,445                                 | 467.250,00                 | 44,50            | 0,006                    |        |
|                                             | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |            |                                       |                            |                  |                          |        |
|                                             | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |            |                                       |                            |                  |                          |        |
| 3.2.(2a)                                    | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | 183,80             | 68,00      | 251,80                                | 51.307.699,66              | 49,60            | 0,622                    |        |
|                                             | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |            |                                       |                            |                  |                          |        |
|                                             | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |            |                                       |                            |                  |                          |        |
| 5.3.(1)                                     | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | 1.252,50           | 251,20     | 1.503,70                              | 4.488.721.748,40           | 74,05            | 54,409                   |        |
| 5.3.(3)                                     | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 1.015,38           | -          | 1.015,38                              | 2.025.652.901,79           | 100,00           | 24,554                   |        |
|                                             | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |            |                                       |                            |                  |                          |        |
|                                             | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |            |                                       |                            |                  |                          |        |
| 9.2.(1)                                     | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -          | -                                     | -                          | -                | -                        |        |
|                                             | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |            |                                       |                            |                  |                          |        |
| JUMLAH                                      |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |            |                                       | 6.581.464.947,00           | JUMLAH           | 79,776                   |        |
| PPN 11 %                                    |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |            |                                       | 723.961.144,17             | % Minggu Lalu    | 70,519                   |        |
| TOTAL                                       |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                                       | 7.305.426.091,17           | % Minggu Ini     | 9,257                    |        |
| PEMBULATAN                                  |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                                       | 7.305.426.091,17           | % sd. Minggu Ini | 79,776                   |        |
| KETERANGAN/ CATATAN :                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                                       |                            |                  | RENCANA                  | 62,764 |
|                                             |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                                       |                            |                  | DEVIASI                  | 17,011 |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

SULAN.ST

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
Konsultan Supervisi  
CV. TRAXIAL CONSULTAN

SURYADI ST  
Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGUAN**

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
 NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
 NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
 KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

|                       |                                                                                                            | MINGGU KE- |              | 20               |                  |                      |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--------|
|                       |                                                                                                            | PERIODE    |              | 09 November 2022 |                  | s.d 15 November 2022 |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT.       | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME  | JUMLAH HARGA     | BOBOT                | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI | BOBOT            |                          |        |
|                       |                                                                                                            |            |              |                  |                  |                      | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                            | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDIK PEKERJAAN |        |
|                       |                                                                                                            |            |              |                  |                  |                      | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                            |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |            |              |                  |                  |                      |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS         | 7.475.000,0  | 1,00             | 7.475.000,00     | 0,091                | 0,55               | -          | 0,550          | 4.111.250,00               | 55,00            | 0,050                    |        |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |            |              |                  |                  |                      |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS         | 700.000,0    | 1,00             | 700.000,00       | 0,008                | 1,00               | -          | 1,000          | 700.000,00                 | 100,00           | 0,008                    |        |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS         | 600.000,0    | 1,00             | 600.000,00       | 0,007                | 0,45               | -          | 0,445          | 267.000,00                 | 44,50            | 0,003                    |        |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS         | 3.405.000,0  | 1,00             | 3.405.000,00     | 0,041                | 0,45               | -          | 0,445          | 1.515.225,00               | 44,50            | 0,018                    |        |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS         | 10.989.712,7 | 1,00             | 10.989.712,70    | 0,133                | 0,45               | -          | 0,445          | 4.890.422,15               | 44,50            | 0,059                    |        |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS         | 3.200.000,0  | 1,00             | 3.200.000,00     | 0,039                | 0,45               | -          | 0,445          | 1.424.000,00               | 44,50            | 0,017                    |        |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS         | 350.000,0    | 1,00             | 350.000,00       | 0,004                | 0,45               | -          | 0,445          | 155.750,00                 | 44,50            | 0,002                    |        |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS         | 1.810.000,0  | 1,00             | 1.810.000,00     | 0,022                | 0,45               | -          | 0,445          | 805.450,00                 | 44,50            | 0,010                    |        |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS         | 3.250.000,0  | 1,00             | 3.250.000,00     | 0,039                | 0,45               | -          | 0,445          | 1.446.250,00               | 44,50            | 0,018                    |        |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS         | 1.050.000,0  | 1,00             | 1.050.000,00     | 0,013                | 0,45               | -          | 0,445          | 467.250,00                 | 44,50            | 0,006                    |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |            |              |                  | 32.829.712,70    | 0,398                |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |            |              |                  |                  |                      |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3         | 203.763,70   | 507,69           | 103.448.792,85   | 1,254                | 251,80             | -          | 251,80         | 51.307.699,66              | 49,60            | 0,622                    |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |            |              |                  | 103.448.792,85   | 1,254                |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |            |              |                  |                  |                      |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3         | 2.985.117,87 | 2.030,76         | 6.062.057.975,52 | 73,480               | 1.503,70           | 258,20     | 1.761,90       | 5.259.479.183,69           | 86,76            | 63,752                   |        |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                            | m3         | 1.994.970,26 | 1.015,38         | 2.025.652.901,79 | 24,554               | 1.015,38           | -          | 1.015,38       | 2.025.652.901,79           | 100,00           | 24,554                   |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |            |              |                  | 8.087.710.877,31 | 98,034               |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |            |              |                  |                  |                      |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2         | 212.961,8    | 121,85           | 25.949.391,67    | 0,315                | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |            |              |                  | 25.949.391,67    | 0,315                |                    |            |                |                            |                  |                          |        |
| JUMLAH                |                                                                                                            |            |              |                  | 8.249.938.774,54 | 100,00               |                    |            |                | 7.352.222.382,29           | JUMLAH           | 89,119                   |        |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |            |              |                  | 907.493.265,20   |                      |                    |            |                | 808.744.462,05             | % Minggu Lalu    | 79,776                   |        |
| TOTAL                 |                                                                                                            |            |              |                  | 9.157.432.039,73 |                      |                    |            |                | 8.160.966.844,34           | % Minggu Ini     | 9,343                    |        |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |            |              |                  | 9.157.432.039,73 |                      |                    |            |                | 8.160.966.844,34           | % sd. Minggu Ini | 89,119                   |        |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |            |              |                  |                  |                      |                    |            |                |                            |                  | RENCANA                  | 73,146 |
|                       |                                                                                                            |            |              |                  |                  |                      |                    |            |                |                            |                  | DEVIASI                  | 15,972 |

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)



**SULAN ST**

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
 Konsultan Supervisi  
 CV. TRAXIAL CONSULTAN

  
**Traxial**  
 Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGUAN**

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
 NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
 NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
 KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| MINGGU KE- | 21                                    |
| PERIODE    | 16 November 2022 s.d 22 November 2022 |

| MATA PEMBAYARA<br>N   | URAIAN PEKERJAAN                                                                                                    | SAT. | HARGA<br>SATUAN | ESTIMASI<br>VOLUME | JUMLAH<br>HARGA  | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |               |                      | NILAI PEKERJAAN<br>MINGGU INI | BOBOT             |                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |               |                      |                               | BOBOT<br>INDIVIDU | TERHADAP<br>INDUK<br>PEKERJAAN |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        | sd.Minggu<br>Lalu  | Minggu<br>Ini | s.d<br>Minggu<br>Ini |                               |                   |                                |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                                      |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                         | LS   | 7.475.000,0     | 1,00               | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,550              | -             | 0,550                | 4.111.250,00                  | 55,00             | 0,050                          |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                                    | LS   | 700.000,0       | 1,00               | 700.000,00       | 0,008  | 1,000              | -             | 1,000                | 700.000,00                    | 100,00            | 0,008                          |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                                | LS   | 600.000,0       | 1,00               | 600.000,00       | 0,007  | 0,445              | -             | 0,445                | 267.000,00                    | 44,50             | 0,003                          |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan<br>Alat Pelindung Diri (APD)                                                       | LS   | 3.405.000,0     | 1,00               | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,445              | -             | 0,445                | 1.515.225,00                  | 44,50             | 0,018                          |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                            | LS   | 10.989.712,7    | 1,00               | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,445              | -             | 0,445                | 4.890.422,15                  | 44,50             | 0,059                          |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                            | LS   | 3.200.000,0     | 1,00               | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,445              | -             | 0,445                | 1.424.000,00                  | 44,50             | 0,017                          |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan<br>alat kesehatan                                                               | LS   | 350.000,0       | 1,00               | 350.000,00       | 0,004  | 0,445              | -             | 0,445                | 155.750,00                    | 44,50             | 0,002                          |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                                       | LS   | 1.810.000,0     | 1,00               | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,445              | -             | 0,445                | 805.450,00                    | 44,50             | 0,010                          |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait<br>Keselamatan Konstruksi sesuai<br>Lingkup pekerjaan dengan<br>kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0     | 1,00               | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,445              | -             | 0,445                | 1.446.250,00                  | 44,50             | 0,018                          |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian<br>risiko Keselamatan Konstruksi                                                  | LS   | 1.050.000,0     | 1,00               | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,445              | -             | 0,445                | 467.250,00                    | 44,50             | 0,006                          |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                                     |      |                 |                    | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |               |                      |                               |                   |                                |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                           |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                                 | m3   | 203.763,70      | 507,69             | 103.448.792,85   | 1,254  | 251,80             | -             | 251,80               | 51.307.699,66                 | 49,60             | 0,622                          |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                                     |      |                 |                    | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |               |                      |                               |                   |                                |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                                       |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                              | m3   | 2.985.117,87    | 2.030,76           | 6.062.057.975,52 | 73,480 | 1.761,90           | 268,86        | 2.030,76             | 6.062.057.975,52              | 100,00            | 73,480                         |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                                     | m3   | 1.994.970,26    | 1.015,38           | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 1.015,38           | -             | 1.015,38             | 2.025.652.901,79              | 100,00            | 24,554                         |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                                     |      |                 |                    | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |               |                      |                               |                   |                                |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                            |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                            | m2   | 212.961,8       | 121,85             | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -             | -                    | -                             | -                 | -                              |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               |                   |                                |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                                     |      |                 |                    | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |               |                      |                               |                   |                                |
| JUMLAH                |                                                                                                                     |      |                 |                    | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |               |                      | 8.154.801.174,12              | JUMLAH            | 98,847                         |
| PPN 11 %              |                                                                                                                     |      |                 |                    | 907.493.265,20   |        |                    |               |                      | 897.028.129,15                | % Minggu Lalu     | 89,119                         |
| TOTAL                 |                                                                                                                     |      |                 |                    | 9.157.432.039,73 |        |                    |               |                      | 9.051.829.303,27              | % Minggu Ini      | 9,728                          |
| PEMBULATAN            |                                                                                                                     |      |                 |                    | 9.157.432.039,73 |        |                    |               |                      | 9.051.829.303,27              | % sd. Minggu Ini  | 98,847                         |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               | RENCANA           | 83,607                         |
|                       |                                                                                                                     |      |                 |                    |                  |        |                    |               |                      |                               | DEVIASI           | 15,240                         |

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)

**SULAN.ST**

Nip. 19810109 200604 1 009

Diketahui Oleh,  
 Konsultan Supervisi  
 TRAXIAL CONSULTAN

**TRAXIAL**  
**SURYADI ST**  
 Inspector



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA



LAPORAN MINGGUAN

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

| MINGGU KE- | 22                                    |
|------------|---------------------------------------|
| PERIODE    | 23 November 2022 s.d 29 November 2022 |

| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI | BOBOT            |                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                            | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDUK PEKERJAAN |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,550              | 0,25       | 0,800          | 5.980.000,00               | 80,00            | 0,072                    |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 1,000              | -          | 1,000          | 700.000,00                 | 100,00           | 0,008                    |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,445              | 0,25       | 0,695          | 417.000,00                 | 69,50            | 0,005                    |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,445              | 0,25       | 0,695          | 2.366.475,00               | 69,50            | 0,029                    |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,445              | 0,25       | 0,695          | 7.637.850,33               | 69,50            | 0,093                    |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,445              | 0,25       | 0,695          | 2.224.000,00               | 69,50            | 0,027                    |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,445              | 0,25       | 0,695          | 243.250,00                 | 69,50            | 0,003                    |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,445              | 0,25       | 0,695          | 1.257.950,00               | 69,50            | 0,015                    |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,445              | 0,25       | 0,695          | 2.258.750,00               | 69,50            | 0,027                    |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,445              | 0,25       | 0,695          | 729.750,00                 | 69,50            | 0,009                    |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | 251,80             | 92,70      | 344,50         | 70.196.594,65              | 67,86            | 0,851                    |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Deton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | 2.030,76           | -          | 2.030,76       | 6.062.057.975,52           | 100,00           | 73,480                   |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 1.015,38           | -          | 1.015,38       | 2.025.652.901,79           | 100,00           | 24,554                   |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |            |                |                            |                  |                          |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |            |                | 8.181.722.497,28           | JUMLAH           | 99,173                   |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |            |                | 899.989.474,70             | % Minggu Lalu    | 98,847                   |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 9.081.711.971,99           | % Minggu Ini     | 0,326                    |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 9.081.711.971,99           | % sd. Minggu Ini | 99,173                   |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            | RENCANA          | 91,509                   |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            | DEVIASI          | 7,664                    |

Diketahui Oleh,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

SULAN ST

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
Konsultan Supervisi  
TRAXIAL CONSULTAN

Traxial  
Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGU DAN BULAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

**BULAN. 06**

**CV. TRAXIAL CONSULTANT**

**TA. 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN BULANAN**

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
 NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
 NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
 KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

| BULAN   | 06            |
|---------|---------------|
| PERIODE | DESEMBER 2022 |

| MATA PEMBARAAN        | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |           |              | NILAI PEKERJAAN BULAN INI | BOBOT           |                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |           |              |                           | BOBOT INDIVIDU  | TERHADAP INDUK PEKERJAAN |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Bulan Lalu      | Bulan Ini | sd.Bulan Ini |                           |                 |                          |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           |                 |                          |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,80               | 0,20      | 1,000        | 7.475.000,00              | 100,00          | 0,091                    |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |           | -            |                           |                 |                          |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 1,00               | -         | 1,000        | 700.000,00                | 100,00          | 0,008                    |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,70               | 0,31      | 1,000        | 600.000,00                | 100,00          | 0,007                    |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,70               | 0,31      | 1,000        | 3.405.000,00              | 100,00          | 0,041                    |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,70               | 0,31      | 1,000        | 10.989.712,70             | 100,00          | 0,133                    |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,70               | 0,31      | 1,000        | 3.200.000,00              | 100,00          | 0,039                    |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,70               | 0,31      | 1,000        | 350.000,00                | 100,00          | 0,004                    |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,70               | 0,31      | 1,000        | 1.810.000,00              | 100,00          | 0,022                    |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,70               | 0,31      | 1,000        | 3.250.000,00              | 100,00          | 0,039                    |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,70               | 0,31      | 1,000        | 1.050.000,00              | 100,00          | 0,013                    |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |           |              |                           |                 |                          |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           |                 |                          |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | -                  | -         | 507,690      | 103.448.792,85            | 100,00          | 1,254                    |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           |                 |                          |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |           |              |                           |                 |                          |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           |                 |                          |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | 603,60             | 1.427,16  | 2.030,76     | 6.062.057.975,52          | 100,00          | 73,480                   |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 888,20             | 127,18    | 1.015,38     | 2.025.652.901,79          | 100,00          | 24,554                   |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           |                 |                          |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |           |              |                           |                 |                          |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           |                 |                          |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | 121,85    | 121,850      | 25.949.391,67             | 100,00          | 0,315                    |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           |                 |                          |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |           |              |                           |                 |                          |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |           |              | 8.249.938.774,54          | JUMLAH          | 100,000                  |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |           |              | 907.493.265,20            | % Bulan Lalu    | 99,173                   |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |           |              | 9.157.432.039,73          | % Bulan Ini     | 0,827                    |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |           |              | 9.157.432.039,73          | % sd. Bulan Ini | 100,00                   |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           |                 |                          |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           | RENCANA         | 99,826                   |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |           |              |                           | DEVIASI         | 0,174                    |

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Penandatanganan Kontrak  
 (PPK)

**WAHYUDDIN, ST**

NIP. 19790712 201001 1 017

Dikerjakan Oleh,  
 Konsultan Supervisi  
 TRAXIAL CONSULTAN

**TRAXIAL**  
 Site Engineer



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGUAN**

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
 NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
 NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
 KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| MINGGU KE- | 23                                    |
| PERIODE    | 30 November 2022 s.d 06 Desember 2022 |

| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI | BOBOT            |                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                            | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDUK PEKERJAAN |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,80               | -          | 0,80           | 5.980.000,00               | 80,00            | 0,072                    |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 1,00               | -          | 1,00           | 700.000,00                 | 100,00           | 0,008                    |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,70               | 0,10       | 0,80           | 477.000,00                 | 79,50            | 0,006                    |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,70               | 0,10       | 0,80           | 2.706.975,00               | 79,50            | 0,033                    |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,70               | 0,10       | 0,80           | 8.736.821,60               | 79,50            | 0,106                    |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,70               | 0,10       | 0,80           | 2.544.000,00               | 79,50            | 0,031                    |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,70               | 0,10       | 0,80           | 278.250,00                 | 79,50            | 0,003                    |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,70               | 0,10       | 0,80           | 1.438.950,00               | 79,50            | 0,017                    |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,70               | 0,10       | 0,80           | 2.583.750,00               | 79,50            | 0,031                    |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,70               | 0,10       | 0,80           | 834.750,00                 | 79,50            | 0,010                    |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | 344,50             | 117,40     | 461,90         | 94.118.453,03              | 90,98            | 1,141                    |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | 2.030,76           | -          | 2.030,76       | 6.062.057.975,52           | 100,00           | 73,480                   |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 1.015,38           | -          | 1.015,38       | 2.025.652.901,79           | 100,00           | 24,554                   |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | -          | -              | -                          | -                | -                        |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |            |                |                            |                  |                          |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |            |                | 8.208.109.826,93           | JUMLAH           | 99,493                   |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |            |                | 902.892.080,96             | % Minggu Lalu    | 99,173                   |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 9.111.001.907,90           | % Minggu Ini     | 0,320                    |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 9.111.001.907,90           | % sd. Minggu Ini | 99,493                   |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            | RENCANA          | 99,412                   |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                | DEVIASI                    | 0,081            |                          |

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)

**SULAN, ST**

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
 Konsultan Supervisi  
 CV. TRAXIAL CONSULTAN

  
**Traxial**  
 SUPERVISOR  
 Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN MINGGUAN**

NAMA PAKET : LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU - MAHALONA (RUAS PEKALOA - TOLE)  
 NOMOR KONTRAK : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022  
 NILAI KONTRAK : Rp 9.157.432.039,73  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GATRA BUANA  
 KONSULTAN SUPERVISI : CV. TRAXIAL CONSULTAN

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| MINGGU KE- | 24                                    |
| PERIODE    | 07 Desember 2022 s.d 13 Desember 2022 |

| MATA PEMBAYARAN       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                           | SAT. | HARGA SATUAN | ESTIMASI VOLUME | JUMLAH HARGA     | BOBOT  | KEMAJUAN PEKERJAAN |            |                | NILAI PEKERJAAN MINGGU INI | BOBOT            |                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | VOLUME TERLAKSANA  |            |                |                            | BOBOT INDIVIDU   | TERHADAP INDIK PEKERJAAN |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        | sd.Minggu Lalu     | Minggu Ini | s.d Minggu Ini |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 1. UMUM                                                                                             |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 1.2                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                                                | LS   | 7.475.000,0  | 1,00            | 7.475.000,00     | 0,091  | 0,80               | 0,20       | 1,000          | 7.475.000,00               | 100,00           | 0,091                    |
| 1.19                  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | 1 Penyiapan RKK,                                                                                           | LS   | 700.000,0    | 1,00            | 700.000,00       | 0,008  | 1,00               | -          | 1,000          | 700.000,00                 | 100,00           | 0,008                    |
|                       | 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan                                                                       | LS   | 600.000,0    | 1,00            | 600.000,00       | 0,007  | 0,80               | 0,21       | 1,000          | 600.000,00                 | 100,00           | 0,007                    |
|                       | 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)                                                 | LS   | 3.405.000,0  | 1,00            | 3.405.000,00     | 0,041  | 0,80               | 0,21       | 1,000          | 3.405.000,00               | 100,00           | 0,041                    |
|                       | 4 Asuransi dan Perizinan                                                                                   | LS   | 10.989.712,7 | 1,00            | 10.989.712,70    | 0,133  | 0,80               | 0,21       | 1,000          | 10.989.712,70              | 100,00           | 0,133                    |
|                       | 5 Personel K3 Konstruksi                                                                                   | LS   | 3.200.000,0  | 1,00            | 3.200.000,00     | 0,039  | 0,80               | 0,21       | 1,000          | 3.200.000,00               | 100,00           | 0,039                    |
|                       | 6 Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan                                                         | LS   | 350.000,0    | 1,00            | 350.000,00       | 0,004  | 0,80               | 0,21       | 1,000          | 350.000,00                 | 100,00           | 0,004                    |
|                       | 7 Rambu-Rambu yang diperlukan                                                                              | LS   | 1.810.000,0  | 1,00            | 1.810.000,00     | 0,022  | 0,80               | 0,21       | 1,000          | 1.810.000,00               | 100,00           | 0,022                    |
|                       | 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai Lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan | LS   | 3.250.000,0  | 1,00            | 3.250.000,00     | 0,039  | 0,80               | 0,21       | 1,000          | 3.250.000,00               | 100,00           | 0,039                    |
|                       | 9 Lain- lain terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi                                            | LS   | 1.050.000,0  | 1,00            | 1.050.000,00     | 0,013  | 0,80               | 0,21       | 1,000          | 1.050.000,00               | 100,00           | 0,013                    |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1                                                                            |      |              |                 | 32.829.712,70    | 0,398  |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                                  |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 3.2.(2a)              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                                                        | m3   | 203.763,70   | 507,69          | 103.448.792,85   | 1,254  | 461,90             | 45,79      | 507,69         | 103.448.792,85             | 100,00           | 1,254                    |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3                                                                            |      |              |                 | 103.448.792,85   | 1,254  |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                              |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 5.3.(1)               | Perkerasan Beton Semen                                                                                     | m3   | 2.985.117,87 | 2.030,76        | 6.062.057.975,52 | 73,480 | 2.030,76           | -          | 2.030,76       | 6.062.057.975,52           | 100,00           | 73,480                   |
| 5.3.(3)               | Lapis Pondasi Bawah Beton Korus                                                                            | m3   | 1.994.970,26 | 1.015,38        | 2.025.652.901,79 | 24,554 | 1.015,38           | -          | 1.015,38       | 2.025.652.901,79           | 100,00           | 24,554                   |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5                                                                            |      |              |                 | 8.087.710.877,31 | 98,034 |                    |            |                |                            |                  |                          |
|                       | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN-LAIN                                                                   |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            |                  |                          |
| 9.2.(1)               | Marka jalan termoplastik                                                                                   | m2   | 212.961,8    | 121,85          | 25.949.391,67    | 0,315  | -                  | 121,85     | 121,85         | 25.949.391,67              | 100,00           | 0,315                    |
|                       | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9                                                                            |      |              |                 | 25.949.391,67    | 0,315  |                    |            |                |                            |                  |                          |
| JUMLAH                |                                                                                                            |      |              |                 | 8.249.938.774,54 | 100,00 |                    |            |                | 8.249.938.774,54           | JUMLAH           | 100,000                  |
| PPN 11 %              |                                                                                                            |      |              |                 | 907.493.265,20   |        |                    |            |                | 907.493.265,20             | % Minggu Lalu    | 99,493                   |
| TOTAL                 |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 9.157.432.039,73           | % Minggu Ini     | 0,507                    |
| PEMBULATAN            |                                                                                                            |      |              |                 | 9.157.432.039,73 |        |                    |            |                | 9.157.432.039,73           | % sd. Minggu Ini | 100,00                   |
| KETERANGAN/ CATATAN : |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            | RENCANA          | 99,826                   |
|                       |                                                                                                            |      |              |                 |                  |        |                    |            |                |                            | DEVIASI          | 0,174                    |

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)

**SULAN ST**

Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
 Konsultan Supervisi  
 TRAXIAL CONSULTAN

**Traxial**  
 SURIADIST  
 Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**



**LAPORAN BACK UP DATA**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

**CV. TRAXIAL CONSULTANT**

**TA. 2022**





## LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Ruas : **Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru-Mahalona (Ruas Pekaloa-Tole)**  
Pelaksana : CV. GATRA BUANA  
Konsultan : CV. TRAXIAL KONSULTAN

Item Pekerjaan : **Perkerasan Beton Semen**  
 Nomor Divisi : 5.3.(1)  
 Satuan : m3

[illegible]

Diketahui Oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)



**SULAN, ST**  
Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan  
Konsultan Supervisi  
KONSULTAN  
SURYADLST  
Inspector

## LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Ruas      | : Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru-Mahalona (Ruas Pekaloa-Tole) |
| Pelaksana | : CV. GATRA BUANA                                                      |
| Konsultan | : CV. TRAXIAL KONSULTAN                                                |

Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus  
 Nomor Divisi : 5.3.(3)  
 Satuan : m3

| NO | STA. | POSISI | DIMENSI |           | PANJANG | VOLUME  |           | KETERANGAN |
|----|------|--------|---------|-----------|---------|---------|-----------|------------|
|    |      |        | RENCANA | TERPASANG |         | RENCANA | TERPASANG |            |

## LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ruas           | : <b>Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru-Mahalona (Ruas Pekaloa-Tole)</b> |
| Pelaksana      | : CV. GATRA BUANA                                                             |
| Konsultan      | : CV. TRAXIAL KONSULTAN                                                       |
| Item Pekerjaan | : <b>Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus</b>                                      |
| Nomor Divisi   | : 5.3.(3)                                                                     |
| Satuan         | : m3                                                                          |

Item Pekerjaan : **Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus**  
 Nomor Divisi : 5.3.(3)  
 Satuan : m3

[illegible]

Diketahui Oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

**SULAN, ST**  
Nip. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan  
Konsultan Supervisi  
**TRAXIAL KONSULTAN**  
  
**TRAXIAL** SURYADLST  
Inspector

Traxia  
Inspector

Ruas : **Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru-Mahalona (Ruas Pekaloa-Tole)**  
Pelaksana : CV. GATRA BUANA  
Konsultan : CV. TRAXIAL KONSULTAN

Item Pekerjaan : **Timbunan Pilihan dari sumber galian**  
Nomor Divisi : 3.2.(2a)  
Satuan : m3

**SULAN, ST**  
NIP. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
Consultan Super  
TRAXIAL M  
Traxial  
SURABAYA  
Inspector

**LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN**

Ruas : **Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru-Mahalona (Ruas Pekalao-Tole)**  
 Pelaksana : **CV. GATRA BUANA**  
 Konsultan : **CV. TRAXIAL KONSULTAN**

Item Pekerjaan : **Timbunan Pilihan dari sumber galian**  
 Nomor Divisi : **3.2.(2a)**  
 Satuan : **m3**

| NO     | STA.  | POSISI | DIMENSI |       |           |       | PANJANG | LUASAN |       | VOLUME  |        | KETERANGAN |
|--------|-------|--------|---------|-------|-----------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|------------|
|        |       |        | RENCANA |       | TERPASANG |       |         | Segmen | Rata2 | RENCANA | PASANG |            |
|        |       |        | Lebar   | Tebal | Lebar     | Tebal |         |        |       |         |        |            |
|        |       |        |         |       |           |       |         |        |       |         |        |            |
| 1      | 0+000 | KANAN  | 0,60    | 0,30  | 0,62      | 0,32  |         | 0,20   |       |         |        |            |
| 2      | 0+050 | KANAN  | 0,50    | 0,30  | 0,53      | 0,30  | 50,00   | 0,16   | 0,18  | 9,00    | 8,94   | BAHU JALAN |
| 3      | 0+100 | KANAN  | 0,50    | 0,30  | 0,48      | 0,33  | 50,00   | 0,16   | 0,16  | 7,50    | 7,94   |            |
| 4      | 0+150 | KANAN  | 0,50    | 0,35  | 0,50      | 0,35  | 50,00   | 0,18   | 0,17  | 7,50    | 8,34   |            |
| 5      | 0+200 | KANAN  | 0,50    | 0,45  | 0,53      | 0,48  | 50,00   | 0,25   | 0,21  | 8,75    | 10,74  |            |
| 6      | 0+250 | KANAN  | 0,50    | 0,30  | 0,52      | 0,32  | 50,00   | 0,17   | 0,21  | 11,25   | 10,54  |            |
| 7      | 0+300 | KANAN  | 0,50    | 0,30  | 0,52      | 0,30  | 50,00   | 0,16   | 0,16  | 7,50    | 8,08   |            |
| 8      | 0+350 | KANAN  | 0,50    | 0,45  | 0,50      | 0,45  | 50,00   | 0,23   | 0,19  | 7,50    | 9,53   |            |
| 9      | 0+400 | KANAN  | 0,55    | 0,55  | 0,55      | 0,56  | 50,00   | 0,31   | 0,27  | 11,25   | 13,33  |            |
| 10     | 0+450 | KANAN  | 0,50    | 0,35  | 0,50      | 0,38  | 50,00   | 0,19   | 0,25  | 15,13   | 12,45  |            |
| 11     | 0+500 | KANAN  | 0,55    | 0,45  | 0,55      | 0,47  | 50,00   | 0,26   | 0,22  | 8,75    | 11,21  |            |
| 12     | 0+550 | KANAN  | 0,60    | 0,35  | 0,62      | 0,35  | 50,00   | 0,22   | 0,24  | 12,38   | 11,89  |            |
| 13     | 0+600 | KANAN  | 0,55    | 0,30  | 0,55      | 0,30  | 50,00   | 0,17   | 0,19  | 10,50   | 9,55   |            |
| 14     | 0+650 | KANAN  | 0,55    | 0,35  | 0,55      | 0,38  | 50,00   | 0,21   | 0,19  | 8,25    | 9,35   |            |
| 15     | 0+700 | KANAN  | 0,50    | 0,30  | 0,50      | 0,30  | 50,00   | 0,15   | 0,18  | 9,63    | 8,98   |            |
| 16     | 0+750 | KANAN  | 0,60    | 0,50  | 0,63      | 0,52  | 50,00   | 0,33   | 0,24  | 7,50    | 11,94  |            |
| 17     | 0+800 | KANAN  | 0,50    | 0,40  | 0,52      | 0,41  | 50,00   | 0,21   | 0,27  | 15,00   | 13,52  |            |
| 18     | 0+850 | KANAN  | 0,50    | 0,45  | 0,52      | 0,45  | 50,00   | 0,23   | 0,22  | 10,00   | 11,18  |            |
| 19     | 0+900 | KANAN  | 0,55    | 0,35  | 0,55      | 0,35  | 50,00   | 0,193  | 0,21  | 11,25   | 10,66  |            |
| 20     | 0+950 | KANAN  | 0,50    | 0,30  | 0,53      | 0,30  | 50,00   | 0,159  | 0,18  | 9,63    | 8,79   |            |
| 21     | 1+000 | KANAN  | 0,55    | 0,30  | 0,58      | 0,32  | 50,00   | 0,186  | 0,17  | 7,50    | 8,62   |            |
| 22     | 1+050 | KANAN  | 0,55    | 0,30  | 0,55      | 0,30  | 50,00   | 0,165  | 0,18  | 8,25    | 8,77   |            |
| 23     | 1+100 | KANAN  | 0,50    | 0,30  | 0,52      | 0,30  | 50,00   | 0,156  | 0,16  | 8,25    | 8,03   |            |
| 24     | 1+150 | KANAN  | 0,50    | 0,30  | 0,50      | 0,32  | 50,00   | 0,160  | 0,16  | 7,50    | 7,90   |            |
| 25     | 1+200 | KANAN  | 0,50    | 0,35  | 0,50      | 0,35  | 50,00   | 0,175  | 0,17  | 7,50    | 8,38   |            |
| 26     | 1+250 | KANAN  | 0,55    | 0,30  | 0,55      | 0,30  | 50,00   | 0,165  | 0,17  | 8,75    | 8,50   |            |
| 27     | 1+300 | KANAN  | 0,55    | 0,30  | 0,58      | 0,32  | 50,00   | 0,186  | 0,18  | 8,25    | 8,77   |            |
| 28     | 1+350 | KANAN  | 0,50    | 0,30  | 0,53      | 0,32  | 50,00   | 0,170  | 0,18  | 8,25    | 8,88   |            |
| 29     | 1+400 | KANAN  | 0,50    | 0,30  | 0,50      | 0,30  | 50,00   | 0,150  | 0,16  | 7,50    | 7,99   |            |
|        |       |        |         |       |           |       |         |        |       |         |        |            |
|        |       |        |         |       |           |       |         |        |       |         |        |            |
| Jumlah |       |        |         |       |           |       |         |        |       | 260,00  | 272,73 | m3         |

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
**PPTK**



**SULAN, ST**  
 NIP. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
 Konsultan Supervisi  
**TRAXIAL KONSULTAN**



## LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ruas      | : <b>Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru-Mahalona (Ruas Pekaloa-Tole)</b> |
| Pelaksana | : CV. GATRA BUANA                                                             |
| Konsultan | : CV. TRAXIAL KONSULTAN                                                       |

Item Pekerjaan : **Timbunan Pilihan dari sumber galian**  
 Nomor Divisi : **3.2.(2a)**  
 Satuan : **m3**

[illegible]

**SULAN, ST**  
NIP. 19810109 200604 1 009

Inspector

## LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

Ruas : **Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru-Mahalona (Ruas Pekaloa-Tole)**  
 Pelaksana : CV. GATRA BUANA  
 Konsultan : CV. TRAXIAL KONSULTAN  
  
 Item Pekerjaan : **Marka Jalan Termoplastik**  
 Nomor Divisi : M2  
 Satuan : 9.2.(1)

SKETS.

MODUL/EDGE     
 SOLID

| NO     | KM./STA | POSISI | UKURAN |         | VOLUME  |        | KETERANGAN |
|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|------------|
|        |         |        | LEBAR  | PANJANG | RENCANA | PASANG |            |
| 1      | 0+000   | TENGAH | 0,12   |         | 3,75    | 3,75   | MODUL      |
| 2      | 0+050   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 3      | 0+100   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 4      | 0+150   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 5      | 0+200   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 6      | 0+250   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 7      | 0+300   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 8      | 0+350   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 9      | 0+400   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 10     | 0+450   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 11     | 0+500   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 12     | 0+550   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 13     | 0+600   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 14     | 0+650   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 15     | 0+700   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 16     | 0+750   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 17     | 0+800   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 18     | 0+850   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 19     | 0+900   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 20     | 0+950   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 21     | 1+000   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 22     | 1+050   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 23     | 1+100   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 24     | 1+150   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 25     | 1+200   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 26     | 1+250   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 27     | 1+300   | TENGAH | 0,12   | 50,0    | 3,75    | 3,75   |            |
| 28     | 1+350   | TENGAH | 0,12   |         | -       | -      |            |
| JUMLAH |         |        |        | 1.350   | 101,25  | 101,25 |            |

Diketahui Oleh,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 PPTK



**SULAN, ST**

NIP. 19810109 200604 1 009

Dikerjakan Oleh,  
 Konsultan Supervisi

**TRAXIAL KONSULTAN**



Inspector

## LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ruas           | : <b>Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru-Mahalona (Ruas Pekaloa-Tole)</b> |
| Pelaksana      | : CV. GATRA BUANA                                                             |
| Konsultan      | : CV. TRAXIAL KONSULTAN                                                       |
| Item Pekerjaan | : <b>Marka Jalan Termoplastik</b>                                             |
| Nomor Divisi   | : M2                                                                          |
| Satuan         | : 9.2.(1)                                                                     |

Satuan : 9.2.(1)

**SOLID**

[illegible]

**PPTK**

SULAN, ST

NIP. 19810109 200604 1 009

**CV. TRAXIAL KONSULTAN**

**SURYADI ST**  
Inspector



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG BINA MARGA**





***DOKUMENTASI LAPANGAN***  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

**CV. TRAXIAL CONSULTANT**

**TA. 2022**

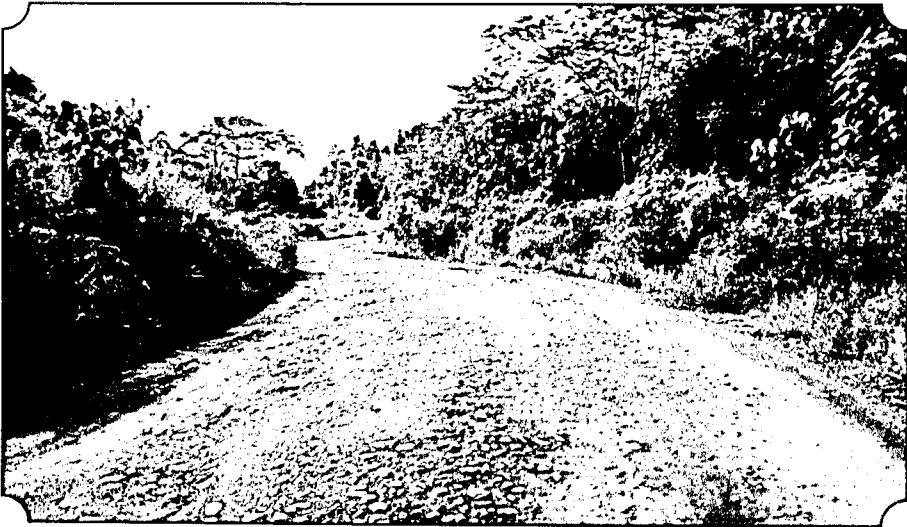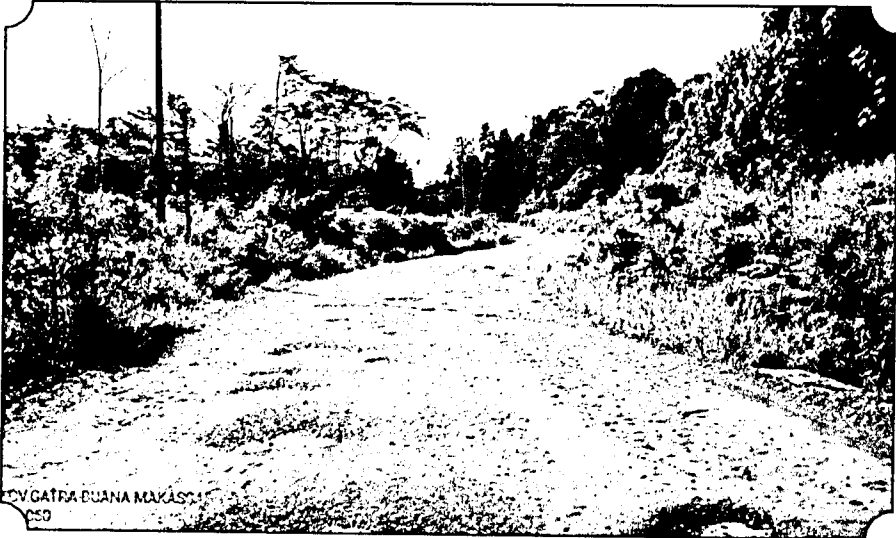
**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | Keterangan             |
|                                                                                      | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                      | STA.0+000              |
|   | Keterangan             |
|                                                                                      | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                      | STA.0+050              |
|  | Keterangan             |
|                                                                                      | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                      | STA.0+100              |




**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <p>CV GATRA BIANNA MASAGAR<br/> 0+300<br/> 2.420.000, 121.51273 (±40m)<br/> Ketinggian: 370m<br/> Jalan Tanpa Nama, Mahalona, Kec. Towuti, Sulawesi Selatan<br/> 982</p>   | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | STA.0+300              |
|  <p>CV GATRA BIANNA MASAGAR<br/> 0+350<br/> 2.420.000, 121.51318 (±26m)<br/> Ketinggian: 370m<br/> Jalan Tanpa Nama, Mahalona, Kec. Towuti, Sulawesi Selatan<br/> 982</p>  | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | STA.0+350              |
|  <p>CV GATRA BIANNA MASAGAR<br/> 0+400<br/> 2.420.000, 121.51358 (±26m)<br/> Ketinggian: 370m<br/> Jalan Tanpa Nama, Mahalona, Kec. Towuti, Sulawesi Selatan<br/> 982</p> | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | STA.0+400              |

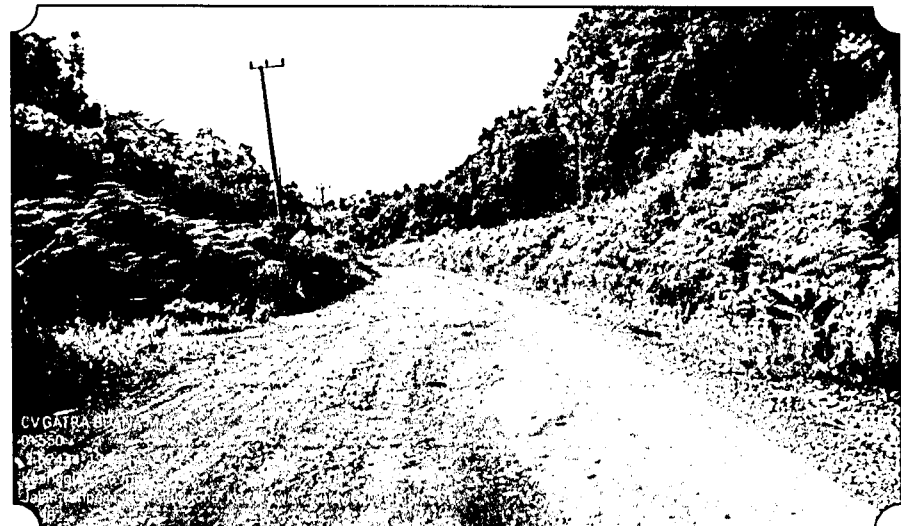
**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | Keterangan             |
|                                                                                      | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                      | STA.0+450              |
|   | Keterangan             |
|                                                                                      | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                      | STA.0+500              |
|  | Keterangan             |
|                                                                                      | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                      | STA.0+550              |

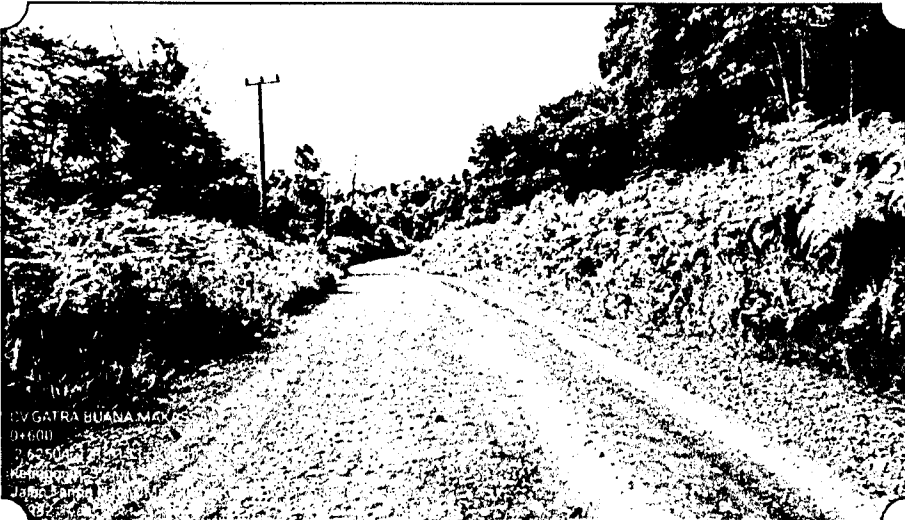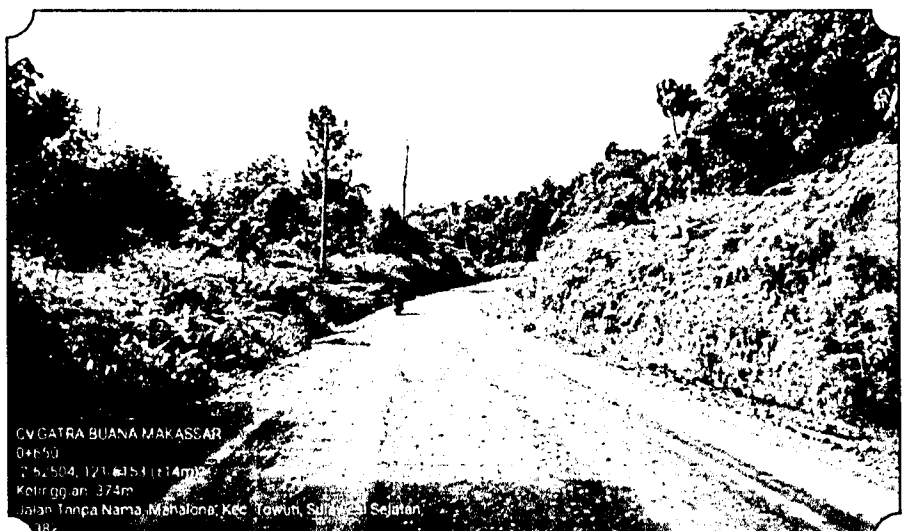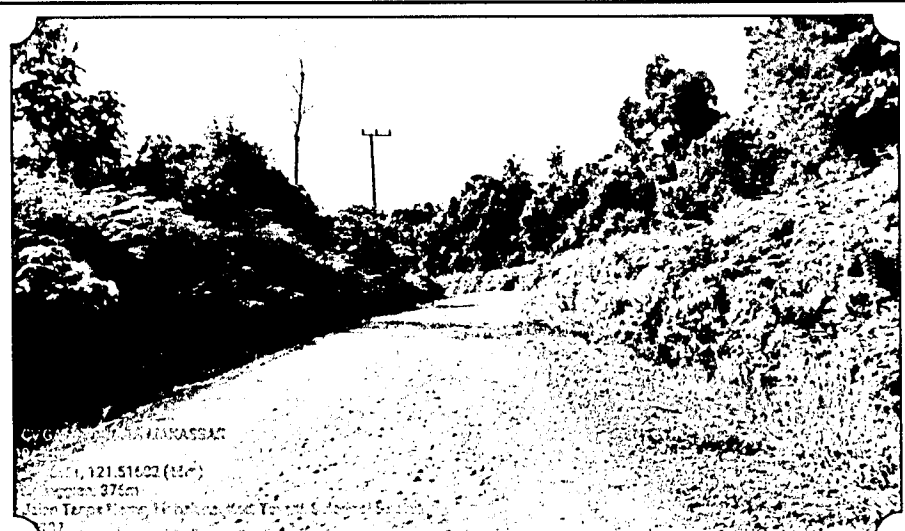
**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <p>CV GATRA BUANA MAKASSAR<br/> 0+600<br/> 7 51.504, 121.5154 (114m)<br/> Ketinggian: 374m<br/> Jalan Tanpa Nama, Mahalona, Kec. Towuti, Sula, Sulawesi Selatan<br/> 182</p>   | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | STA.0+600              |
|  <p>CV GATRA BUANA MAKASSAR<br/> 0+650<br/> 7 51.504, 121.5154 (114m)<br/> Ketinggian: 374m<br/> Jalan Tanpa Nama, Mahalona, Kec. Towuti, Sula, Sulawesi Selatan<br/> 182</p>  | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | STA.0+650              |
|  <p>CV GATRA BUANA MAKASSAR<br/> 0+700<br/> 7 51.504, 121.5154 (114m)<br/> Ketinggian: 376m<br/> Jalan Tanpa Nama, Mahalona, Kec. Towuti, Sula, Sulawesi Selatan<br/> 182</p> | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | STA.0+700              |

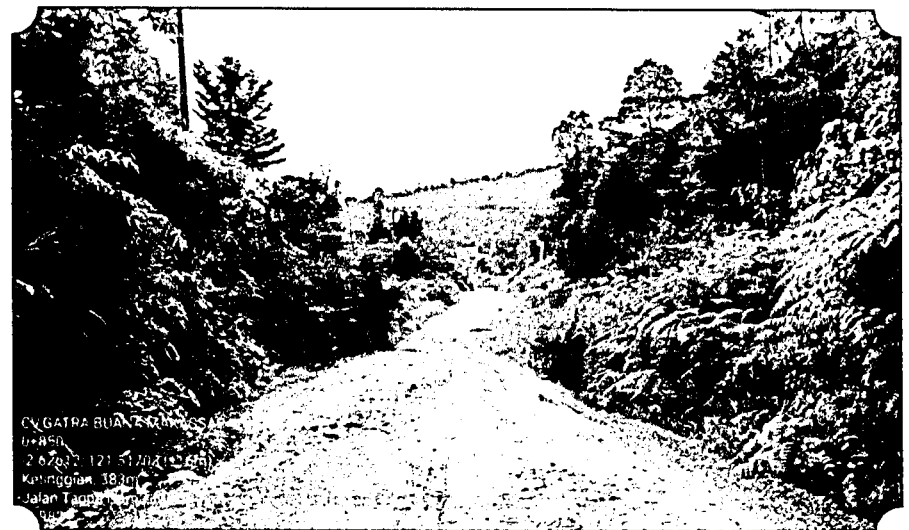**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <p>CV. GATRA BUANA MAHASAR<br/> 0+750<br/> 2 62584 121 51611 (5070)<br/> Ketinggian: 376m<br/> Jalan Tanpa Nama, Kikukuk, 182, Towuti, Sulawesi Selatan</p>   | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | STA.0+750              |
|  <p>CV. GATRA BUANA MAHASAR<br/> 0+800<br/> 2 62584 121 51611 (5070)<br/> Ketinggian: 379m<br/> Jalan Tanpa Nama, Kikukuk, 182, Towuti, Sulawesi Selatan</p>  | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | STA.0+800              |
|  <p>CV. GATRA BUANA MAHASAR<br/> 0+850<br/> 2 62584 121 51611 (5070)<br/> Ketinggian: 383m<br/> Jalan Tanpa Nama, Kikukuk, 182, Towuti, Sulawesi Selatan</p> | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | STA.0+850              |

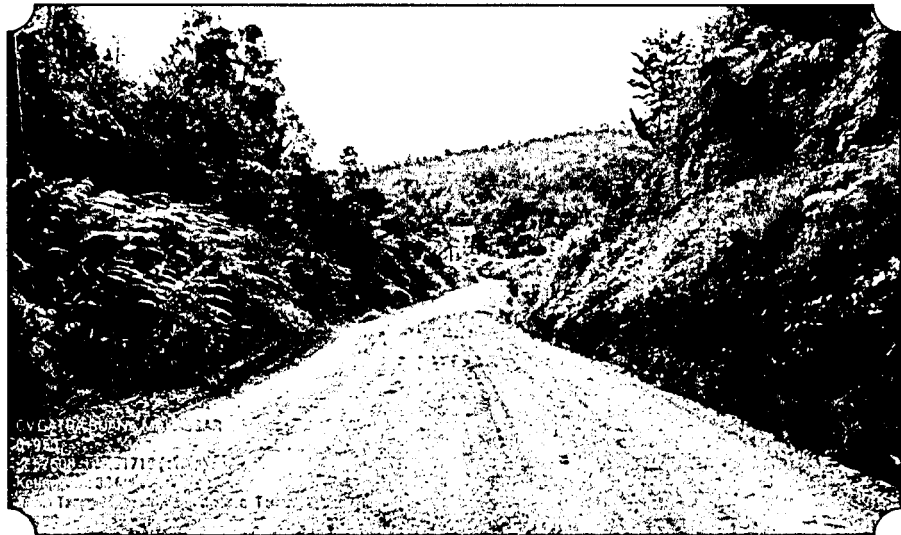
**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | Keterangan             |
|                                                                                      | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                      | STA.0+900              |
|   | Keterangan             |
|                                                                                      | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                      | STA.0+950              |
|  | Keterangan             |
|                                                                                      | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                      | STA.1+000              |



**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | Keterangan             |
|                                                                                      | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                      | STA.1+050              |
|   | Keterangan             |
|                                                                                      | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                      | STA.1+100              |
|  | Keterangan             |
|                                                                                      | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                      | STA.1+150              |

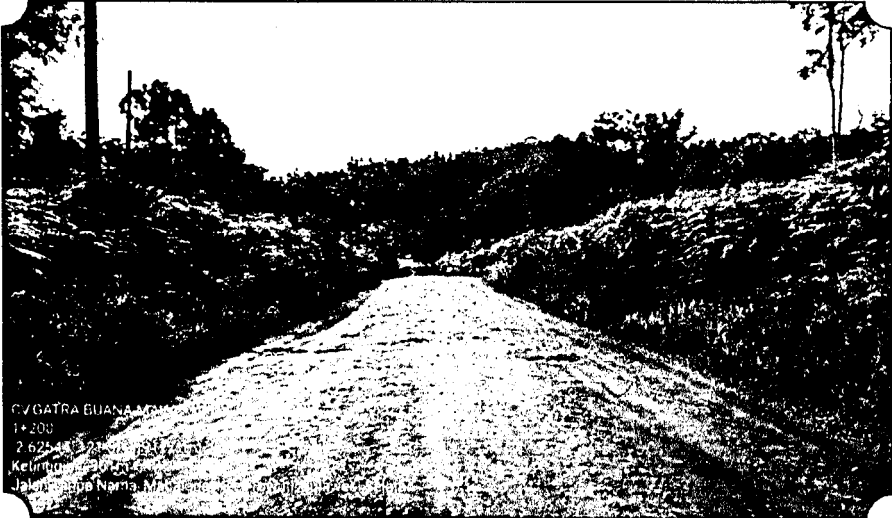
**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                                                                                                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <p>CV GATRA BUANA<br/>1+200<br/>2 625 41 521<br/>Kelompok 100-205<br/>Jalan Kampung Baru Mahalona</p>           | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                    | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                    | STA.1+200              |
|  <p>CV GATRA BUANA MAKASSAR<br/>1+250<br/>2 625 41 521<br/>Kelompok 100-205<br/>Jalan Kampung Baru Mahalona</p> | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                    | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                    | STA.1+250              |
|  <p>CV GATRA BUANA<br/>1+300<br/>2 625 41 521<br/>Kelompok 100-205<br/>Jalan Kampung Baru Mahalona</p>         | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                    | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                    | STA.1+300              |

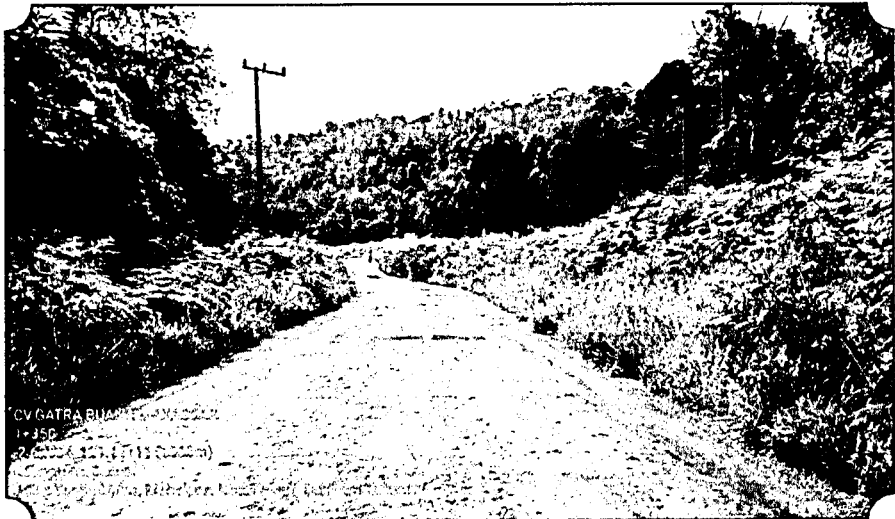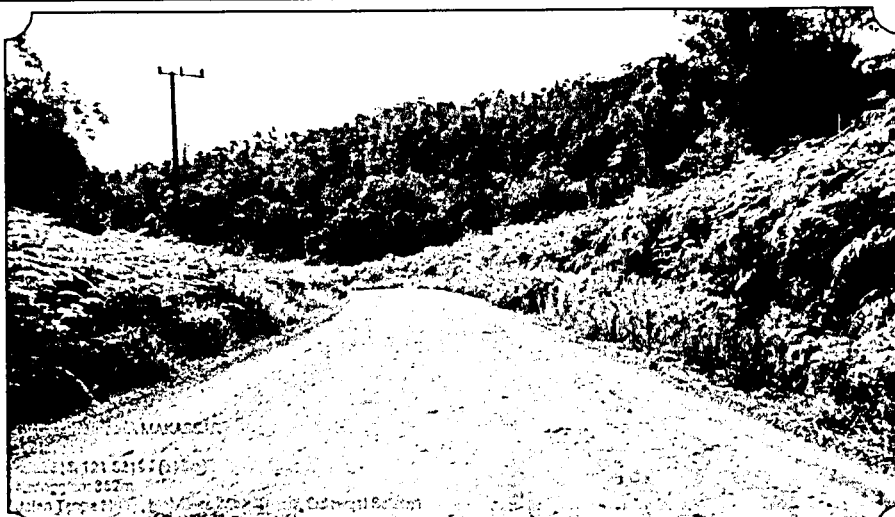**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <p>CV GATRA BUNDA, ASSAT<br/>             1+350<br/>             Elevasi: 121,52156 (14m)<br/>             Elevasi: 351m<br/>             Jalan Tumpukan, Kampung Baru, Kecamatan Mahalona, Kabupaten Tawuti, Sulawesi Selatan</p>   | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STA.1+350              |
|  <p>CV GATRA BUNDA, ASSAT<br/>             1+400<br/>             Elevasi: 121,52156 (14m)<br/>             Elevasi: 351m<br/>             Jalan Tumpukan, Kampung Baru, Kecamatan Mahalona, Kabupaten Tawuti, Sulawesi Selatan</p>  | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STA.1+400              |
|  <p>CV GATRA BUNDA, ASSAT<br/>             1+450<br/>             Elevasi: 121,52156 (14m)<br/>             Elevasi: 351m<br/>             Jalan Tumpukan, Kampung Baru, Kecamatan Mahalona, Kabupaten Tawuti, Sulawesi Selatan</p> | Keterangan             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KONDISI AWAL PEKERJAAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STA.1+450              |

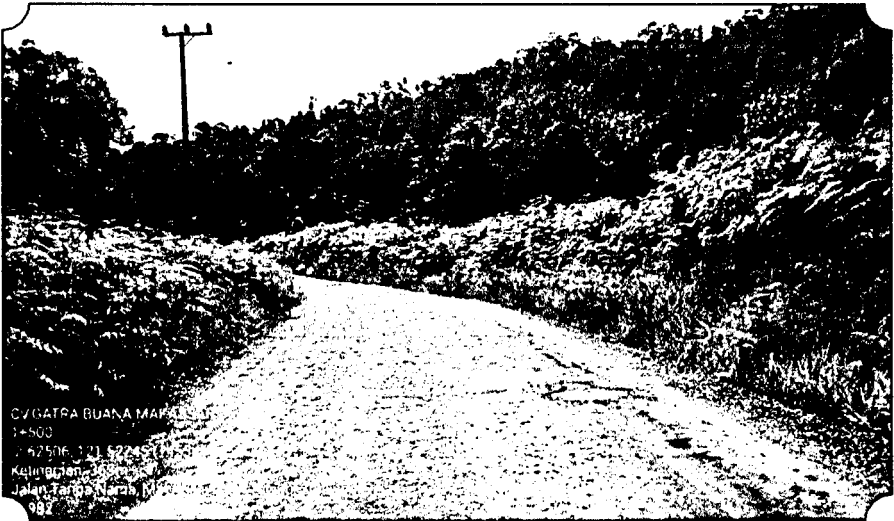**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  <p>CV GATRA BUANA MAKASSAR<br/> 1+500<br/> Q. 62506, 121.52225 (±137m)<br/> Ketinggian 343m<br/> Jalan Tanpa Nama, Mahalona, Kec. Fortuna, Sulawesi Selatan<br/> 982</p>   | <p>Keterangan</p> <p>KONDISI AWAL PEKERJAAN</p> <p>STA.1+500</p> |
|  <p>CV GATRA BUANA MAKASSAR<br/> 1+550<br/> Q. 62506, 121.52225 (±137m)<br/> Ketinggian 343m<br/> Jalan Tanpa Nama, Mahalona, Kec. Fortuna, Sulawesi Selatan<br/> 982</p>  | <p>Keterangan</p> <p>KONDISI AWAL PEKERJAAN</p> <p>STA.1+550</p> |
|  <p>CV GATRA BUANA MAKASSAR<br/> 1+600<br/> Q. 62472, 121.52325 (±137m)<br/> Ketinggian 343m<br/> Jalan Tanpa Nama, Mahalona, Kec. Fortuna, Sulawesi Selatan<br/> 982</p> | <p>Keterangan</p> <p>KONDISI AWAL PEKERJAAN</p> <p>STA.1+600</p> |

**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KONTRAKTOR: PT. BUKITIA MAKASSAR<br/>         1+600<br/>         2.42472, 121.53325 (1127m)<br/>         Ketinggian: 952m<br/>         Jalan Tingo Nemo, Mahalona, Kec. Tottoli, Sulawesi Selatan<br/>         932</p>   | <p>Keterangan</p> <p>LAPIS PONDASI BAWAH BETON KURUS (SISI KANAN)</p> <p>STA.1+600</p> |
|  <p>KONTRAKTOR: PT. BUKITIA MAKASSAR<br/>         1+650<br/>         2.42472, 121.53325 (1127m)<br/>         Ketinggian: 952m<br/>         Jalan Tingo Nemo, Mahalona, Kec. Tottoli, Sulawesi Selatan<br/>         932</p>  | <p>Keterangan</p> <p>LAPIS PONDASI BAWAH BETON KURUS (SISI KANAN)</p> <p>STA.1+650</p> |
|  <p>KONTRAKTOR: PT. BUKITIA MAKASSAR<br/>         1+700<br/>         2.42472, 121.53325 (1127m)<br/>         Ketinggian: 952m<br/>         Jalan Tingo Nemo, Mahalona, Kec. Tottoli, Sulawesi Selatan<br/>         932</p> | <p>Keterangan</p> <p>LAPIS PONDASI BAWAH BETON KURUS (SISI KANAN)</p> <p>STA.1+700</p> |

**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**




**Keterangan**

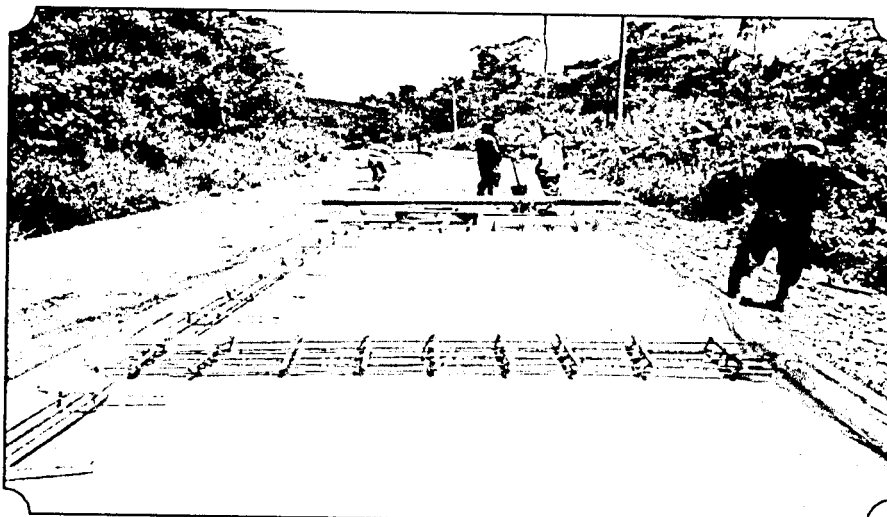**KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON**



**Keterangan**

**KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON**



**Keterangan**

**KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON**

**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**



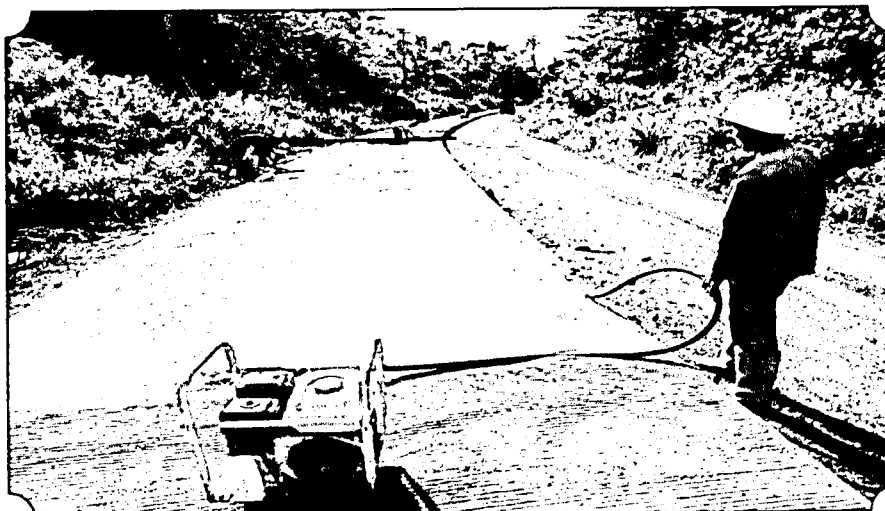
**Keterangan**

**KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON**



**Keterangan**


**KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON**



**Keterangan**

**KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON**

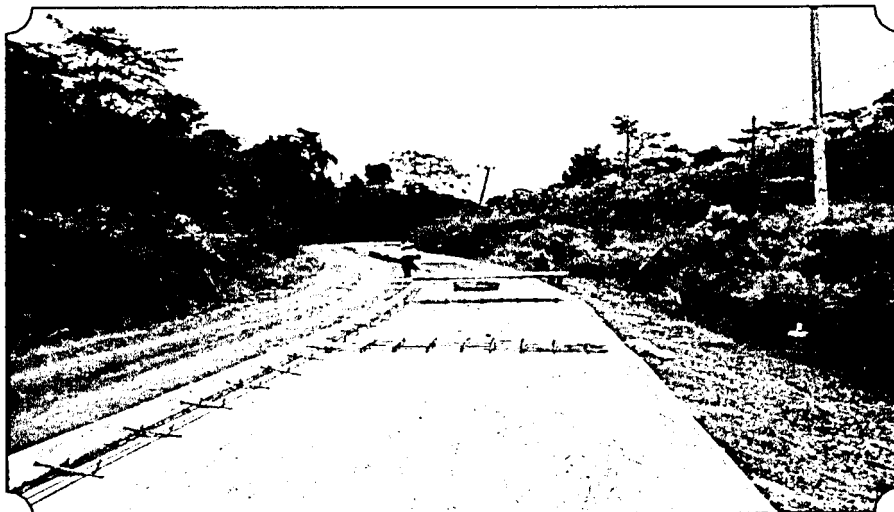**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**




**Keterangan**

**KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON**



**Keterangan**

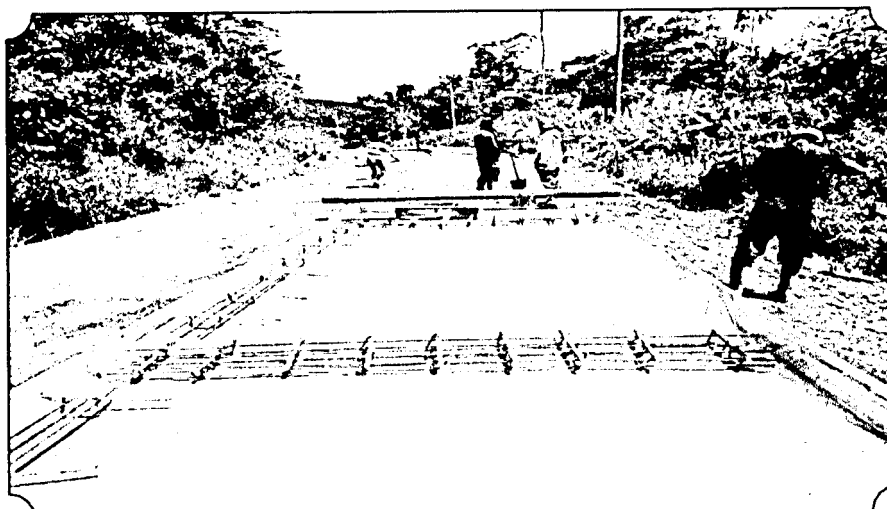**KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON**



**Keterangan**


**KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON**

**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**



**Keterangan**

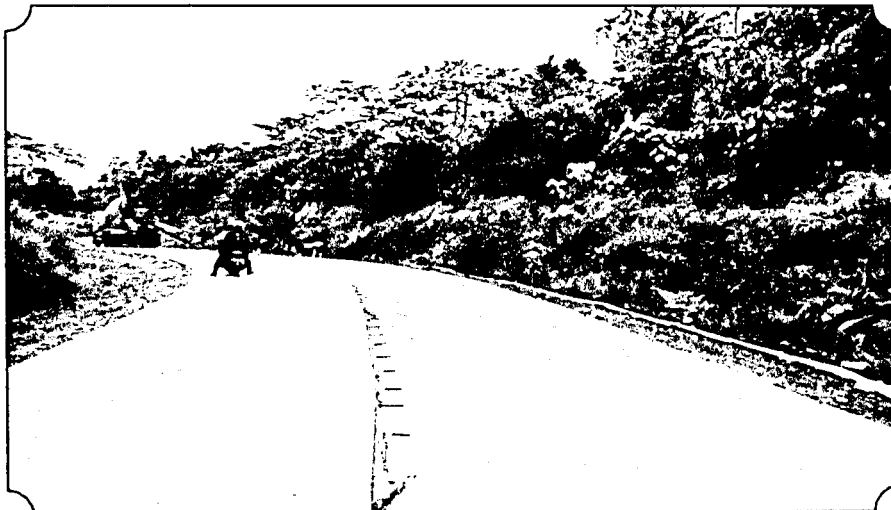KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON



**Keterangan**


KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON



**Keterangan**


KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON

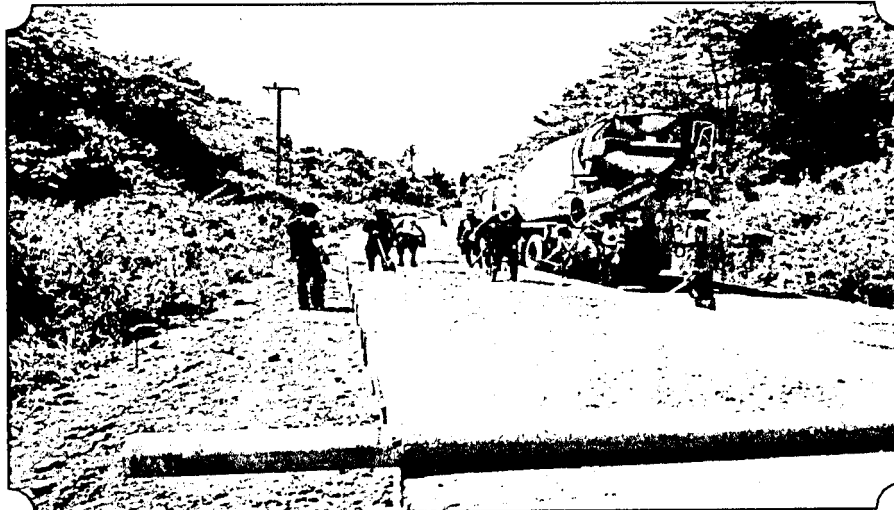**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**




**Keterangan**

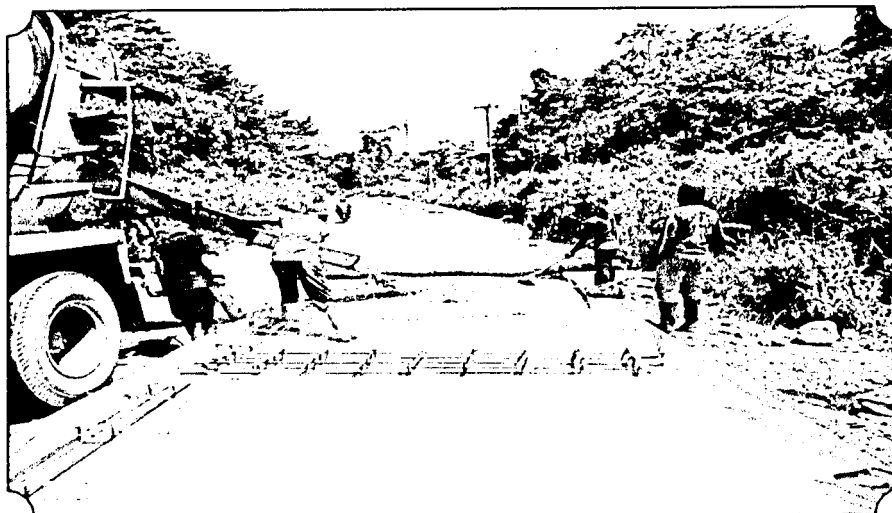**KEGIATAN  
 PENGHAMPARAN  
 BETON**



**Keterangan**

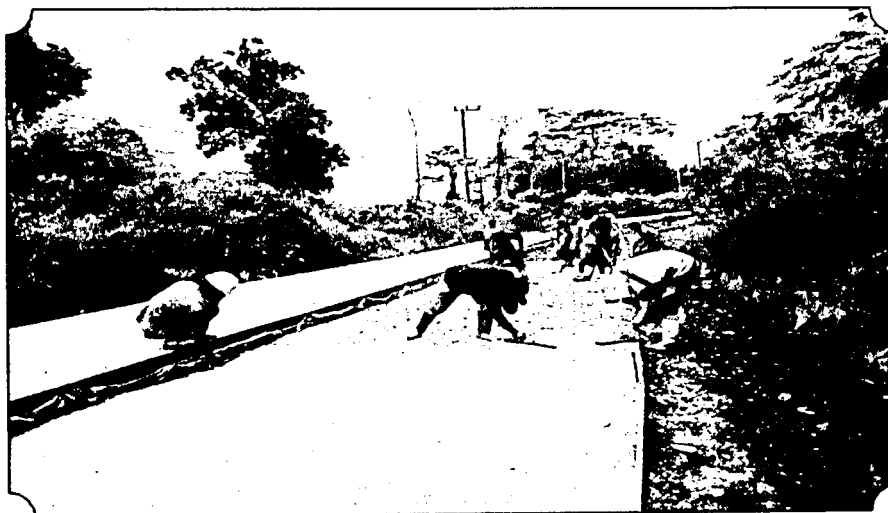**KEGIATAN  
 PENGHAMPARAN  
 BETON**



**Keterangan**

**KEGIATAN  
 PENGHAMPARAN  
 BETON**

**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**



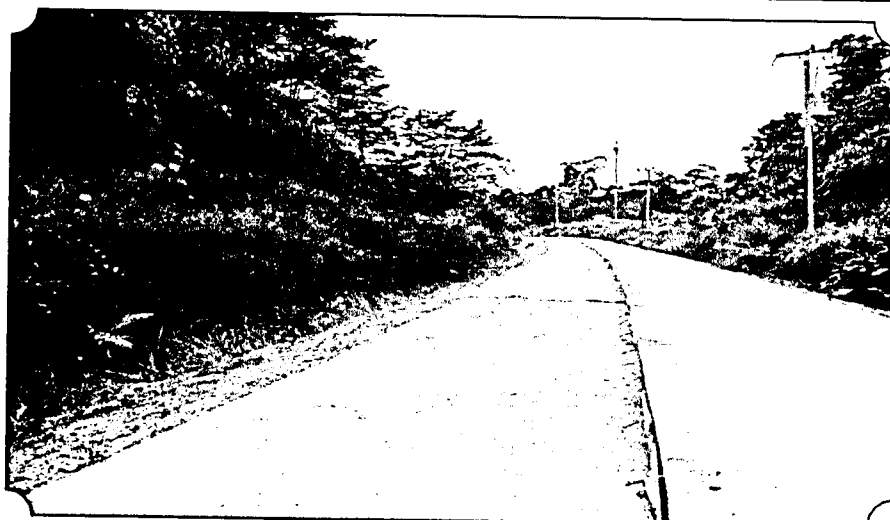
**Keterangan**

KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON



**Keterangan**

KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON



**Keterangan**


KEGIATAN  
PENGHAMPARAN  
BETON

**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**




**Keterangan**

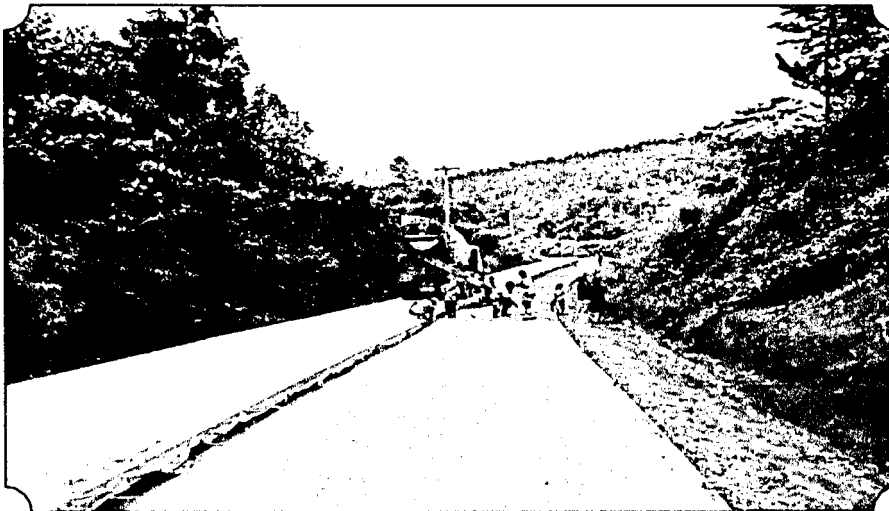**KEGIATAN  
 PENGHAMPARAN  
 BETON**



**Keterangan**


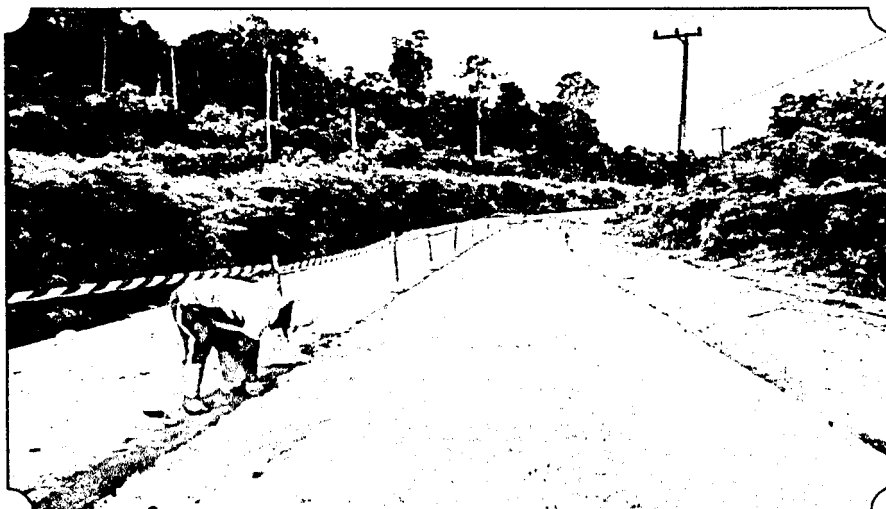
**KEGIATAN  
 PENGHAMPARAN  
 BETON**





**Keterangan**

**KEGIATAN  
 PENGHAMPARAN  
 BETON**

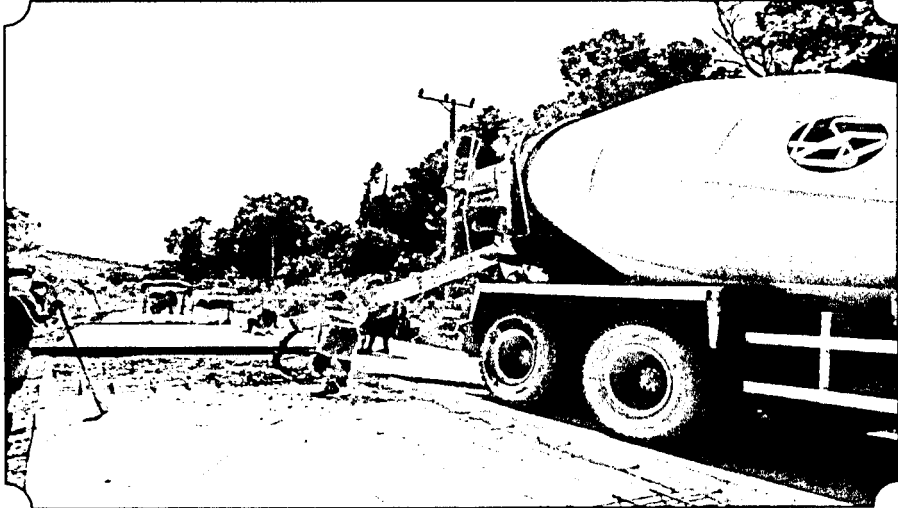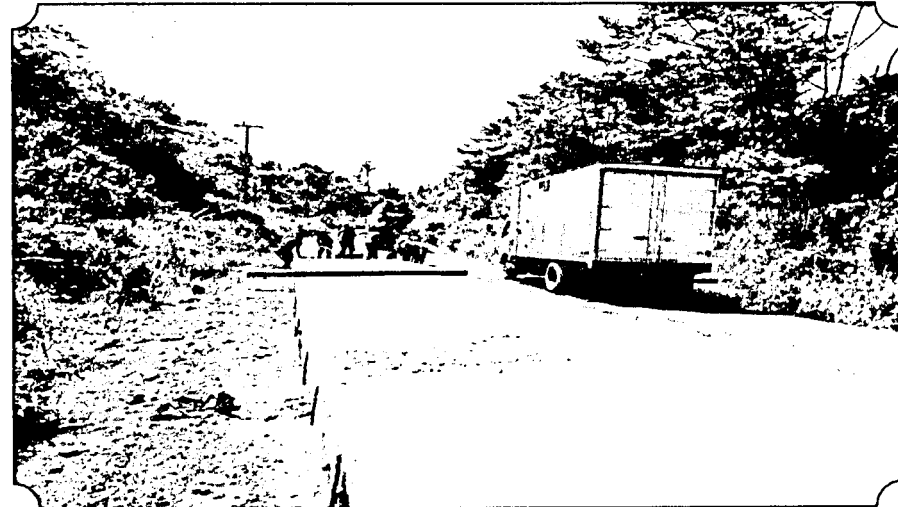**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                      |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Keterangan</b></p> <p>KEGIATAN PENGHAMPARAN BETON</p> |
|   | <p><b>Keterangan</b></p> <p>KEGIATAN PENGHAMPARAN BETON</p> |
|  | <p><b>Keterangan</b></p> <p>KEGIATAN PENGHAMPARAN BETON</p> |

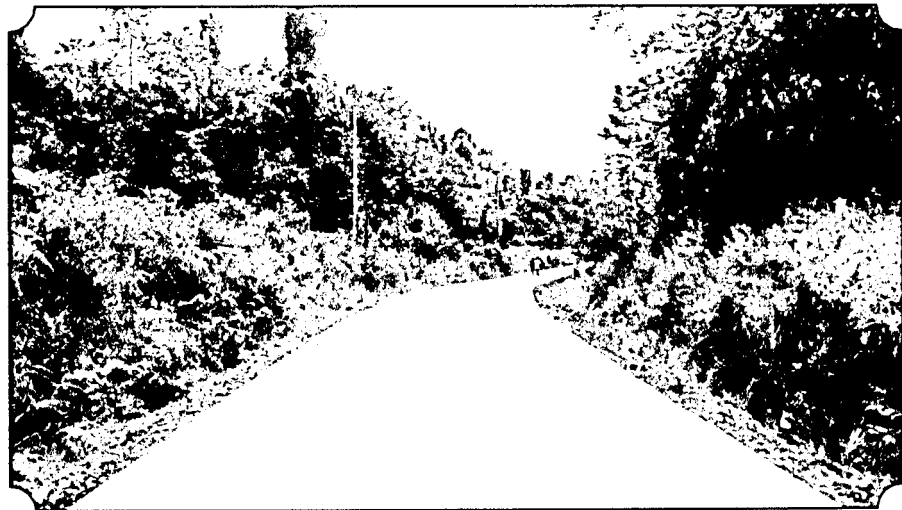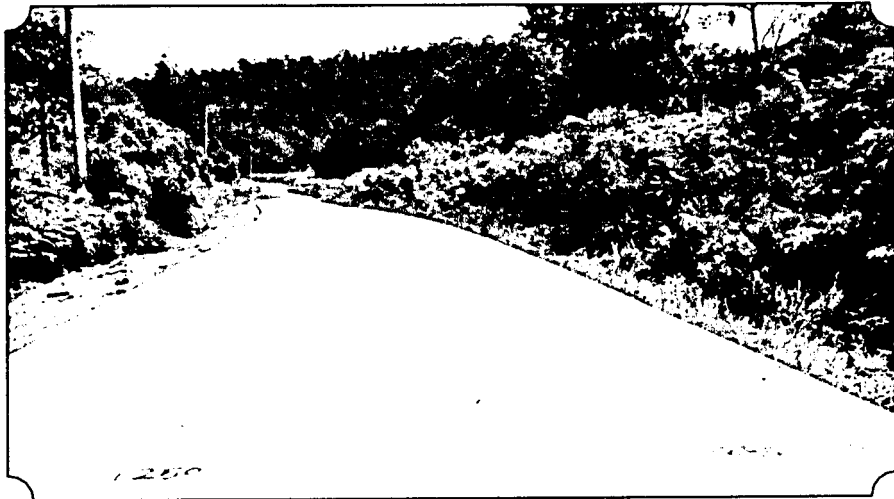**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**



|                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | Keterangan                |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN |
|   | Keterangan                |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN |
|  | Keterangan                |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN |

**STA**  
**0+150**

**STA**  
**0+200**


**STA**  
**0+250**

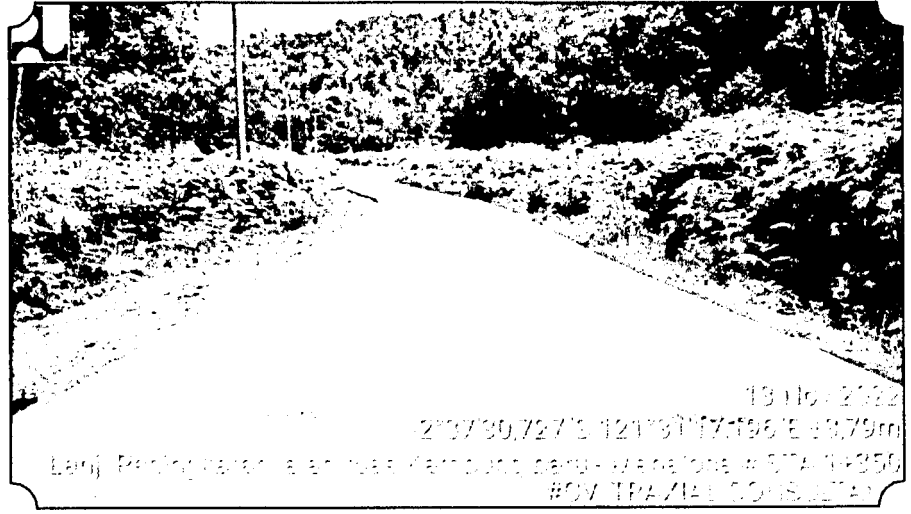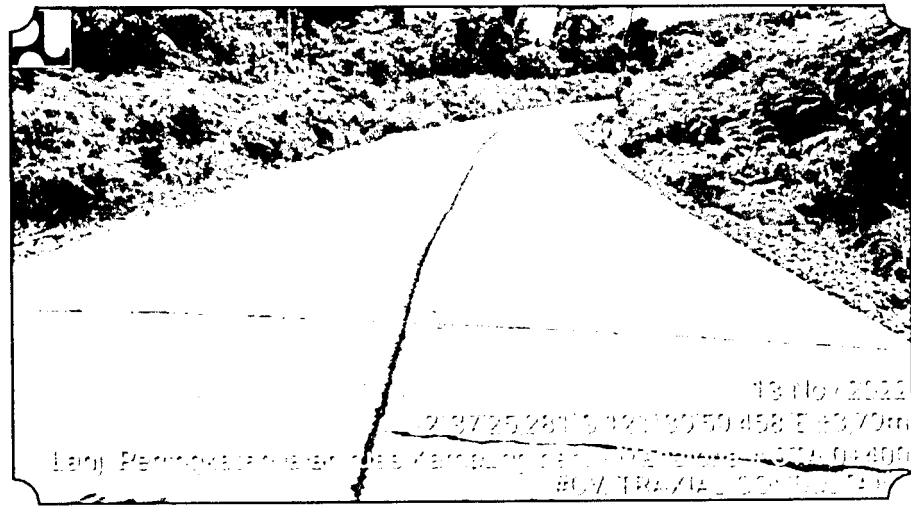**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | Keterangan                 |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                      | <b>STA</b><br><b>0+300</b> |
|   | Keterangan                 |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                      | <b>STA</b><br><b>0+350</b> |
|  | Keterangan                 |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                      | <b>STA</b><br><b>0+400</b> |

# FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN
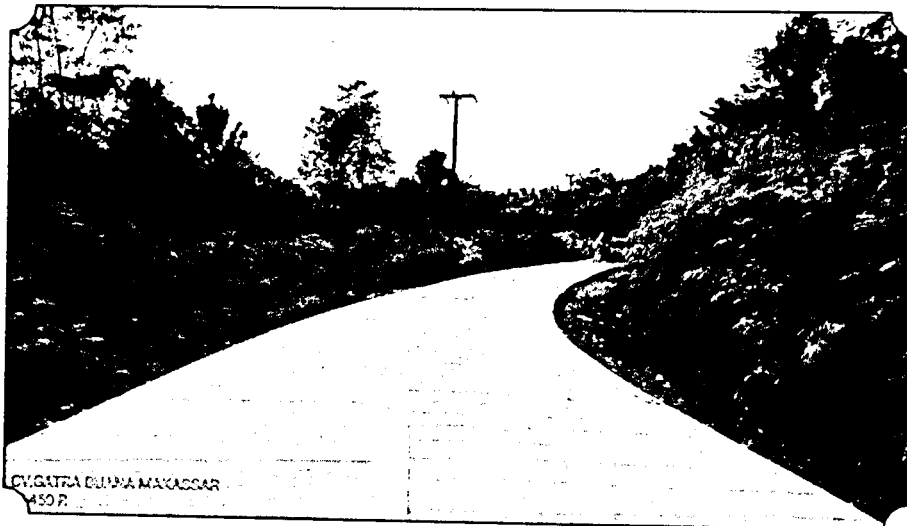
## LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA (RUAS PEKALOA-TOLE)




CV GATRA BUANA MAKASSAR  
450 R

Keterangan

PERKERASAN  
BETON SEMEN

**STA**

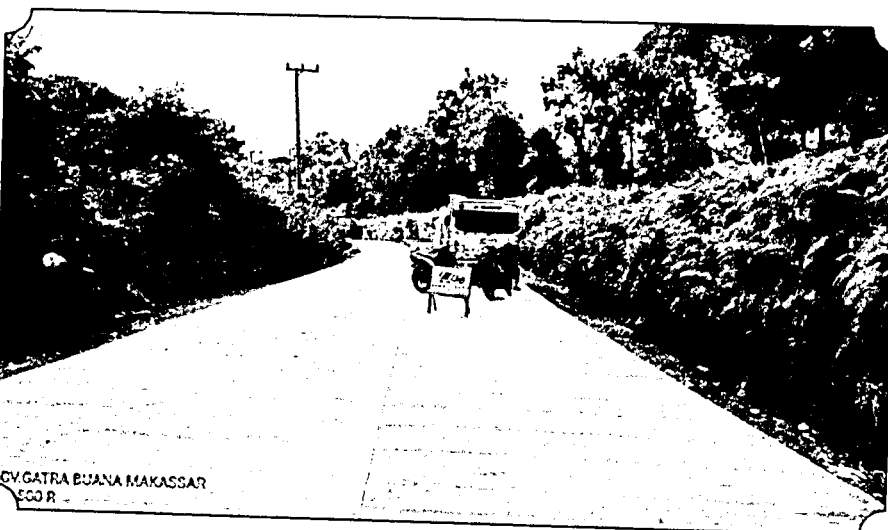**0+450**




CV GATRA BUANA MAKASSAR  
500 R

Keterangan

PERKERASAN  
BETON SEMEN

**STA**

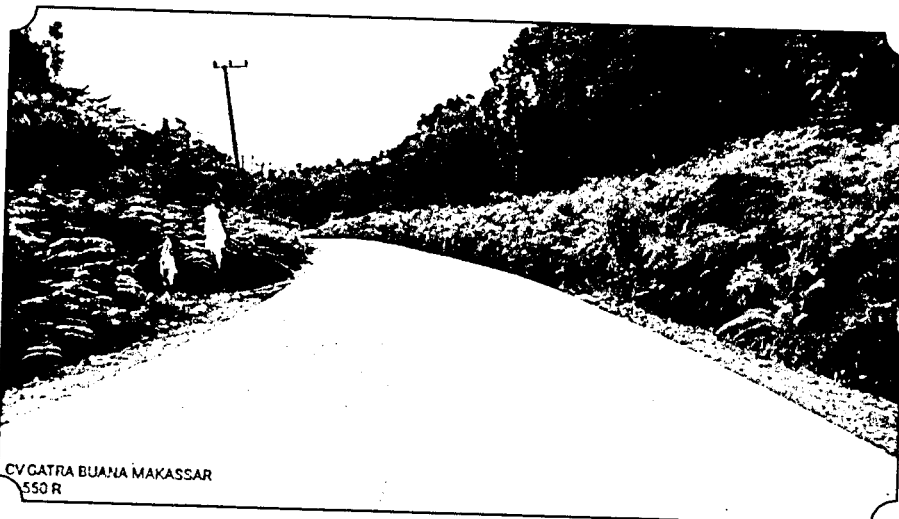**0+500**



CV GATRA BUANA MAKASSAR  
550 R




Keterangan

PERKERASAN  
BETON SEMEN


**STA**

**0+550**

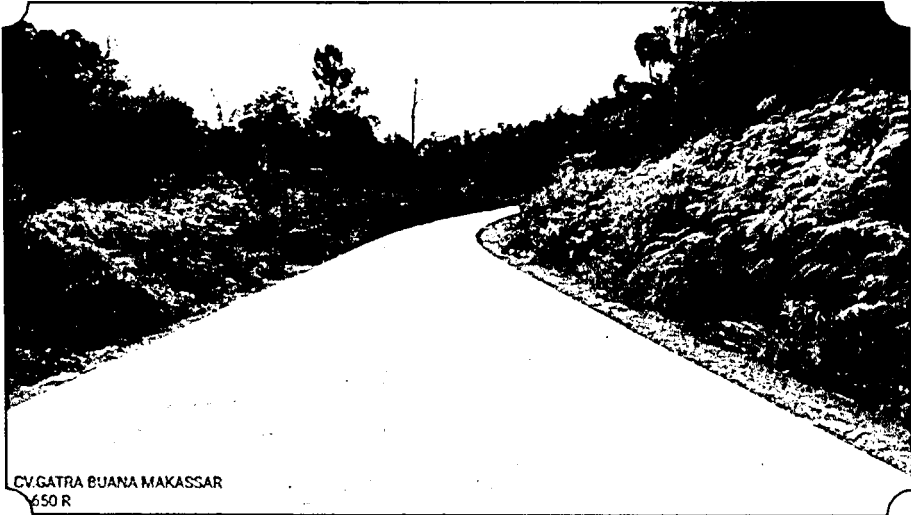
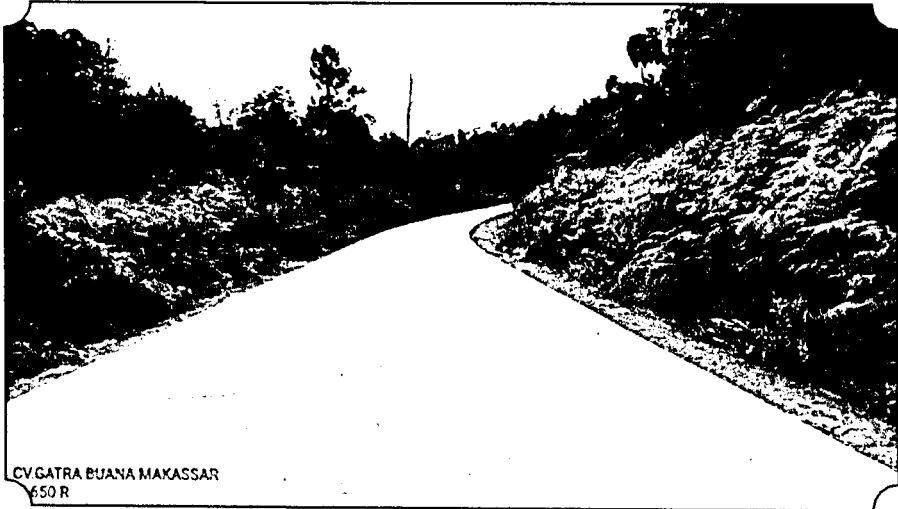
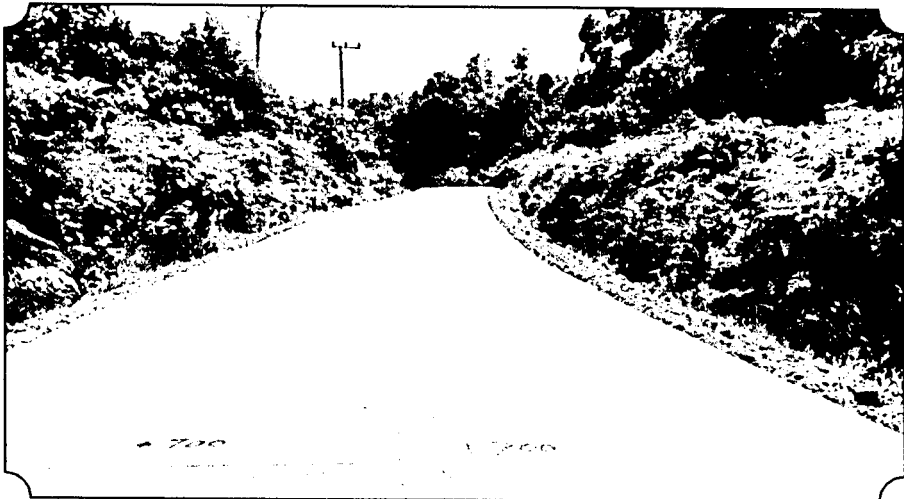
**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  <p>CV.GATRA BUANA MAKASSAR<br/>650 R</p>  | Keterangan                     |
|                                                                                                                              | PERKERASAN<br>BETON SEMEN      |
|                                                                                                                              | <b>STA</b><br><br><b>0+600</b> |
|  <p>CV.GATRA BUANA MAKASSAR<br/>650 R</p> | Keterangan                     |
|                                                                                                                              | PERKERASAN<br>BETON SEMEN      |
|                                                                                                                              | <b>STA</b><br><br><b>0+650</b> |
|                                          | Keterangan                     |
|                                                                                                                              | PERKERASAN<br>BETON SEMEN      |
|                                                                                                                              | <b>STA</b><br><br><b>0+700</b> |

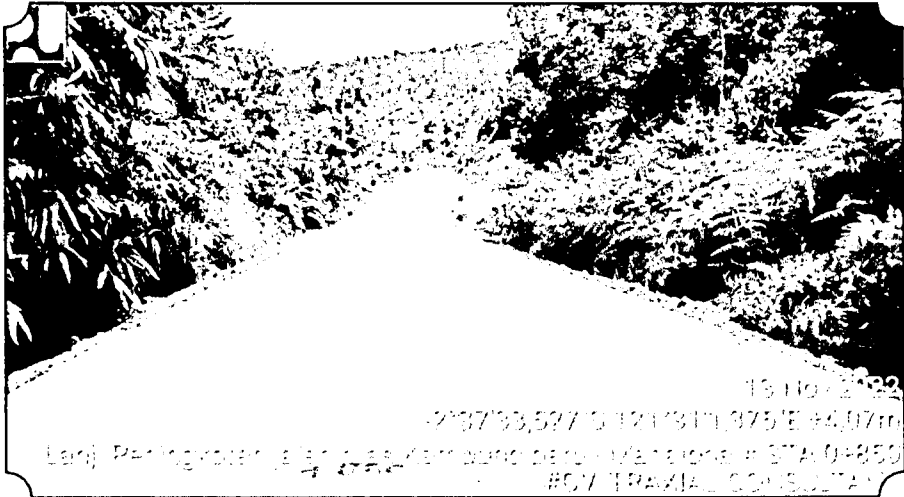
**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | Keterangan                 |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                      | <b>STA</b><br><b>0+750</b> |
|   | Keterangan                 |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                      | <b>STA</b><br><b>0+800</b> |
|  | Keterangan                 |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                      | <b>STA</b><br><b>0+850</b> |

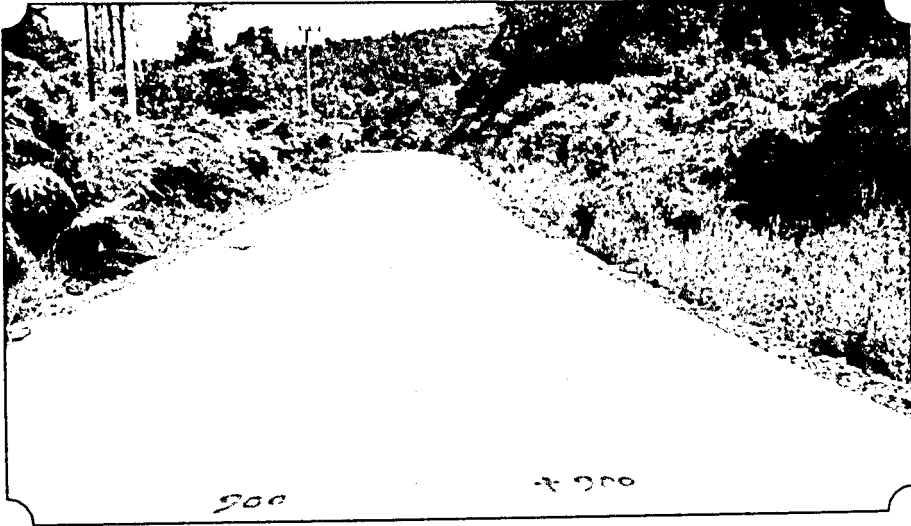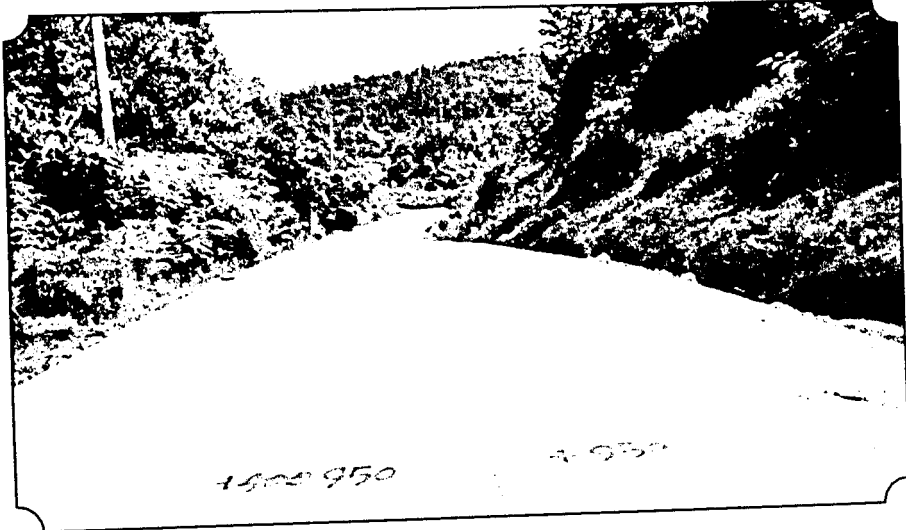
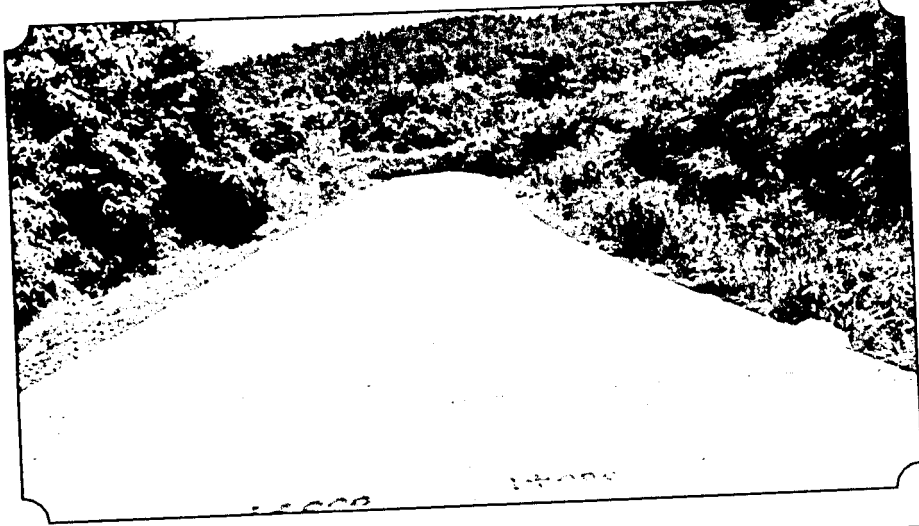
**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | Keterangan                 |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                      | <b>STA</b><br><b>0+900</b> |
|   | Keterangan                 |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                      | <b>STA</b><br><b>0+950</b> |
|  | Keterangan                 |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                      | <b>STA</b><br><b>1+000</b> |

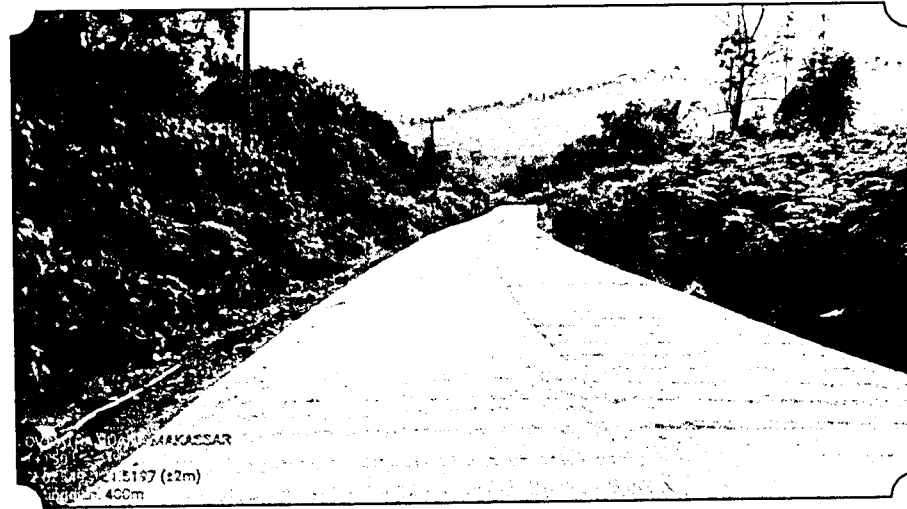
**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | Keterangan                 |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                      | <b>STA</b><br><b>1+050</b> |
|   | Keterangan                 |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                      | <b>STA</b><br><b>1+100</b> |
|  | Keterangan                 |
|                                                                                      | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                      | <b>STA</b><br><b>1+150</b> |

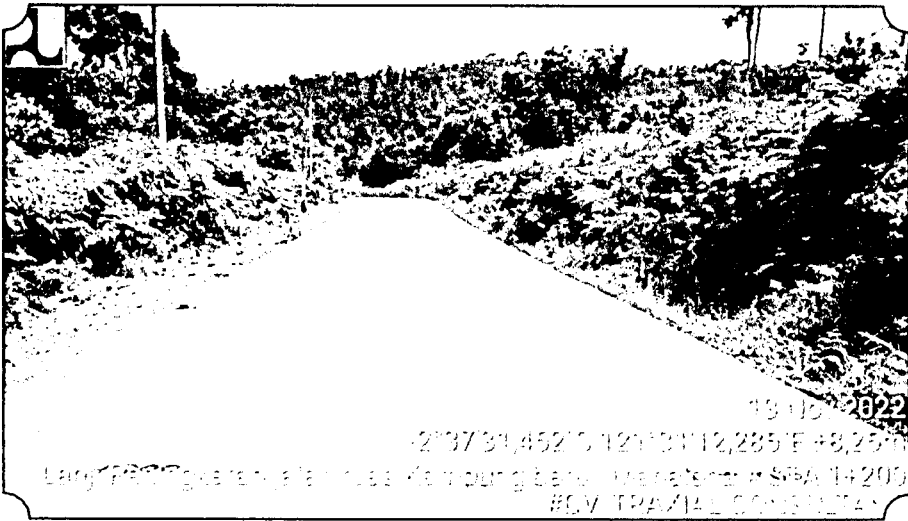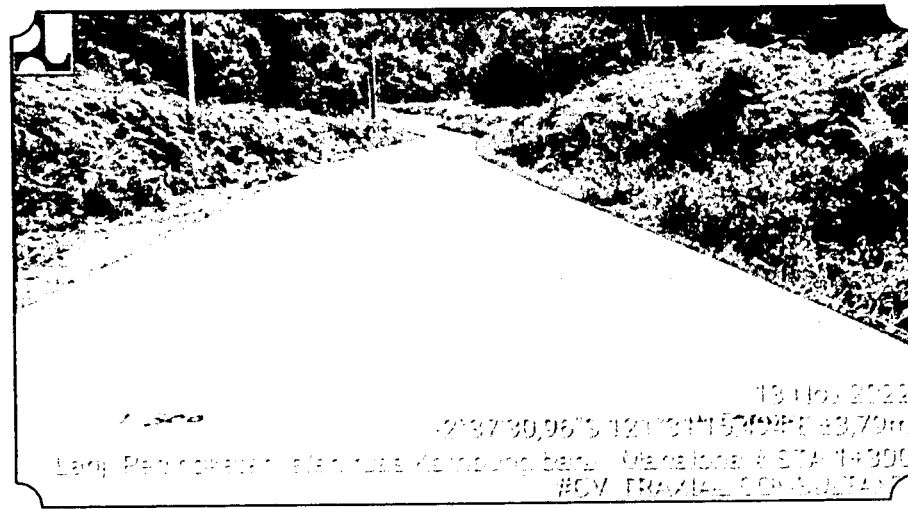**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  <p>13 Nov 2022<br/> 2°37'31,452"S 121°31'12,285"E +8,25m<br/> Lang. Perbaikan jalan ruas Kampung Baru Mahalona &amp; STA 1+200<br/> BOV TRAVEL CONSULTANT</p>  | Keterangan                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STA</b><br><b>1+200</b> |
|  <p>13 Nov 2022<br/> 2°37'31,228"S 121°31'14,302"E +8,79m<br/> Lang. Perbaikan jalan ruas Kampung Baru Mahalona &amp; STA 1+250<br/> BOV TRAVEL CONSULTANT</p> | Keterangan                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STA</b><br><b>1+250</b> |
|  <p>13 Nov 2022<br/> 2°37'30,96"S 121°31'15,694"E +8,79m<br/> Lang. Perbaikan jalan ruas Kampung Baru Mahalona &amp; STA 1+300<br/> BOV TRAVEL CONSULTANT</p> | Keterangan                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | PERKERASAN<br>BETON SEMEN  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STA</b><br><b>1+300</b> |

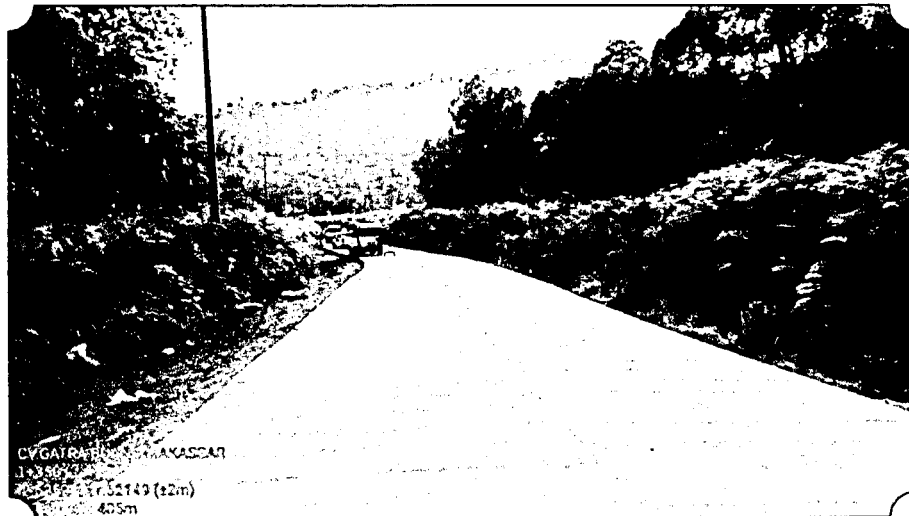**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**




Keterangan

PERKERASAN  
BETON SEMEN

**STA**

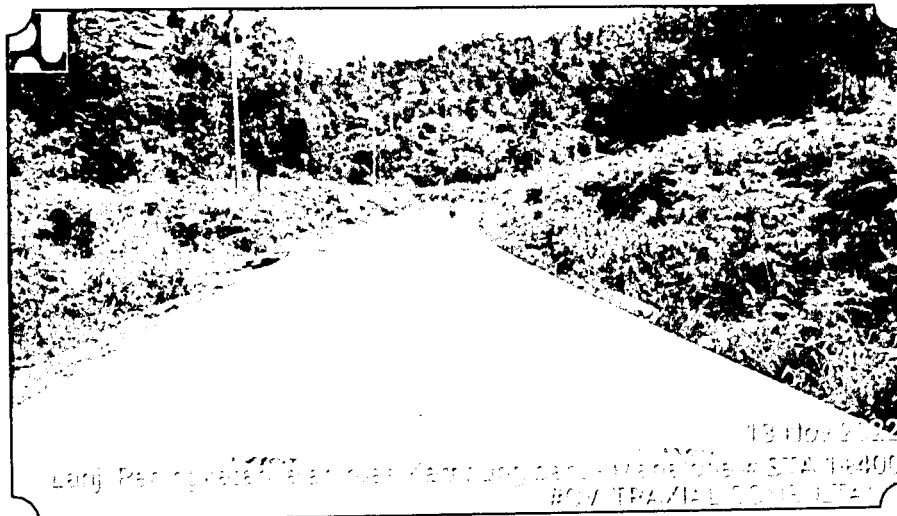**1+350**




Keterangan

PERKERASAN  
BETON SEMEN

**STA**

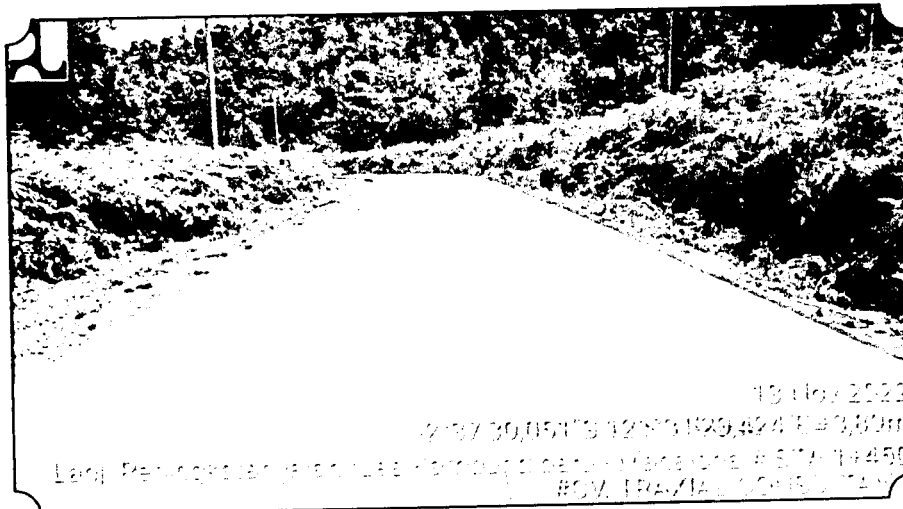**1+400**






Keterangan

PERKERASAN  
BETON SEMEN

**STA**


**1+450**

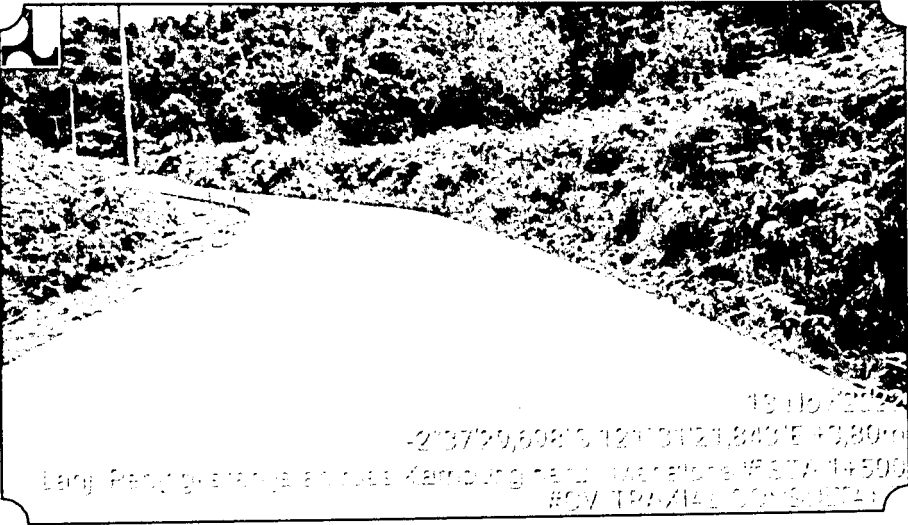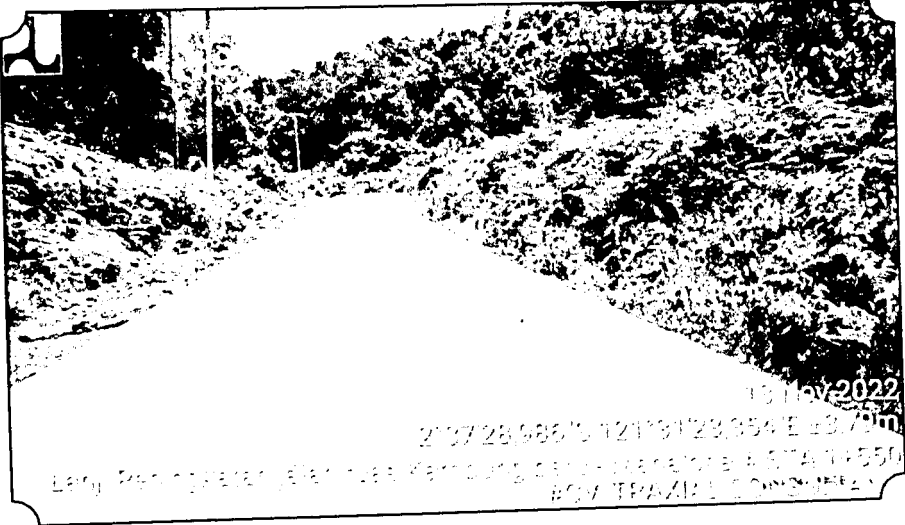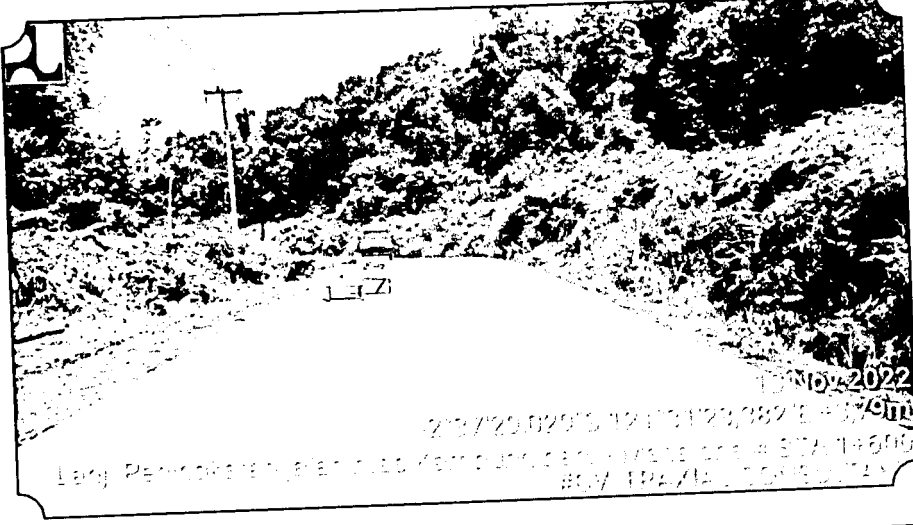**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p align="right">18 Nov 2022<br/> 2°37'20,608"S 121°01'21,840"E 4380m<br/> Lang. Peningkatan ruas jalan Kampung Baru Mahalona #STA 1+500<br/> BOV TRAXIAL CONSULTING</p>   | <p align="center">Keterangan</p> <p align="center">PERKERASAN<br/>BETON SEMEN</p> <p align="center"><b>STA</b></p> <p align="center"><b>1+500</b></p> |
|  <p align="right">18 Nov 2022<br/> 2°37'28,686"S 121°01'28,854"E 4379m<br/> Lang. Peningkatan ruas jalan Kampung Baru Mahalona #STA 1+550<br/> BOV TRAXIAL CONSULTING</p>  | <p align="center">Keterangan</p> <p align="center">PERKERASAN<br/>BETON SEMEN</p> <p align="center"><b>STA</b></p> <p align="center"><b>1+550</b></p> |
|  <p align="right">18 Nov 2022<br/> 2°37'20,725"S 121°01'23,882"E 4379m<br/> Lang. Peningkatan ruas jalan Kampung Baru Mahalona #STA 1+600<br/> BOV TRAXIAL CONSULTING</p> | <p align="center">Keterangan</p> <p align="center">PERKERASAN<br/>BETON SEMEN</p> <p align="center"><b>STA</b></p> <p align="center"><b>1+600</b></p> |

# FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN
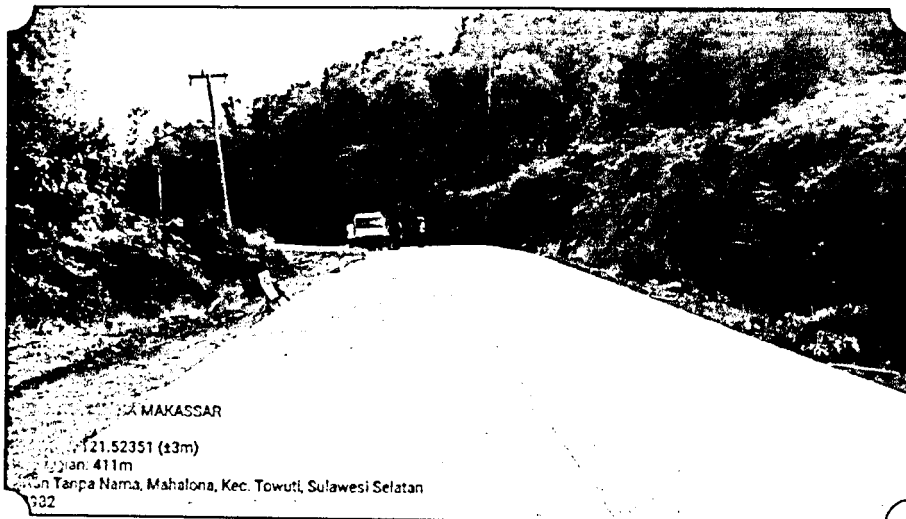
## LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA (RUAS PEKALOA-TOLE)




**Keterangan**

PERKERASAN  
BETON SEMEN

**STA**

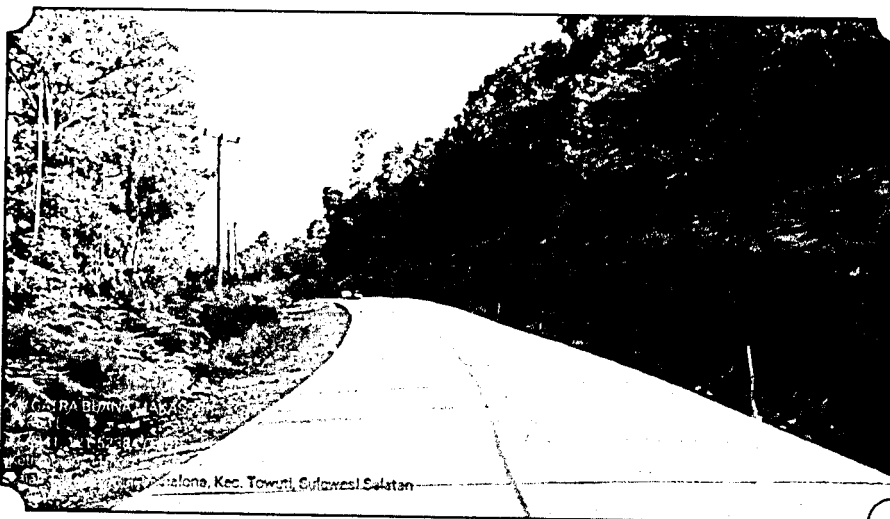**1+600**



**Keterangan**

PERKERASAN  
BETON SEMEN

**STA**

**1+650**






**Keterangan**

PERKERASAN  
BETON SEMEN

**STA**

**1+700**

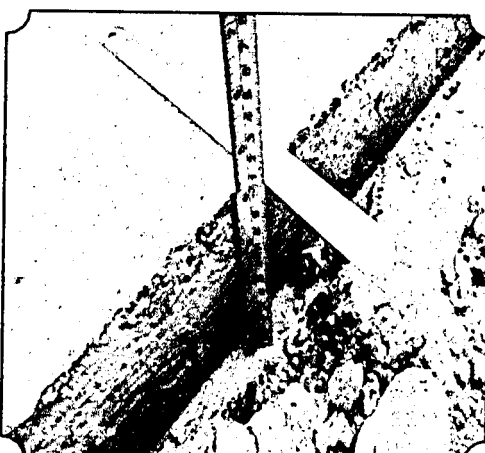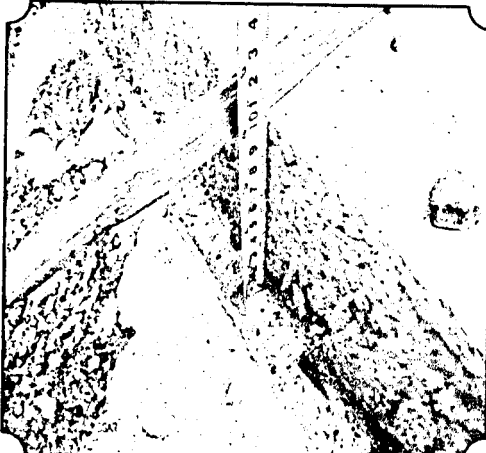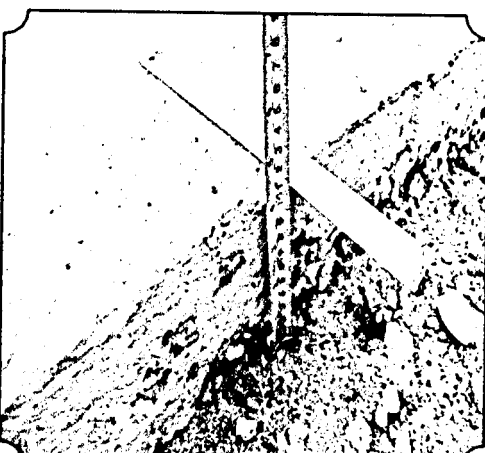
**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <div>Keterangan</div> <div>LAPIS PONDASI<br/>BAWAH BETON<br/>KURUS</div> |
| <div>KIRI</div> <div>11,00 cm</div>                                                 | <div>KANAN</div> <div>10,50 cm</div>                                                 | STA. 0+000                                                               |
|   |   | <div>Keterangan</div> <div>LAPIS PONDASI<br/>BAWAH BETON<br/>KURUS</div> |
| <div>KIRI</div> <div>10,50 cm</div>                                                 | <div>KANAN</div> <div>10,00 cm</div>                                                 | STA. 0+050                                                               |
|  |  | <div>Keterangan</div> <div>LAPIS PONDASI<br/>BAWAH BETON<br/>KURUS</div> |
| <div>KIRI</div> <div>10,00 cm</div>                                                 | <div>KANAN</div> <div>10,00 cm</div>                                                 | STA. 0+100                                                               |

**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**



|       |    |
|-------|----|
| KIRI  |    |
| 10,00 | cm |

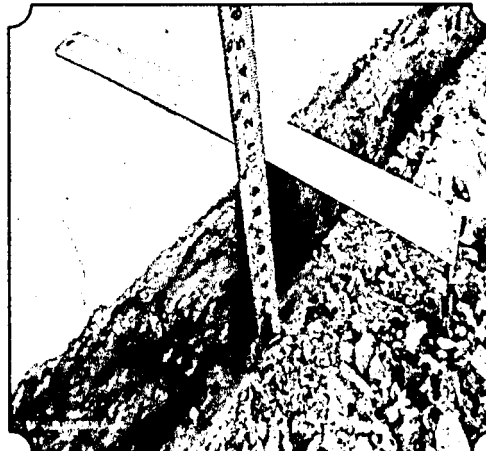


|       |    |
|-------|----|
| KANAN |    |
| 10,00 | cm |


**Keterangan**

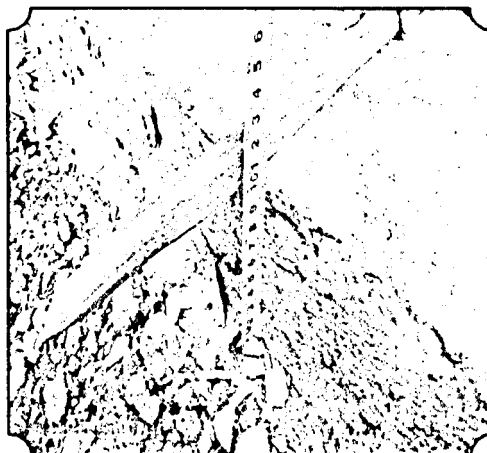LAPIS PONDASI  
BAWAH BETON  
KURUS

**STA. 0+150**



|       |    |
|-------|----|
| KIRI  |    |
| 10,00 | cm |

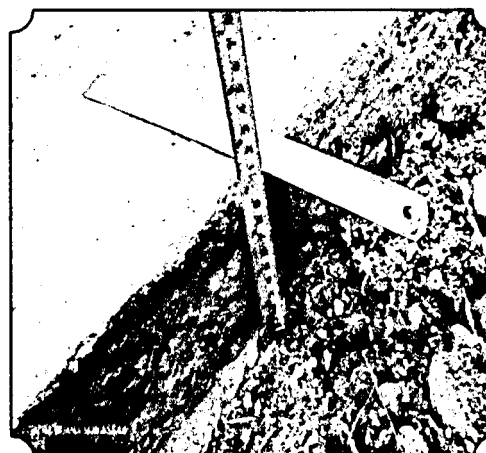


|       |    |
|-------|----|
| KANAN |    |
| 10,00 | cm |

**Keterangan**

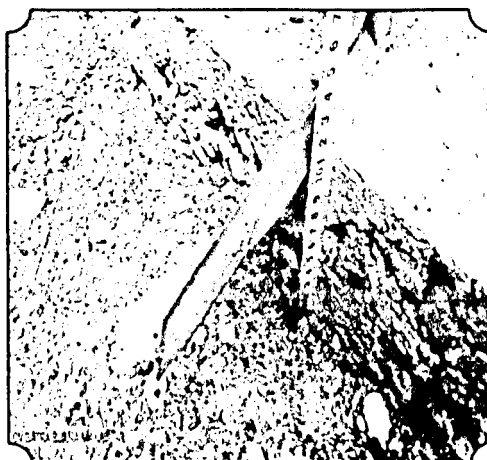LAPIS PONDASI  
BAWAH BETON  
KURUS

**STA. 0+200**



|       |    |
|-------|----|
| KIRI  |    |
| 10,50 | cm |




|       |    |
|-------|----|
| KANAN |    |
| 10,00 | cm |

**Keterangan**


LAPIS PONDASI  
BAWAH BETON  
KURUS

**STA. 0+250**

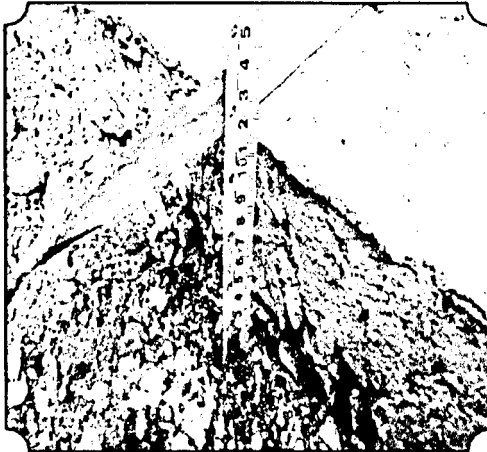**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**



|          |
|----------|
| KIRI     |
| 11,50 cm |

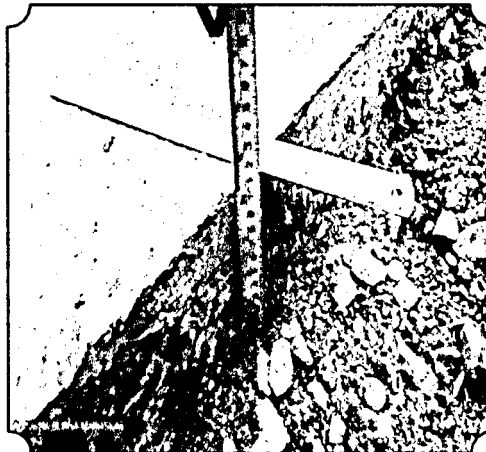

|          |
|----------|
| KANAN    |
| 10,00 cm |


**Keterangan**

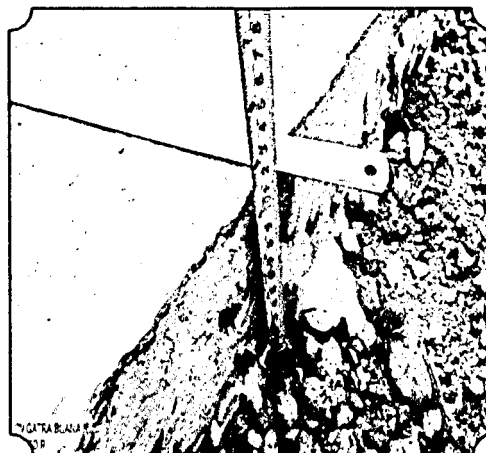LAPIS PONDASI  
BAWAH BETON  
KURUS

**STA. 0+300**



|          |
|----------|
| KIRI     |
| 11,50 cm |



|          |
|----------|
| KANAN    |
| 11,00 cm |


**Keterangan**

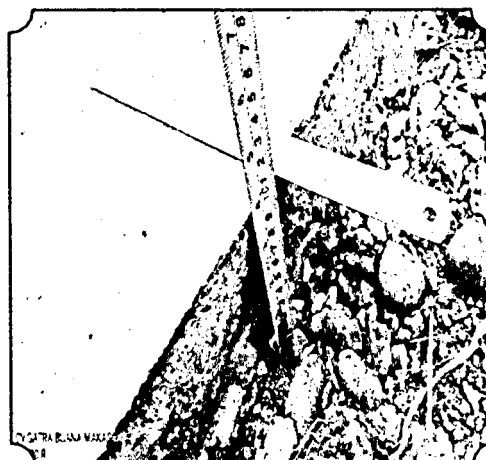LAPIS PONDASI  
BAWAH BETON  
KURUS

**STA. 0+350**



|          |
|----------|
| KIRI     |
| 11,00 cm |



|          |
|----------|
| KANAN    |
| 10,50 cm |

**Keterangan**


LAPIS PONDASI  
BAWAH BETON  
KURUS

**STA. 0+400**

**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**


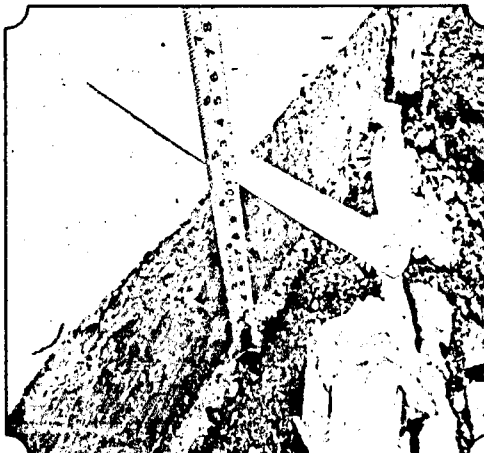
|       |    |
|-------|----|
| KIRI  |    |
| 11,00 | cm |



|       |    |
|-------|----|
| KANAN |    |
| 10,00 | cm |

**Keterangan**

LAPIS PONDASI  
BAWAH BETON  
KURUS

**STA. 0+450**



|       |    |
|-------|----|
| KIRI  |    |
| 10,00 | cm |



|       |    |
|-------|----|
| KANAN |    |
| 10,50 | cm |

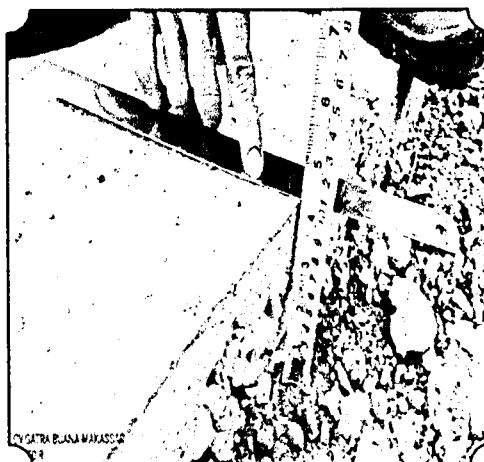
**Keterangan**

LAPIS PONDASI  
BAWAH BETON  
KURUS

**STA. 0+500**



|       |    |
|-------|----|
| KIRI  |    |
| 11,00 | cm |






|       |    |
|-------|----|
| KANAN |    |
| 10,00 | cm |

**Keterangan**





LAPIS PONDASI  
BAWAH BETON  
KURUS

**STA. 0+550**

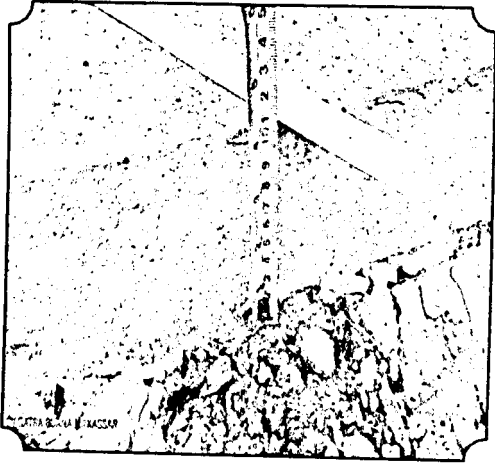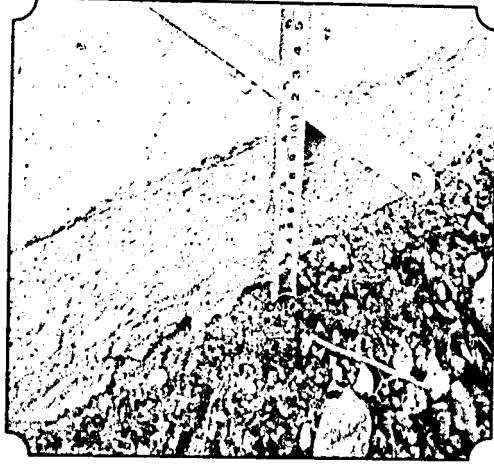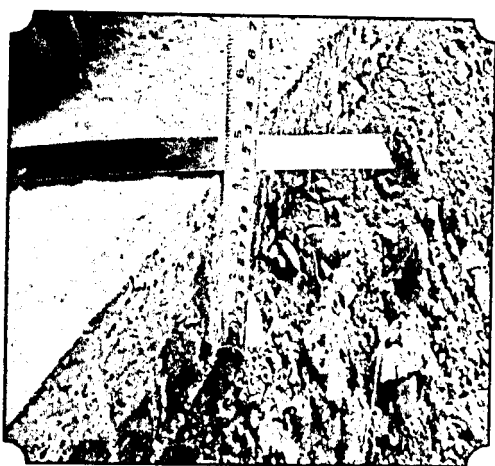**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--|
|    |    | <table><tr><td>Keterangan</td></tr><tr><td>LAPIS PONDASI BAWAH BETON KURUS</td></tr><tr><td>STA. 1+200</td></tr></table> | Keterangan                                                       | LAPIS PONDASI BAWAH BETON KURUS | STA. 1+200 |  |
| Keterangan                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| LAPIS PONDASI BAWAH BETON KURUS                                                     |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| STA. 1+200                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| <table><tr><td>KIRI</td></tr><tr><td>10,50 cm</td></tr></table>                     | KIRI                                                                                 | 10,50 cm                                                                                                                 | <table><tr><td>KANAN</td></tr><tr><td>10,00 cm</td></tr></table> | KANAN                           | 10,00 cm   |  |
| KIRI                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| 10,50 cm                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| KANAN                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| 10,00 cm                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
|   |   | <table><tr><td>Keterangan</td></tr><tr><td>LAPIS PONDASI BAWAH BETON KURUS</td></tr><tr><td>STA. 1+250</td></tr></table> | Keterangan                                                       | LAPIS PONDASI BAWAH BETON KURUS | STA. 1+250 |  |
| Keterangan                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| LAPIS PONDASI BAWAH BETON KURUS                                                     |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| STA. 1+250                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| <table><tr><td>KIRI</td></tr><tr><td>10,00 cm</td></tr></table>                     | KIRI                                                                                 | 10,00 cm                                                                                                                 | <table><tr><td>KANAN</td></tr><tr><td>10,00 cm</td></tr></table> | KANAN                           | 10,00 cm   |  |
| KIRI                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| 10,00 cm                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| KANAN                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| 10,00 cm                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
|  |  | <table><tr><td>Keterangan</td></tr><tr><td>LAPIS PONDASI BAWAH BETON KURUS</td></tr><tr><td>STA. 1+300</td></tr></table> | Keterangan                                                       | LAPIS PONDASI BAWAH BETON KURUS | STA. 1+300 |  |
| Keterangan                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| LAPIS PONDASI BAWAH BETON KURUS                                                     |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| STA. 1+300                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| <table><tr><td>KIRI</td></tr><tr><td>11,00 cm</td></tr></table>                     | KIRI                                                                                 | 11,00 cm                                                                                                                 | <table><tr><td>KANAN</td></tr><tr><td>10,00 cm</td></tr></table> | KANAN                           | 10,00 cm   |  |
| KIRI                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| 11,00 cm                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| KANAN                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |
| 10,00 cm                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                 |            |  |

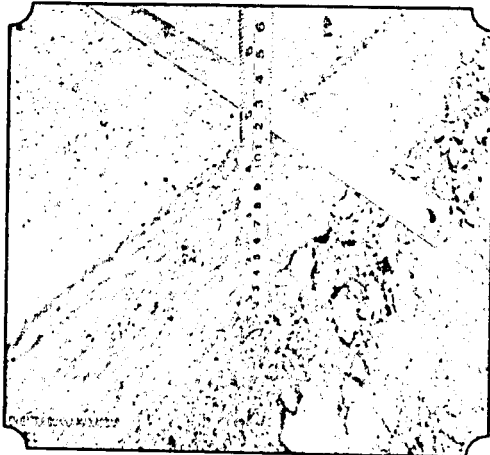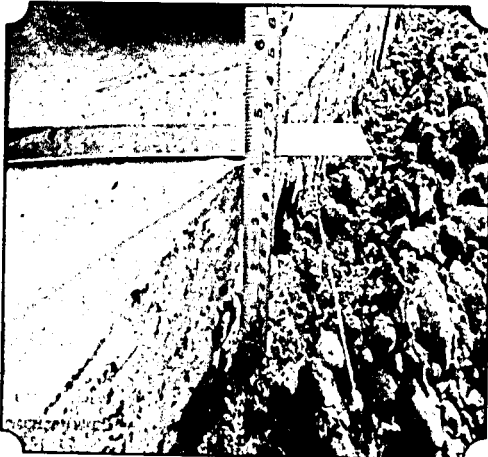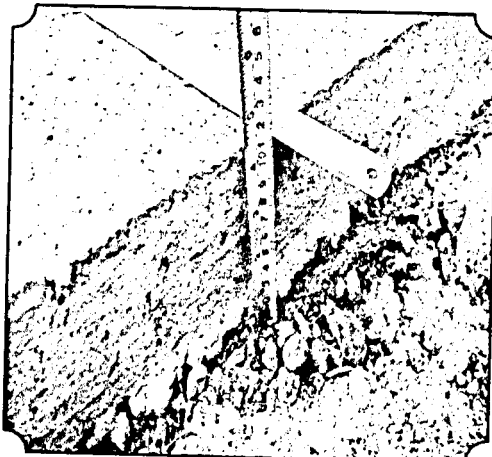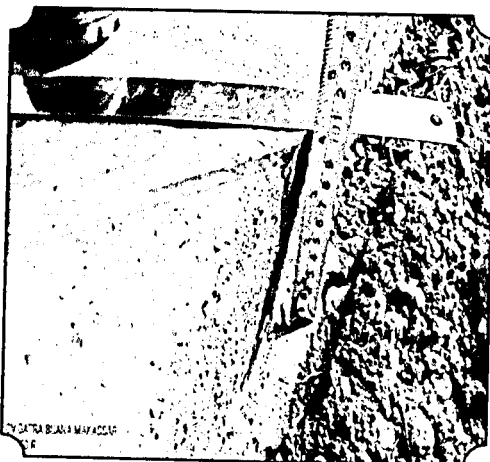**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**

|                                                                                      |  |                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |  | <b>Keterangan</b><br><br>LAPIS PONDASI<br>BAWAH BETON<br>KURUS | <b>STA. 1+500</b> |
| <div>KIRI</div> <div>10,00 cm</div>                                                  |  |                                                                |                   |
|    |  | <b>Keterangan</b><br><br>LAPIS PONDASI<br>BAWAH BETON<br>KURUS | <b>STA. 1+550</b> |
| <div>KANAN</div> <div>10,50 cm</div>                                                 |  |                                                                |                   |
|    |  | <b>Keterangan</b><br><br>LAPIS PONDASI<br>BAWAH BETON<br>KURUS | <b>STA. 1+600</b> |
| <div>KIRI</div> <div>11,00 cm</div>                                                  |  |                                                                |                   |
|   |  | <b>Keterangan</b><br><br>LAPIS PONDASI<br>BAWAH BETON<br>KURUS | <b>STA. 1+600</b> |
| <div>KANAN</div> <div>10,00 cm</div>                                                 |  |                                                                |                   |
|   |  | <b>Keterangan</b><br><br>LAPIS PONDASI<br>BAWAH BETON<br>KURUS | <b>STA. 1+600</b> |
| <div>KIRI</div> <div>10,50 cm</div>                                                  |  |                                                                |                   |
|  |  | <b>Keterangan</b><br><br>LAPIS PONDASI<br>BAWAH BETON<br>KURUS | <b>STA. 1+600</b> |
| <div>KANAN</div> <div>10,00 cm</div>                                                 |  |                                                                |                   |

**FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU-MAHALONA**  
**(RUAS PEKALOA-TOLE)**



|       |    |
|-------|----|
| KIRI  |    |
| 11,00 | cm |




|       |    |
|-------|----|
| KANAN |    |
| 10,00 | cm |


**Keterangan**

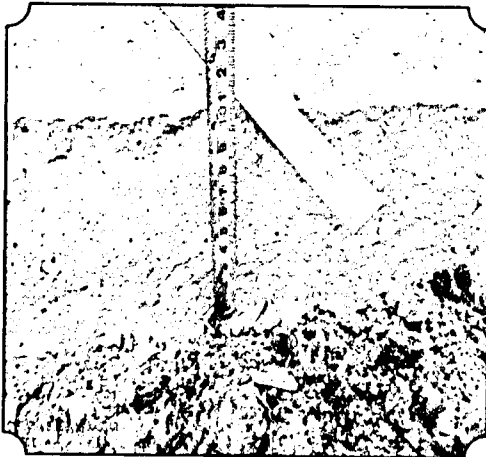LAPIS PONDASI  
BAWAH BETON  
KURUS

**STA. 1+600**



|       |    |
|-------|----|
| KIRI  |    |
| 10,00 | cm |

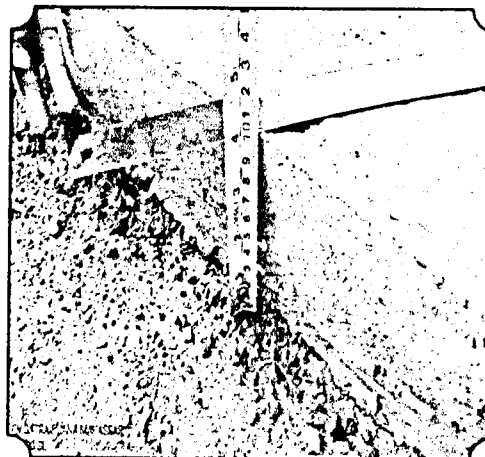


|       |    |
|-------|----|
| KANAN |    |
| 10,00 | cm |

**Keterangan**

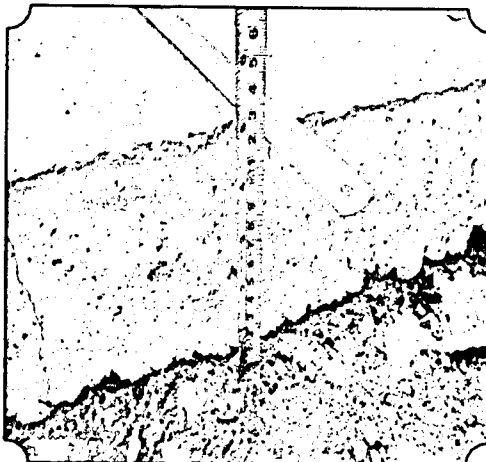LAPIS PONDASI  
BAWAH BETON  
KURUS

**STA. 1+650**



|       |    |
|-------|----|
| KIRI  |    |
| 10,50 | cm |



|       |    |
|-------|----|
| KANAN |    |
| 10,50 | cm |

**Keterangan**

LAPIS PONDASI  
BAWAH BETON  
KURUS

**STA. 1+700**
