PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

FINAL QUANTITY

PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK

NO. KONTRAK	:	602.1/02/KONT-BM.9/PUPR/V/2023
TANGGAL KONTRAK	:	22 Mei 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 17.051.997.383,00

TAHUN ANGGARAN
2023

KONSULTAN SUPERVISI

CV. ALTITUDE 79 NUSANTARA

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. STAR MITRA SULAWESI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS	:	**PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR	:	PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN	:	**Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air**
SATUAN	:	m3
NO. DIV.	:	2.1.(1)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+950	s.d	2+200	Kanan	1,250.00	428.40	428.40	
2	2+200	s.d	3+400	Kanan	1,200.00	449.85	449.85	
3	3+400	s.d	4+200	Kanan	800.00	370.75	370.75	
JUMLAH					**3,250.00**	**1,249.00**	**1,249.00**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	2,807.57	m3
VOLUME USULAN CCO	.....	1,249.00	m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m3
MC UNTUK BULAN INI	.....	1,249.00	m3
MC SD BULAN INI	.....	1,249.00	m3
SISA VOLUME	.....	-	m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
Nomor Divisi : 2.1.(1)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			DESAIN			CCO				DESAIN	CCO	
			La	Lb	t	La	Lb	t				
1	0+950	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
2	1+000	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
3	1+050	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
4	1+100	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
5	1+150	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
6	1+200	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
7	1+250	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
8	1+300	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
9	1+350	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
10	1+400	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
11	1+450	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
12	1+500	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
13	1+550	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
14	1+600	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
15	1+650	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
16	1+700	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
17	1+750	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
18	1+800	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
19	1+850	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
20	1+900	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	30,00	6,75	6,75	
21	1+930	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50				
1	1+930	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
2	1+980	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
3	2+030	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
4	2+080	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
5	2+130	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
6	2+180	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	20,00	15,40	15,40	
7	2+200	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70				
								Jumlah	**1.250,0**	**428,4**	**428,4**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
BID. BINA MARGA	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Staf Teknis	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2022
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
Nomor Divisi : 2.1.(1)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			DESAIN			CCO				DESAIN	CCO	
			La	Lb	t	La	Lb	t				
1	2+200	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
2	2+250	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
3	2+300	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	40,00	30,80	30,80	
4	2+340	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70				
5												
6	2+340	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	60,00	13,50	13,50	
7	2+400	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
8	2+450	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
9	2+500	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
10	2+550	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
11	2+600	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
12	2+650	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
13	2+700	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
14	2+750	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
15	2+800	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
16	2+850	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
17	2+900	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
18	2+950	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
19	3+000	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
20	3+050	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
21	3+100	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
22	3+150	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	60,00	13,50	13,50	
23	3+210	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50				
1	3+210	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	40,00	30,80	30,80	
2	3+250	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
3	3+300	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
4	3+350	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
5	3+400	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70				
								Jumlah	**1.200,0**	**449,9**	**449,9**	m3

Pihak Dinas PUPR BID. BINA MARGA	Pihak Konsultan CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	Pihak Penyedia Jasa PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika Staf Teknis	**Asma Hendra, ST** Inspector	**Sudarmono, ST** Manager Teknik

PT.STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2022
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
Nomor Divisi : 2.1.(1)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			DESAIN			CCO				DESAIN	CCO	
			La	Lb	t	La	Lb	t				
1	3+400	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
2	3+450	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
3	3+500	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
4	3+550	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
5	3+600	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
6	3+650	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
7	3+700	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
8	3+750	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
9	3+800	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50	50,00	11,25	11,25	
10	3+850	Kanan	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,50				
1	3+850	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
2	3+900	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
3	3+950	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
4	4+000	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
5	4+050	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
6	4+100	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
7	4+150	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70	50,00	38,50	38,50	
8	4+200	Kanan	1,20	1,00	0,70	1,20	1,00	0,70				
								Jumlah	**800,0**	**370,8**	**370,8**	m3

Pihak Dinas PUPR BID. BINA MARGA	Pihak Konsultan CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	Pihak Penyedia Jasa PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika Staf Teknis	**Asma Hendra, ST** Inspector	**Sudarmono, ST** Manager Teknik

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Pasangan Batu dengan Mortar**
SATUAN : m3
NO. DIV. : 2.2.(1)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+950	s.d	1+100	KANAN	150.0	85.38	83.61	
2	1+100	s.d	1+250	KANAN	150.0	85.38	96.10	
3	1+250	s.d	1+400	KANAN	150.0	85.38	91.54	
4	1+400	s.d	1+550	KANAN	150.0	85.38	94.55	
5	1+550	s.d	1+700	KANAN	150.0	85.38	95.49	
6	1+700	s.d	1+850	KANAN	150.0	85.38	95.18	
7	1+850	s.d	2+450	KANAN	600.0	87.69	85.93	
8	2+450	s.d	2+600	KANAN	150.0	85.38	85.55	
9	2+600	s.d	2+740	KANAN	140.0	80.75	79.74	
10	2+750	s.d	2+890	KANAN	140.0	80.75	81.26	
11	2+890	s.d	3+030	KANAN	140.0	80.75	80.19	
12	3+030	s.d	3+170	KANAN	140.0	80.75	79.88	
13	3+170	s.d	3+360	KANAN	190.0	60.13	59.08	
14	3+360	s.d	3+510	KANAN	150.0	85.38	82.70	
15	3+510	s.d	3+660	KANAN	150.0	69.38	69.27	
16	3+660	s.d	3+810	KANAN	150.0	69.38	69.76	
17	3+810	s.d	3+852	KANAN	42.0	19.43	19.28	
JUMLAH					**2,742.0**	**1,311.99**	**1,349.07**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	1,755.01	m3
VOLUME USULAN CCO	.....	1,755.01	m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m3
MC UNTUK BULAN INI	.....	1,755.01	m3
MC SD BULAN INI	.....	1,755.01	m3
SISA VOLUME	.....	-	m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Pasangan Batu dengan Mortar**
SATUAN : m3
NO. DIV. : 2.2.(1)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	1+930	*s.d*	2+080	KANAN	150.0	87.56	94.14	
2	2+080	*s.d*	2+340	KANAN	224.0	122.00	140.12	
3	2+340	*s.d*	3+252	KANAN	87.0	50.79	59.69	
4	3+852	*s.d*	4+210	KANAN	358.0	208.98	245.24	
5		*s.d*						
6		*s.d*						
7		*s.d*						
8		*s.d*						
9		*s.d*						
10		*s.d*						
JUMLAH					**669.0**	**469.34**	**539.19**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	1,755.01	m3
VOLUME USULAN CCO	.....	1,755.01	m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m3
MC UNTUK BULAN INI	.....	1,755.01	m3
MC SD BULAN INI	.....	1,755.01	m3
SISA VOLUME	.....	-	m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI								LUASAN				PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			CCO				TERPASANG				CCO		TERPASANG			CCO	TERPASANG	
			a	b	c	h1	a	b	c	h1								
1	0+950	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463		0,515					
												0,463		0,506	10,00	4,625	5,063	
2	0+960	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,25	0,463		0,498					
												0,463		0,506	10,00	4,625	5,063	
3	0+970	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463		0,515					
												0,463		0,515	10,00	4,625	5,150	
4	0+980	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463		0,515					
												0,463		0,515	10,00	4,625	5,150	
5	0+990	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463		0,515					
												0,463		0,375	10,00	4,625	3,750	
6	1+000	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	0,50	0,463		0,235					
												0,463		0,375	10,00	4,625	3,750	
7	1+010	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463		0,515					
												0,463		0,375	10,00	4,625	3,750	
8	1+020	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	0,50	0,463		0,235					
												0,463		0,379	10,00	4,625	3,785	
9	1+030	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,32	0,463		0,522					
												0,463		0,527	10,00	4,625	5,273	
10	1+040	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,35	0,463		0,533					
												0,463		0,436	10,00	4,625	4,363	
11	1+050	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	0,80	0,463		0,340					
												0,463		0,340	10,00	4,625	3,400	
12	1+060	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	0,80	0,463		0,340					
												0,463		0,431	10,00	4,625	4,310	
13	1+070	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,32	0,463		0,522					
												0,463		0,533	10,00	4,625	5,325	
14	1+080	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,38	0,463		0,543					
												0,463		0,477	10,00	4,625	4,765	
15	1+090	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,00	0,463		0,410					
												0,463		0,471	10,00	4,625	4,713	
16	1+100	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,35	0,463		0,533					
										JUMLAH					**150,0**	**85,4**	**83,6**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
BID. BINA MARGA	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Staf Teknis	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI CCO a	DIMENSI CCO b	DIMENSI CCO c	DIMENSI CCO h1	DIMENSI TERPASANG a	DIMENSI TERPASANG b	DIMENSI TERPASANG c	DIMENSI TERPASANG h1	LUASAN CCO		LUASAN TERPASANG		PANJANG	VOLUME CCO	VOLUME TERPASANG	KETERANGAN
1	1+100	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,35	0,463	0,463	0,533	0,536	10,00	4,625	5,360	
2	1+110	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,37	0,463	0,463	0,540	0,545	10,00	4,625	5,448	
3	1+120	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,40	0,463	0,463	0,550	0,550	10,00	4,625	5,500	
4	1+130	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,40	0,463	0,463	0,550	0,533	10,00	4,625	5,325	
5	1+140	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463	0,463	0,515	0,529	10,00	4,625	5,290	
6	1+150	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,38	0,463	0,463	0,543	0,529	10,00	4,625	5,290	
7	1+160	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463	0,463	0,515	0,524	10,00	4,625	5,238	
8	1+170	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,35	0,463	0,463	0,533	0,536	10,00	4,625	5,360	
9	1+180	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,37	0,463	0,463	0,540	0,533	10,00	4,625	5,325	
10	1+190	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,33	0,463	0,463	0,526	0,526	10,00	4,625	5,255	
11	1+200	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,33	0,463	0,463	0,526	0,538	10,00	4,625	5,378	
12	1+210	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,40	0,463	0,463	0,550	0,550	10,00	4,625	5,500	
13	1+220	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,40	0,463	0,463	0,550	0,547	10,00	4,625	5,465	
14	1+230	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,38	0,463	0,463	0,543	0,522	10,00	4,625	5,220	
15	1+240	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,26	0,463	0,463	0,501	0,515	10,00	4,625	5,150	
16	1+250	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,34	0,463		0,529					
										JUMLAH					**150,0**	**85,4**	**96,1**	m3

Pihak Dinas PUPR
BID. BINA MARGA

AW. Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI CCO a	DIMENSI CCO b	DIMENSI CCO c	DIMENSI CCO h1	DIMENSI TERPASANG a	DIMENSI TERPASANG b	DIMENSI TERPASANG c	DIMENSI TERPASANG h1	LUASAN CCO		LUASAN TERPASANG		PANJANG	VOLUME CCO	VOLUME TERPASANG	KETERANGAN
1	1+250	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,34	0,463		0,529					
2	1+260	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,38	0,463	0,463	0,543	0,536	10,00	4,625	5,360	
3	1+270	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463	0,463	0,515	0,529	10,00	4,625	5,290	
4	1+280	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463	0,463	0,515	0,515	10,00	4,625	5,150	
5	1+290	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463	0,463	0,515	0,515	10,00	4,625	5,150	
6	1+300	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,32	0,463	0,463	0,522	0,519	10,00	4,625	5,185	
7	1+310	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,35	0,463	0,463	0,533	0,527	10,00	4,625	5,273	
8	1+320	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,498	10,00	4,625	4,975	
9	1+330	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
10	1+340	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463	0,463	0,445	0,454	10,00	4,625	4,538	
11	1+350	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	0,95	0,463	0,463	0,393	0,419	10,00	4,625	4,188	
12	1+360	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,39	0,463	0,463	0,547	0,470	10,00	4,625	4,695	
13	1+370	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463	0,463	0,515	0,531	10,00	4,625	5,308	
14	1+380	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,34	0,463	0,463	0,529	0,522	10,00	4,625	5,220	
15	1+390	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463	0,463	0,515	0,522	10,00	4,625	5,220	
16	1+400	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,42	0,463	0,463	0,557	0,536	10,00	4,625	5,360	
										JUMLAH					**150,0**	**85,4**	**91,5**	m3

Pihak Dinas PUPR
BID. BINA MARGA

AW. Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI								LUASAN				PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			CCO				TERPASANG				CCO		TERPASANG			CCO	TERPASANG	
			a	b	c	h1	a	b	c	h1								
1	1+400	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,42	0,463		0,557					
												0,463		0,541	10,00	4,625	5,413	
2	1+410	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,33	0,463		0,526					
												0,463		0,520	10,00	4,625	5,203	
3	1+420	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463		0,515					
												0,463		0,512	10,00	4,625	5,115	
4	1+430	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,28	0,463		0,508					
												0,463		0,520	10,00	4,625	5,203	
5	1+440	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,35	0,463		0,533					
												0,463		0,529	10,00	4,625	5,290	
6	1+450	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,33	0,463		0,526					
												0,463		0,552	10,00	4,625	5,518	
7	1+460	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,48	0,463		0,578					
												0,463		0,559	10,00	4,625	5,588	
8	1+470	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,37	0,463		0,540					
												0,463		0,540	10,00	4,625	5,395	
9	1+480	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,37	0,463		0,540					
												0,463		0,524	10,00	4,625	5,238	
10	1+490	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,28	0,463		0,508					
												0,463		0,508	10,00	4,625	5,080	
11	1+500	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,28	0,463		0,508					
												0,463		0,494	10,00	4,625	4,940	
12	1+510	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,20	0,463		0,480					
												0,463		0,501	10,00	4,625	5,010	
13	1+520	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,32	0,463		0,522					
												0,463		0,522	10,00	4,625	5,220	
14	1+530	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,32	0,463		0,522					
												0,463		0,519	10,00	4,625	5,185	
15	1+540	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463		0,515					
												0,463		0,515	10,00	4,625	5,150	
16	1+550	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463		0,515					
										JUMLAH					**150,0**	**85,4**	**94,5**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
BID. BINA MARGA	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Staf Teknis	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI								LUASAN				PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			CCO				TERPASANG				CCO		TERPASANG			CCO	TERPASANG	
			a	b	c	h1	a	b	c	h1								
1	1+550	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463		0,515					
												0,463		0,524	10,00	4,625	5,238	
2	1+560	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,35	0,463		0,533					
												0,463		0,538	10,00	4,625	5,378	
3	1+570	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,38	0,463		0,543					
												0,463		0,526	10,00	4,625	5,255	
4	1+580	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,28	0,463		0,508					
												0,463		0,520	10,00	4,625	5,203	
5	1+590	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,35	0,463		0,533					
												0,463		0,538	10,00	4,625	5,378	
6	1+600	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,38	0,463		0,543					
												0,463		0,534	10,00	4,625	5,343	
7	1+610	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,33	0,463		0,526					
												0,463		0,534	10,00	4,625	5,343	
8	1+620	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,38	0,463		0,543					
												0,463		0,538	10,00	4,625	5,378	
9	1+630	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,35	0,463		0,533					
												0,463		0,529	10,00	4,625	5,290	
10	1+640	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,33	0,463		0,526					
												0,463		0,520	10,00	4,625	5,203	
11	1+650	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463		0,515					
												0,463		0,527	10,00	4,625	5,273	
12	1+660	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,37	0,463		0,540					
												0,463		0,531	10,00	4,625	5,308	
13	1+670	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,32	0,463		0,522					
												0,463		0,519	10,00	4,625	5,185	
14	1+680	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463		0,515					
												0,463		0,526	10,00	4,625	5,255	
15	1+690	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,36	0,463		0,536					
												0,463		0,547	10,00	4,625	5,465	
16	1+700	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,42	0,463		0,557					
										JUMLAH					**150,0**	**85,4**	**95,5**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
BID. BINA MARGA	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Staf Teknis	Inspector	Manager Teknik

PT. STAR MITRA SULAWESI

NUSANTARA

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI								LUASAN				PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			CCO				TERPASANG				CCO		TERPASANG			CCO	TERPASANG	
			a	b	c	h1	a	b	c	h1								
1	1+700	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,42	0,463		0,557					
												0,463		0,554	10,00	4,625	5,535	
2	1+710	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,40	0,463		0,550					
												0,463		0,536	10,00	4,625	5,360	
3	1+720	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,32	0,463		0,522					
												0,463		0,533	10,00	4,625	5,325	
4	1+730	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,38	0,463		0,543					
												0,463		0,541	10,00	4,625	5,413	
5	1+740	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,37	0,463		0,540					
												0,463		0,536	10,00	4,625	5,360	
6	1+750	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,35	0,463		0,533					
												0,463		0,529	10,00	4,625	5,290	
7	1+760	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,33	0,463		0,526					
												0,463		0,513	10,00	4,625	5,133	
8	1+770	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,26	0,463		0,501					
												0,463		0,508	10,00	4,625	5,080	
9	1+780	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463		0,515					
												0,463		0,522	10,00	4,625	5,220	
10	1+790	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,34	0,463		0,529					
												0,463		0,536	10,00	4,625	5,360	
11	1+800	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,38	0,463		0,543					
												0,463		0,547	10,00	4,625	5,465	
12	1+810	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,40	0,463		0,550					
												0,463		0,534	10,00	4,625	5,343	
13	1+820	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,31	0,463		0,519					
												0,463		0,508	10,00	4,625	5,080	
14	1+830	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,25	0,463		0,498					
												0,463		0,515	10,00	4,625	5,150	
15	1+840	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,35	0,463		0,533					
												0,463		0,506	10,00	4,625	5,063	
16	1+850	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,20	0,463		0,480					
										JUMLAH					**150,0**	**85,4**	**95,2**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
BID. BINA MARGA	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Staf Teknis	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI								LUASAN				PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			CCO				TERPASANG				CCO		TERPASANG			CCO	TERPASANG	
			a	b	c	h1	a	b	c	h1								
1	1+850	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,20	0,463		0,480					
												0,463		0,498	50,00	23,125	24,875	
2	1+900	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,30	0,463		0,515					
												0,463		0,410	10,00	4,625	4,100	
3	1+910	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	0,70	0,463		0,305					
												0,463		0,305	10,00	4,625	3,050	
4	1+920	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	0,70	0,463		0,305					
												0,463		0,305	10,00	4,625	3,050	
5	1+930	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	0,70	0,463		0,305					
1	2+375	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463		0,463					
												0,463		0,459	2,00	0,925	0,918	
2	2+377	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463		0,456					
												0,463		0,461	7,00	3,238	3,225	
3	2+384	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463		0,466					
												0,463		0,464	6,00	2,775	2,786	
4	2+390	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463		0,463					
												0,463		0,466	10,00	4,625	4,660	
5	2+400	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463		0,470					
												0,463		0,471	10,00	4,625	4,713	
6	2+410	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,18	0,463		0,473					
												0,463		0,468	10,00	4,625	4,678	
7	2+420	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463		0,463					
												0,463		0,463	10,00	4,625	4,625	
8	2+430	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463		0,463					
												0,463		0,459	10,00	4,625	4,590	
9	2+440	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463		0,456					
												0,463		0,466	10,00	4,625	4,660	
10	2+450	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,19	0,463		0,477					
										JUMLAH					**155,0**	**87,7**	**85,9**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
BID. BINA MARGA	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Staf Teknis	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI CCO a	DIMENSI CCO b	DIMENSI CCO c	DIMENSI CCO h1	DIMENSI TERPASANG a	DIMENSI TERPASANG b	DIMENSI TERPASANG c	DIMENSI TERPASANG h1	LUASAN CCO	LUASAN TERPASANG	PANJANG	VOLUME CCO	VOLUME TERPASANG	KETERANGAN
1	2+450	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,19	0,463	0,477	10,00	4,625	4,748	
2	2+460	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,18	0,463	0,473	10,00	4,625	4,748	
3	2+470	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,19	0,463	0,477	10,00	4,625	4,730	
4	2+480	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463	0,470	10,00	4,625	4,678	
5	2+490	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463	0,466	10,00	4,625	4,555	
	2+500	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463	0,445	10,00	4,625	4,450	
1	2+510	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463	0,445	10,00	4,625	4,450	
2	2+520	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463	0,445	10,00	4,625	4,538	
3	2+530	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	10,00	4,625	4,660	
4	2+540	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463	0,470	10,00	4,625	4,660	
5	2+550	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	10,00	4,625	4,660	
6	2+560	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463	0,470	10,00	4,625	4,695	
7	2+570	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463	0,470	10,00	4,625	4,695	
8	2+580	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463	0,470	10,00	4,625	4,660	
9	2+590	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
10	2+600	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463				
										JUMLAH			**150,0**	**85,4**	**85,6**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
BID. BINA MARGA	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Staf Teknis	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI CCO a	DIMENSI CCO b	DIMENSI CCO c	DIMENSI CCO h1	DIMENSI TERPASANG a	DIMENSI TERPASANG b	DIMENSI TERPASANG c	DIMENSI TERPASANG h1	LUASAN CCO		LUASAN TERPASANG		PANJANG	VOLUME CCO	VOLUME TERPASANG	KETERANGAN
1	2+600	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,454	10,00	4,625	4,538	
2	2+610	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463	0,463	0,445	0,459	10,00	4,625	4,590	
3	2+620	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,18	0,463	0,463	0,473	0,468	10,00	4,625	4,678	
4	2+630	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,454	10,00	4,625	4,538	
5	2+640	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463	0,463	0,445	0,456	10,00	4,625	4,555	
6	2+650	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463	0,463	0,466	0,470	10,00	4,625	4,695	
7	2+660	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,18	0,463	0,463	0,473	0,477	10,00	4,625	4,765	
8	2+670	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,20	0,463	0,463	0,480	0,473	10,00	4,625	4,730	
9	2+680	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463	0,463	0,466	0,461	10,00	4,625	4,608	
10	2+690	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463	0,463	0,456	0,442	10,00	4,625	4,415	
11	2+700	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,05	0,463	0,463	0,428	0,436	10,00	4,625	4,363	
12	2+710	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463	0,463	0,445	0,442	10,00	4,625	4,415	
13	2+720	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,08	0,463	0,463	0,438	0,445	10,00	4,625	4,450	
14	2+730	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,12	0,463	0,463	0,452	0,440	10,00	4,625	4,398	
15	2+740	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,05	0,463		0,428					
										JUMLAH					**140,0**	**80,8**	**79,7**	m3

Pihak Dinas PUPR
BID. BINA MARGA

AW. Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI CCO a	DIMENSI CCO b	DIMENSI CCO c	DIMENSI CCO h1	DIMENSI TERPASANG a	DIMENSI TERPASANG b	DIMENSI TERPASANG c	DIMENSI TERPASANG h1	LUASAN CCO		LUASAN TERPASANG		PANJANG	VOLUME CCO	VOLUME TERPASANG	KETERANGAN
1	2+750	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,459	10,00	4,625	4,590	
2	2+760	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463	0,463	0,456	0,464	10,00	4,625	4,643	
3	2+770	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,18	0,463	0,463	0,473	0,468	10,00	4,625	4,678	
4	2+780	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,454	10,00	4,625	4,538	
5	2+790	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463	0,463	0,445	0,466	10,00	4,625	4,660	
6	2+800	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,22	0,463	0,463	0,487	0,480	10,00	4,625	4,800	
7	2+810	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,18	0,463	0,463	0,473	0,463	10,00	4,625	4,625	
8	2+820	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,12	0,463	0,463	0,452	0,457	10,00	4,625	4,573	
9	2+830	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,475	10,00	4,625	4,748	
10	2+840	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,22	0,463	0,463	0,487	0,480	10,00	4,625	4,800	
11	2+850	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,18	0,463	0,463	0,473	0,468	10,00	4,625	4,678	
12	2+860	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
13	2+870	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,464	10,00	4,625	4,643	
14	2+880	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463	0,463	0,466	0,466	10,00	4,625	4,660	
15	2+890	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463		0,466					
										JUMLAH					140,0	80,8	81,3	m3

Pihak Dinas PUPR
BID. BINA MARGA

AW. Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI CCO a	DIMENSI CCO b	DIMENSI CCO c	DIMENSI CCO h1	DIMENSI TERPASANG a	DIMENSI TERPASANG b	DIMENSI TERPASANG c	DIMENSI TERPASANG h1	LUASAN CCO		LUASAN TERPASANG		PANJANG	VOLUME CCO	VOLUME TERPASANG	KETERANGAN
1	2+890	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463	0,463	0,466	0,464	10,00	4,625	4,643	
2	2+900	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,459	10,00	4,625	4,590	
3	2+910	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463	0,463	0,456	0,456	10,00	4,625	4,555	
4	2+920	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463	0,463	0,456	0,459	10,00	4,625	4,590	
5	2+930	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
6	2+940	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
7	2+950	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,459	10,00	4,625	4,590	
8	2+960	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463	0,463	0,456	0,456	10,00	4,625	4,555	
9	2+970	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463	0,463	0,456	0,459	10,00	4,625	4,590	
10	2+980	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
11	2+990	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,459	10,00	4,625	4,590	
12	3+000	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463	0,463	0,456	0,452	10,00	4,625	4,520	
13	3+010	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,11	0,463	0,463	0,449	0,456	10,00	4,625	4,555	
14	3+020	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,454	10,00	4,625	4,538	
15	3+030	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463		0,445					
										JUMLAH					140,0	80,8	80,2	m3

Pihak Dinas PUPR
BID. BINA MARGA

AW. Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI CCO a	DIMENSI CCO b	DIMENSI CCO c	DIMENSI CCO h1	DIMENSI TERPASANG a	DIMENSI TERPASANG b	DIMENSI TERPASANG c	DIMENSI TERPASANG h1	LUASAN CCO		LUASAN TERPASANG		PANJANG	VOLUME CCO	VOLUME TERPASANG	KETERANGAN
1	3+030	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463	0,463	0,445	0,447	10,00	4,625	4,468	
2	3+040	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,11	0,463	0,463	0,449	0,447	10,00	4,625	4,468	
3	3+050	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463	0,463	0,445	0,447	10,00	4,625	4,468	
4	3+060	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,11	0,463	0,463	0,449	0,450	10,00	4,625	4,503	
5	3+070	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,12	0,463	0,463	0,452	0,450	10,00	4,625	4,503	
6	3+080	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,11	0,463	0,463	0,449	0,447	10,00	4,625	4,468	
7	3+090	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463	0,463	0,445	0,457	10,00	4,625	4,573	
8	3+100	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463	0,463	0,470	0,466	10,00	4,625	4,660	
9	3+110	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
10	3+120	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,466	10,00	4,625	4,660	
11	3+130	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463	0,463	0,470	0,464	10,00	4,625	4,643	
12	3+140	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,14	0,463	0,463	0,459	0,463	10,00	4,625	4,625	
13	3+150	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463	0,463	0,466	0,464	10,00	4,625	4,643	
14	3+160	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,457	10,00	4,625	4,573	
15	3+170	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,12	0,463		0,452					
										JUMLAH					**140,0**	**80,8**	**79,9**	m3

Pihak Dinas PUPR
BID. BINA MARGA

AW. Hanggika
Staf Teknis

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI CCO a	DIMENSI CCO b	DIMENSI CCO c	DIMENSI CCO h1	DIMENSI TERPASANG a	DIMENSI TERPASANG b	DIMENSI TERPASANG c	DIMENSI TERPASANG h1	LUASAN CCO	LUASAN TERPASANG	PANJANG	VOLUME CCO	VOLUME TERPASANG	KETERANGAN
1	3+170	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,12	0,463	0,452	10,00	4,625	4,503	
2	3+180	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,11	0,463	0,449	10,00	4,625	4,468	
3	3+190	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463	0,445	10,00	4,625	4,468	
4	3+200	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,11	0,463	0,449	10,00	4,625	4,555	
6	3+260	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	10,00	4,625	4,555	
7	3+270	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,11	0,463	0,449	10,00	4,625	4,678	
8	3+280	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	10,00	4,625	4,608	
9	3+290	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,18	0,463	0,473	10,00	4,625	4,485	
10	3+300	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,11	0,463	0,449	10,00	4,625	4,520	
11	3+310	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463	0,456	10,00	4,625	4,538	
12	3+320	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,12	0,463	0,452	10,00	4,625	4,538	
13	3+330	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463	0,456	10,00	4,625	4,590	
14	3+340	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	10,00	4,625	4,573	
15	3+350	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,12	0,463	0,452				
16	3+360	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15										
										JUMLAH			130,0	60,1	59,1	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
BID. BINA MARGA	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Staf Teknis	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI CCO a	DIMENSI CCO b	DIMENSI CCO c	DIMENSI CCO h1	DIMENSI TERPASANG a	DIMENSI TERPASANG b	DIMENSI TERPASANG c	DIMENSI TERPASANG h1	LUASAN CCO	LUASAN TERPASANG	PANJANG	VOLUME CCO	VOLUME TERPASANG	KETERANGAN
1	3+360	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,12	0,463	0,452	10,00	4,625	4,538	
2	3+370	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463	0,454	10,00	4,625	4,520	
3	3+380	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,11	0,463	0,456	10,00	4,625	4,520	
4	3+390	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463	0,449	10,00	4,625	4,503	
5	3+400	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463	0,456	10,00	4,625	4,468	
6	3+410	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,11	0,463	0,445	10,00	4,625	4,555	
7	3+420	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,449	10,00	4,625	3,663	
8	3+430	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	0,60	0,463	0,463	10,00	4,625	3,628	
9	3+440	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463	0,463	10,00	4,625	4,520	
10	3+450	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,11	0,463	0,270	10,00	4,625	4,555	
11	3+460	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,456	10,00	4,625	4,625	
12	3+470	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,449	10,00	4,625	4,660	
13	3+480	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463	0,463	10,00	4,625	4,660	
14	3+490	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
15	3+500	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	10,00	4,625	4,660	
16	3+510	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463	0,463	10,00	4,625	4,660	
												0,470				
										JUMLAH			**150,0**	**85,4**	**82,7**	m3

Pihak Dinas PUPR
BID. BINA MARGA

AW. Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI								LUASAN				PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			CCO				TERPASANG				CCO		TERPASANG			CCO	TERPASANG	
			a	b	c	h1	a	b	c	h1								
1	3+510	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463	0,463	0,470	0,459	10,00	4,625	4,590	
2	3+520	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,11	0,463	0,463	0,449	0,447	10,00	4,625	4,468	
3	3+530	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,10	0,463	0,463	0,445	0,454	10,00	4,625	4,538	
4	3+540	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
5	3+550	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,464	10,00	4,625	4,643	
6	3+560	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463	0,463	0,466	0,466	10,00	4,625	4,660	
7	3+570	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463	0,463	0,466	0,459	10,00	4,625	4,590	
8	3+580	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,12	0,463	0,463	0,452	0,457	10,00	4,625	4,573	
9	3+590	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
10	3+600	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
11	3+610	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,468	10,00	4,625	4,678	
12	3+620	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,18	0,463	0,463	0,473	0,471	10,00	4,625	4,713	
13	3+630	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463	0,463	0,470	0,466	10,00	4,625	4,660	
14	3+640	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,464	10,00	4,625	4,643	
15	3+650	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463	0,463	0,466	0,464	10,00	4,625	4,643	
16	3+660	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463		0,463					
										JUMLAH					150,0	69,4	69,3	m3

Pihak Dinas PUPR
BID. BINA MARGA

AW. Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI CCO a	DIMENSI CCO b	DIMENSI CCO c	DIMENSI CCO h1	DIMENSI TERPASANG a	DIMENSI TERPASANG b	DIMENSI TERPASANG c	DIMENSI TERPASANG h1	LUASAN CCO		LUASAN TERPASANG		PANJANG	VOLUME CCO	VOLUME TERPASANG	KETERANGAN
1	3+660	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
2	3+670	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,466	10,00	4,625	4,660	
3	3+680	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463	0,463	0,470	0,468	10,00	4,625	4,678	
4	3+690	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463	0,463	0,466	0,468	10,00	4,625	4,678	
5	3+700	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463	0,463	0,470	0,468	10,00	4,625	4,678	
6	3+710	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463	0,463	0,466	0,466	10,00	4,625	4,660	
7	3+720	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463	0,463	0,466	0,464	10,00	4,625	4,643	
8	3+730	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,466	10,00	4,625	4,660	
9	3+740	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,17	0,463	0,463	0,470	0,466	10,00	4,625	4,660	
10	3+750	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
11	3+760	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,464	10,00	4,625	4,643	
12	3+770	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463	0,463	0,466	0,464	10,00	4,625	4,643	
13	3+780	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,464	10,00	4,625	4,643	
14	3+790	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,16	0,463	0,463	0,466	0,464	10,00	4,625	4,643	
15	3+800	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
16	3+810	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463		0,463					
										JUMLAH					**150,0**	**69,4**	**69,8**	m3

Pihak Dinas PUPR
BID. BINA MARGA

AW. Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI CCO a	DIMENSI CCO b	DIMENSI CCO c	DIMENSI CCO h1	DIMENSI TERPASANG a	DIMENSI TERPASANG b	DIMENSI TERPASANG c	DIMENSI TERPASANG h1	LUASAN CCO		LUASAN TERPASANG		PANJANG	VOLUME CCO	VOLUME TERPASANG	KETERANGAN
1	3+810	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,463	10,00	4,625	4,625	
2	3+820	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,457	10,00	4,625	4,573	
3	3+830	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,12	0,463	0,463	0,452	0,457	10,00	4,625	4,573	
4	3+840	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,15	0,463	0,463	0,463	0,459	12,00	5,550	5,508	
5	3+852	KANAN	0,30	0,40	0,15	1,15	0,30	0,40	0,15	1,13	0,463		0,456					
										JUMLAH					42,0	19,4	19,3	m3

Pihak Dinas PUPR
BID. BINA MARGA

AW. Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asnia Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI CCO a	b	c	d	h2	h1	DIMENSI TERPASANG a	b	c	d	h1	h2	LUASAN CCO		LUASAN TERPASANG		PANJANG	VOLUME CCO	VOLUME TERPASANG	KETERANGAN
1	1+930	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,56	0,584	0,584	0,587	0,590	10,00	5,838	5,895	
2	1+940	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,72	0,56	0,584	0,584	0,592	0,617	10,00	5,838	6,166	
3	1+950	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,80	0,65	0,584	0,584	0,641	0,618	10,00	5,838	6,175	
4	1+960	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,74	0,55	0,584	0,584	0,594	0,605	10,00	5,838	6,049	
5	1+970	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,79	0,58	0,584	0,584	0,616	0,616	10,00	5,838	6,156	
6	1+980	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,80	0,57	0,584	0,584	0,615	0,633	10,00	5,838	6,328	
7	1+990	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,94	0,57	0,584	0,584	0,650	0,615	10,00	5,838	6,151	
8	2+000	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,75	0,50	0,584	0,584	0,580	0,597	10,00	5,838	5,968	
9	2+010	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,78	0,58	0,584	0,584	0,614	0,628	10,00	5,838	6,283	
10	2+020	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,95	0,54	0,584	0,584	0,643	0,665	10,00	5,838	6,646	
11	2+030	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,98	0,65	0,584	0,584	0,686	0,686	10,00	5,838	6,863	
12	2+040	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,98	0,65	0,584	0,584	0,686	0,654	10,00	5,838	6,538	
13	2+050	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,85	0,55	0,584	0,584	0,621	0,607	10,00	5,838	6,069	
14	2+060	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,80	0,50	0,584	0,584	0,593	0,626	10,00	5,838	6,263	
15	2+070	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,94	0,60	0,584	0,584	0,660	0,659	10,00	5,838	6,593	
16	2+080	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,96	0,58	0,584		0,659					
														JUMLAH					150,00	87,56	94,14	m3

Pihak Dinas PUPR
BID. BINA MARGA

AW. Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI RENCANA a	b	c	d	h2	h1	DIMENSI CCO a	b	c	d	h1	h2	LUASAN RENCANA		LUASAN CCO		PANJANG	VOLUME RENCANA	VOLUME CCO	KETERANGAN
1	2+080	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,96	0,58	0,584	0,584	0,659	0,637	10,00	5,838	6,369	
2	2+090	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,80	0,57	0,584	0,584	0,615	0,633	10,00	5,838	6,328	
3	2+100	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,94	0,57	0,584	0,584	0,650	0,615	10,00	5,838	6,151	
4	2+110	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,75	0,50	0,584	0,584	0,580	0,597	10,00	5,838	5,968	
5	2+120	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,78	0,58	0,584	0,584	0,614	0,628	10,00	5,838	6,283	
6	2+130	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,95	0,54	0,584	0,584	0,643	0,665	10,00	5,838	6,646	
7	2+140	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,98	0,65	0,584	0,584	0,686	0,686	10,00	5,838	6,863	
8	2+150	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,98	0,65	0,584	0,584	0,686	0,662	14,00	8,173	9,273	
9	2+164	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,88	0,58	0,584		0,639					
1	2+200	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,10	0,70	0,584	0,584	0,733	0,706	25,00	14,594	17,653	
2	2+225	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,98	0,63	0,584	0,584	0,680	0,671	25,00	14,594	16,769	
3	2+250	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,96	0,59	0,584	0,584	0,662	0,656	25,00	14,594	16,400	
4	2+275	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,94	0,57	0,584	0,584	0,650	0,692	25,00	14,594	17,303	
5	2+300	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,21	0,62	0,584	0,584	0,734	0,725	25,00	14,594	18,113	
6	2+325	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,16	0,60	0,584	0,584	0,715	0,716	15,00	8,756	10,744	
7	2+340	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,17	0,60	0,584		0,718					
														JUMLAH					224,00	122,00	140,12	m3

Pihak Dinas PUPR
BID. BINA MARGA

AW. Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI RENCANA a	b	c	d	h2	h1	DIMENSI CCO a	b	c	d	h1	h2	LUASAN RENCANA		LUASAN CCO		PANJANG	VOLUME RENCANA	VOLUME CCO	KETERANGAN
1	2+340	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,16	0,60	0,584	0,584	0,715	0,665	10,00	5,838	6,651	
2	2+350	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,80	0,57	0,584	0,584	0,615	0,633	10,00	5,838	6,328	
3	2+360	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,94	0,57	0,584	0,584	0,650	0,615	15,00	8,756	9,227	
4	2+375	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	0,75	0,50	0,584		0,580					
1	3+200	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,14	0,60	0,584	0,584	0,710	0,738	10,00	5,838	7,381	
2	3+210	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,30	0,65	0,584	0,584	0,766	0,746	10,00	5,838	7,456	
3	3+220	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,20	0,60	0,584	0,584	0,725	0,717	10,00	5,838	7,168	
4	3+230	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,16	0,58	0,584	0,584	0,709	0,706	10,00	5,838	7,061	
5	3+240	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,18	0,55	0,584	0,584	0,704	0,702	12,00	7,005	8,420	
6	3+252	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,15	0,56	0,584		0,700					
														JUMLAH					87,00	50,79	59,69	m3

Pihak Dinas PUPR
BID. BINA MARGA

AW. Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Pasangan batu dengan mortar
Satuan : m3

SKETS PENAMPANG :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI RENCANA a	b	c	d	h2	h1	DIMENSI CCO a	b	c	d	h1	h2	LUASAN RENCANA		LUASAN CCO		PANJANG	VOLUME RENCANA	VOLUME CCO	KETERANGAN
1	3+852	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,13	0,47	0,584	0,584	0,665	0,660	8,00	4,670	5,276	
2	3+860	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,11	0,45	0,584	0,584	0,654	0,661	25,00	14,594	16,516	
3	3+885	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,10	0,50	0,584	0,584	0,668	0,664	25,00	14,594	16,594	
4	3+910	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,07	0,50	0,584	0,584	0,660	0,658	25,00	14,594	16,438	
5	3+935	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,05	0,50	0,584	0,584	0,655	0,664	25,00	14,594	16,606	
6	3+960	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,15	0,48	0,584	0,584	0,674	0,681	25,00	14,594	17,013	
7	3+985	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,18	0,50	0,584	0,584	0,688	0,676	25,00	14,594	16,888	
8	4+010	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,11	0,48	0,584	0,584	0,664	0,666	25,00	14,594	16,650	
9	4+035	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,13	0,48	0,584	0,584	0,669	0,671	25,00	14,594	16,775	
10	4+060	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,15	0,48	0,584	0,584	0,674	0,672	25,00	14,594	16,788	
11	4+085	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,16	0,46	0,584	0,584	0,670	0,668	25,00	14,594	16,706	
12	4+110	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,15	0,46	0,584	0,584	0,667	0,699	25,00	14,594	17,463	
13	4+135	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,09	0,70	0,584	0,584	0,730	0,731	25,00	14,594	18,281	
14	4+160	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,10	0,70	0,584	0,584	0,733	0,745	25,00	14,594	18,625	
15	4+185	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,20	0,70	0,584	0,584	0,758	0,745	25,00	14,594	18,625	
16	4+210	KANAN	0,25	0,50	0,40	0,20	0,70	0,55	0,25	0,50	0,40	0,20	1,10	0,70	0,584		0,733					
														JUMLAH					358,00	208,98	245,24	m3

Pihak Dinas PUPR
BID. BINA MARGA

AW. Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS	:	**PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR	:	PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN	:	**Galian Perkerasan Beraspal**
SATUAN	:	m3
NO. DIV.	:	3.1.(8)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+075	s.d	1+320	Full	293.0	69.96	69.96	
2		s.d						
JUMLAH					**293.0**	**69.96**	**69.96**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	912.00	m3
VOLUME USULAN CCO	.....	69.96	m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m3
MC UNTUK BULAN INI	.....	69.96	m3
MC SD BULAN INI	.....	69.96	m3
SISA VOLUME	.....	-	m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
SULAN, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Galian Perkerasan Beraspal
Nomor Divisi : 3.1.(8)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI					PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			DESAIN		USULAN CCO				DESAIN	CCO	
			Lebar	Tebal	Lebar	Tebal	Rata2				
											RUAS.01
1	0+075	Full	4,00	0,06	4,00	0,06	0,06	5,00	1,20	1,20	
2	0+080	Full	4,00	0,06	4,00	0,06					
1	0+130	Kanan	2,00	0,06	2,00	0,06	0,06	3,00	0,36	0,36	
2	0+133	Kanan	2,00	0,06	2,00	0,06					
1	0+400	Full	4,00	0,06	4,00	0,06	0,06	15,00	3,60	3,60	
2	0+415	Full	4,00	0,06	4,00	0,06					
1	0+950	Full	4,00	0,06	4,00	0,06	0,06	50,00	12,00	12,00	
2	1+000	Full	4,00	0,06	4,00	0,06					
1	1+050	Full	4,00	0,06	4,00	0,06	0,06	50,00	12,00	12,00	
2	1+100	Full	4,00	0,06	4,00	0,06	0,06	50,00	12,00	12,00	
3	1+150	Full	4,00	0,06	4,00	0,06					
1	1+200	Full	4,00	0,06	4,00	0,06	0,06	50,00	12,00	12,00	
2	1+250	Full	4,00	0,06	4,00	0,06	0,06	50,00	12,00	12,00	
3	1+300	Full	4,00	0,06	4,00	0,06	0,06	20,00	4,80	4,80	
4	1+320	Full	4,00	0,06	4,00	0,06					
							Jumlah	**293,00**	**69,96**	**69,96**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
Pengawas Teknis	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. HANGDIKA	**ASMA HENDRA, ST**	**SUDARMONO, ST**
Staf Teknis	Inspector	Manager Teknik

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Galian Biasa**
SATUAN : m3
NO. DIV. : 3.1.(1)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	2+200	s.d	4+140	Kanan	430.0	455.50	455.50	
2		s.d						
JUMLAH					**430.0**	**455.50**	**455.50**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	1,068.62	m3
VOLUME USULAN CCO	.....	455.50	m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m3
MC UNTUK BULAN INI	.....	455.50	m3
MC SD BULAN INI	.....	455.50	m3
SISA VOLUME	.....	-	m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

PROYEK : **PENINGKATAN JALAN KAWATA-LEDU-LEDU (POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN : GALIAN BIASA

NO	STA.	LUASAN	LUASAN RATA2	PANJANG	VOLUME GALIAN CADAS
1	2+200	1,370			
			1,370	25,00	34,250
	2+225	1,370			
			1,370	25,00	34,250
	2+250	1,370			
			1,370	25,00	34,250
	2+275	1,370			
			1,370	25,00	34,250
	2+300	1,370			
2	2+300	1,365			
			1,365	25,00	34,125
	2+325	1,365			
			1,365	15,00	20,475
	2+340	1,365			
3	3+850	0,910			
			0,910	25,00	22,750
	3+875	0,910			
			0,910	25,00	22,750
	3+900	0,910			
			0,910	25,00	22,750
	3+925	0,910			
			0,910	25,00	22,750
	3+950	0,910			
			0,910	25,00	22,750
	3+975	0,910			
			0,910	25,00	22,750
	4+000	0,910			
			0,910	25,00	22,750
	4+025	0,910			
			0,910	25,00	22,750
	4+050	0,910			
			0,910	25,00	22,750
	4+075	0,910			
			0,910	25,00	22,750
	4+100	0,910			
			0,910	25,00	22,750
	4+125	0,910			
			0,910	15,00	13,650
	4+140	0,910			
JUMLAH				**430,00**	**455,50**

Diketahui Oleh,	Diperiksa Oleh,	Dikerjakan Oleh,
Pihak Dinas PUPR Kab.Lutim	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Staf Teknik	Inspector	Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

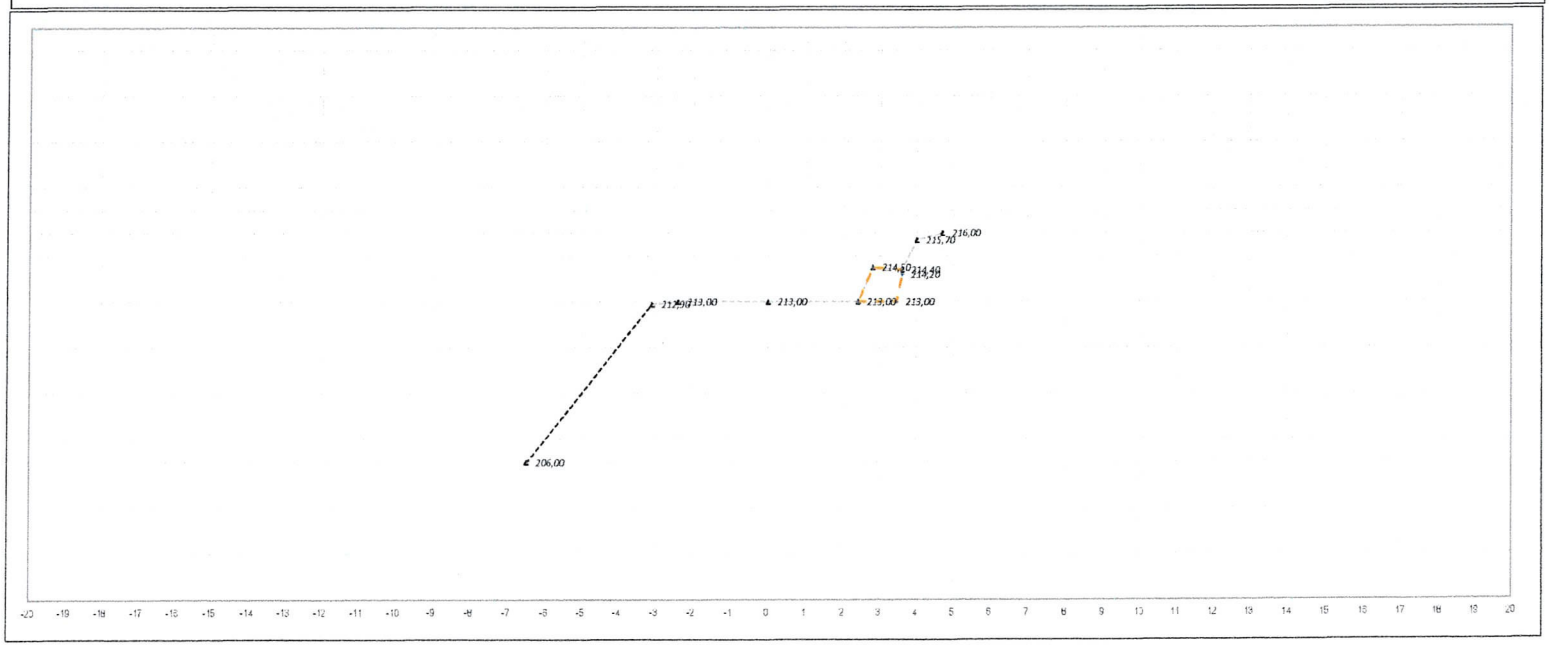

STA.	2 + 200	KOORDINAT CROSS SECTION																														Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,10	-2,40	0,00	2,40	2,80	3,60	4,00	4,70										
	Y													206,00	212,90	213,00	213,00	213,00	214,50	214,40	215,70	216,00										
GALIAN	X																2,40	2,40	3,45	3,60	3,60	2,80	2,40									1,370
	Y																213,00	213,00	213,00	214,20	214,40	214,50	213,00									
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511	735	767	771	600	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.899,09
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511	511	739	772	772	596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.901,83

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Aima Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

NUSANTARA
BINTAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

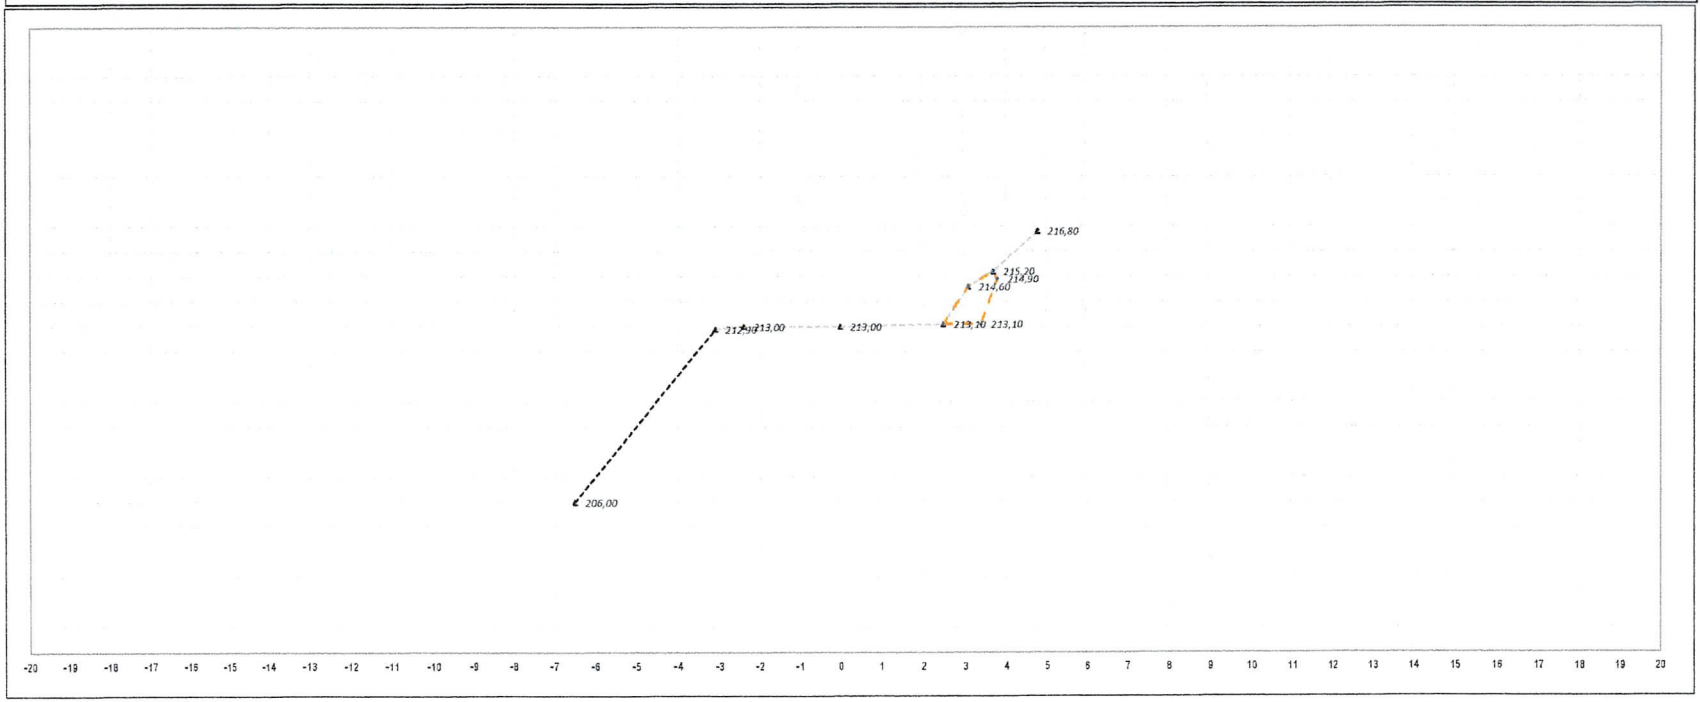

STA.	2 + 300	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,10	-2,40	0,00	2,50	3,10	3,70	4,80												
	Y													206,00	212,90	213,00	**213,00**	213,10	214,60	215,20	216,80												
GALIAN	X																2,50	2,50	3,40	3,80	3,70	3,10	2,50										1,365
	Y																213,10	213,10	213,10	214,90	215,20	214,60	213,10										
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533	725	810	795	667	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.065,82
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533	533	731	818	794	661	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.068,55

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

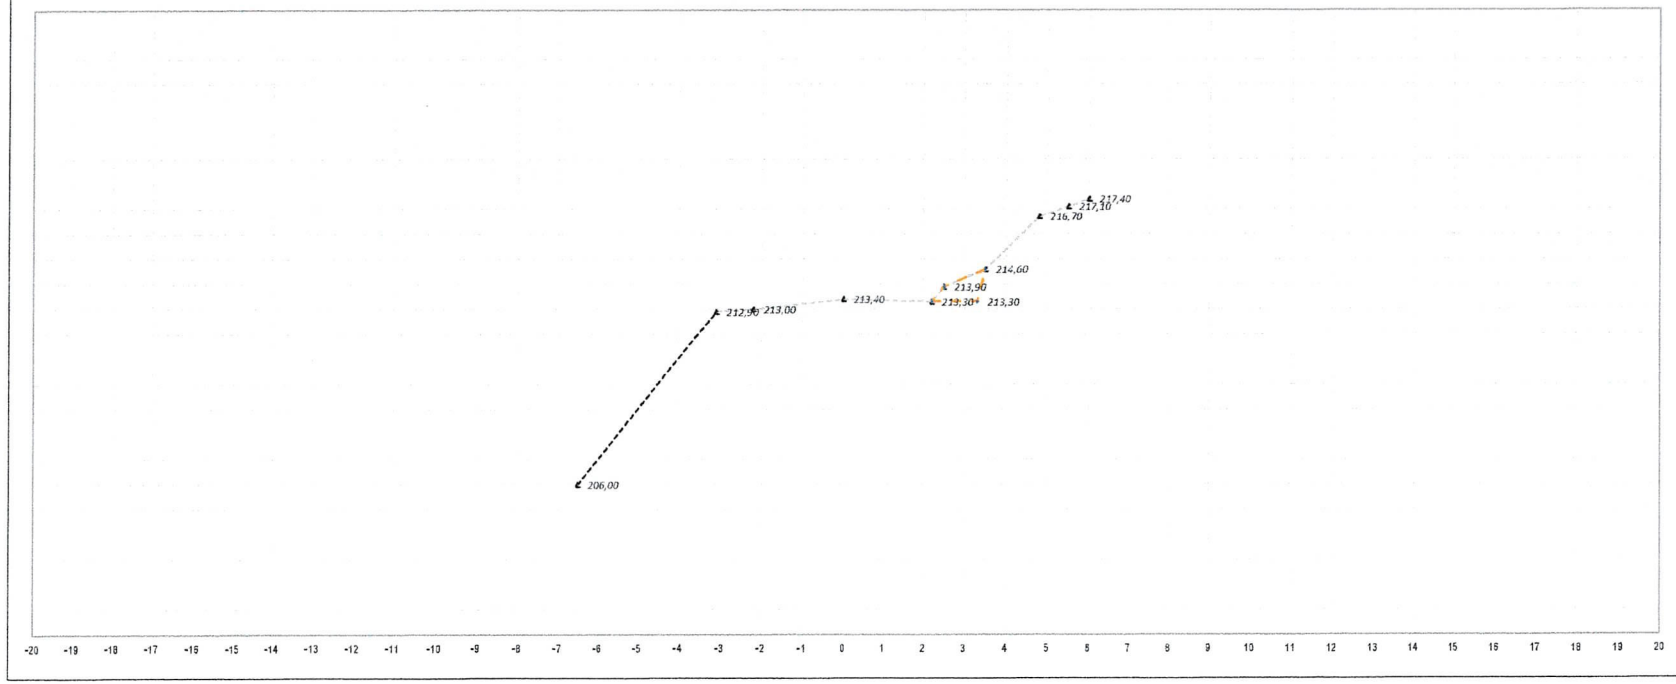

STA.	3 + 850	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,10	-2,20	0,00	2,20	2,50	3,50	4,80	5,50	6,00										
	Y													206,00	212,90	213,00	**213,40**	213,30	213,90	214,60	216,70	217,10	217,40										
GALIAN	X																2,20	2,20	3,30	3,50	2,50	2,20											0,910
	Y																213,30	213,30	213,30	214,60	213,90	213,30											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469	704	747	537	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.926,78
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469	469	708	749	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.928,60

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Ianedika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Galian Batu Lunak**
SATUAN : m3
NO. DIV. : 3.1.(2)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	1+000	s.d	1+750	Kanan	612.0	1,214.38	1,214.38	
2	1+750	s.d	3+400	Kanan	560.0	889.82	889.82	
3	3+508	s.d	3+850	Kanan	262.0	365.16	365.16	
JUMLAH					**1,434.0**	**2,469.36**	**2,469.36**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	4,840.18	m3
VOLUME USULAN CCO	.....	1,641.04	m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m3
MC UNTUK BULAN INI	.....	1,641.04	m3
MC SD BULAN INI	.....	1,641.04	m3
SISA VOLUME	.....	-	m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

PROYEK : **PENINGKATAN JALAN KAWATA-LEDU-LEDU (POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN : GALIAN BATU LUNAK

NO	STA.	LUASAN	LUASAN RATA2	PANJANG	VOLUME GALIAN CADAS
1	1+000	1,635			
	1+025	1,635	1,635	25,00	40,875
	1+050	1,635	1,635	25,00	40,875
	1+075	1,635	1,635	25,00	40,875
	1+100	1,635	1,635	25,00	40,875
	1+120	1,635	1,635	20,00	32,700
2	1+123	2,300			
	1+250	2,300	2,300	127,00	292,100
3	1+255	1,900			
	1+280	1,900	1,900	25,00	47,500
	1+300	1,900	1,900	20,00	38,000
4	1+305	2,670			
	1+325	2,670	2,670	20,00	53,400
	1+350	2,670	2,670	25,00	66,750
5	1+375	2,015			
	1+400	2,015	2,015	25,00	50,375
	1+425	2,015	2,015	25,00	50,375
	1+450	2,015	2,015	25,00	50,375
	1+475	2,015	2,015	25,00	50,375
	1+500	2,015	2,015	25,00	50,375
	1+525	2,015	2,015	25,00	50,375
	1+540	2,015	2,015	15,00	30,225
6	1+620	1,620			
	1+655	1,620	1,620	35,00	56,700
7	1+675	1,750			
	1+700	1,750	1,750	25,00	43,750
	1+725	1,750	1,750	25,00	43,750
	1+750	1,750	1,750	25,00	43,750
JUMLAH				**612,00**	**1.214,38**

Diketahui Oleh,	Diperiksa Oleh,	Dikerjakan Oleh,
Pihak Dinas PUPR Kab.Lutim	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
WA.Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
Staf Teknik	Inspector	Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

PROYEK : **PENINGKATAN JALAN KAWATA-LEDU-LEDU (POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN : GALIAN BATU LUNAK

NO	STA.	LUASAN	LUASAN RATA2	PANJANG	VOLUME GALIAN CADAS
7	1+750	1,750			
	1+775	1,750	1,750	25,00	43,750
	1+800	1,750	1,750	25,00	43,750
8	2+400	1,520			
	2+425	1,520	1,520	25,00	38,000
	2+450	1,520	1,520	25,00	38,000
	2+475	1,520	1,520	25,00	38,000
9	2+770	1,520			
	2+800	1,520	1,520	30,00	45,600
10	2+810	1,950			
	2+835	1,950	1,950	25,00	48,750
	2+860	1,950	1,950	25,00	48,750
	2+885	1,950	1,950	25,00	48,750
	2+910	1,950	1,950	25,00	48,750
	2+935	1,950	1,950	25,00	48,750
	3+000	1,950	1,950	65,00	126,750
11	3+150	1,890			
	3+175	1,890	1,890	25,00	47,250
	3+190	1,890	1,890	15,00	28,350
12	3+200	1,270			
	3+225	1,270	1,270	25,00	31,750
	3+250	1,270	1,270	25,00	31,750
13	3+275	1,065			
	3+300	1,065	1,065	25,00	26,625
	3+325	1,065	1,065	25,00	26,625
	3+350	1,065	1,065	25,00	26,625
	3+375	1,065	1,065	25,00	26,625
	3+400	1,065	1,065	25,00	26,625
JUMLAH				**560,00**	**889,82**

Diketahui Oleh,	Diperiksa Oleh,	Dikerjakan Oleh,
Pihak Dinas PUPR Kab.Lutim	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
WA.Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
Staf Teknik	Inspector	Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

PROYEK : **PENINGKATAN JALAN KAWATA-LEDU-LEDU (POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN : GALIAN BATU LUNAK

NO	STA.	LUASAN	LUASAN RATA2	PANJANG	VOLUME GALIAN CADAS
14	3+508	1,680			
			1,680	17,00	28,560
	3+525	1,680			
			1,680	25,00	42,000
	3+550	1,680			
			1,680	25,00	42,000
	3+575	1,680			
			1,680	25,00	42,000
	3+600	1,680			
15	3+610	1,230			
			1,230	15,00	18,450
	3+625	1,230			
			1,230	25,00	30,750
	3+650	1,230			
			1,230	25,00	30,750
	3+675	1,230			
			1,230	25,00	30,750
	3+700	1,230			
			1,230	25,00	30,750
	3+725	1,230			
			1,230	25,00	30,750
	3+750	1,230			
16	3+820	1,280			
			1,280	25,00	32,000
	3+845	1,280			
			1,280	5,00	6,400
	3+850	1,280			
JUMLAH				**262,00**	**365,16**

Diketahui Oleh,	Diperiksa Oleh,	Dikerjakan Oleh,
Pihak Dinas PUPR Kab.Lutim	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
WA.Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
Staf Teknik	Inspector	Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

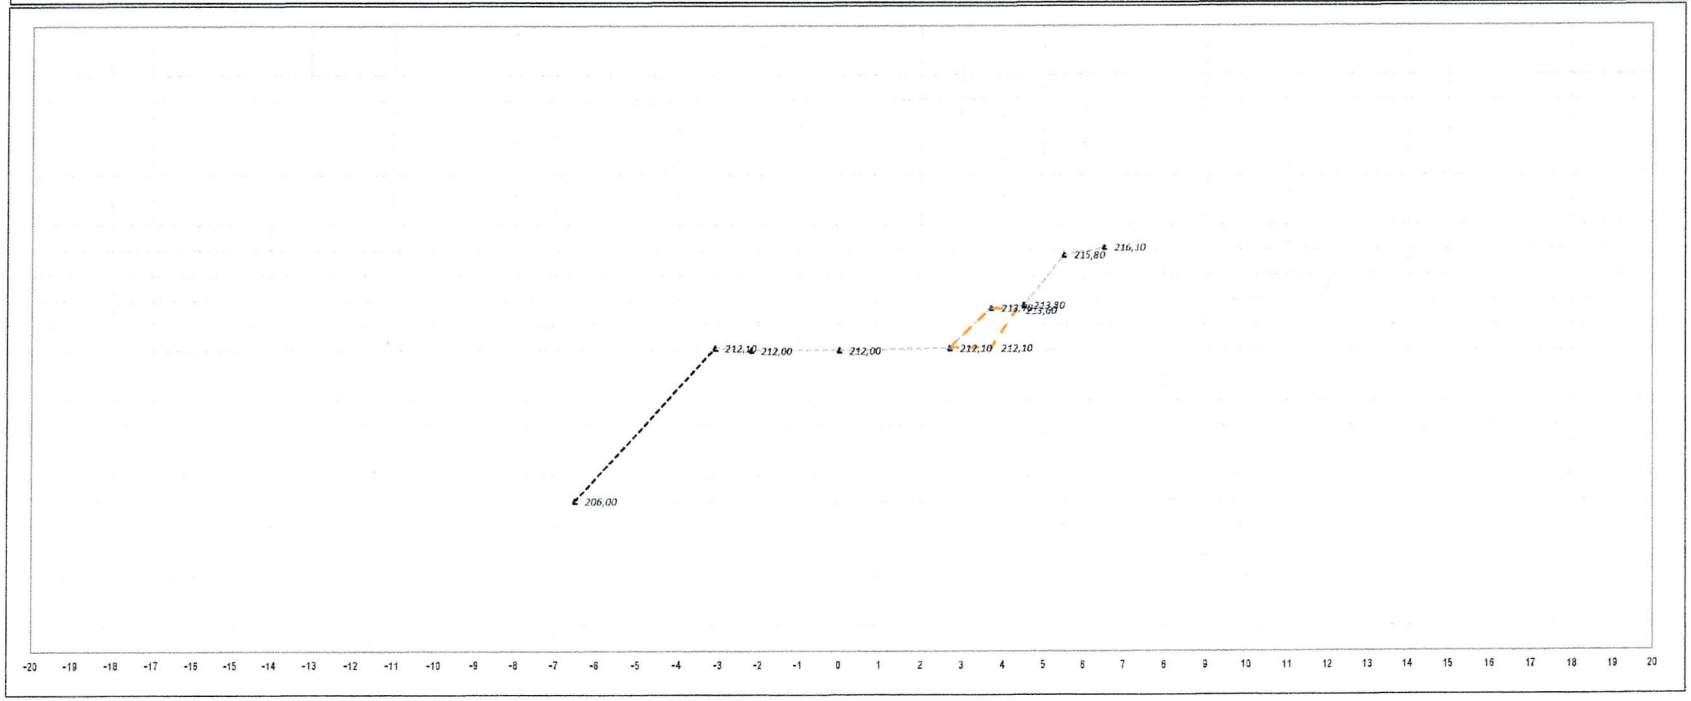

STA.	3 + 820	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,10	-2,20	0,00	2,70	3,70	4,50	5,50	6,50											
	Y													206,00	212,10	212,00	212,00	212,10	213,70	213,80	215,80	216,10											
GALIAN	X																2,70	2,70	3,70	4,30	3,70	2,70											1,280
	Y																212,10	212,10	212,10	213,60	213,70	212,10											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573	785	912	790	577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.636,78
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573	573	790	919	785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.639,34

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hengdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

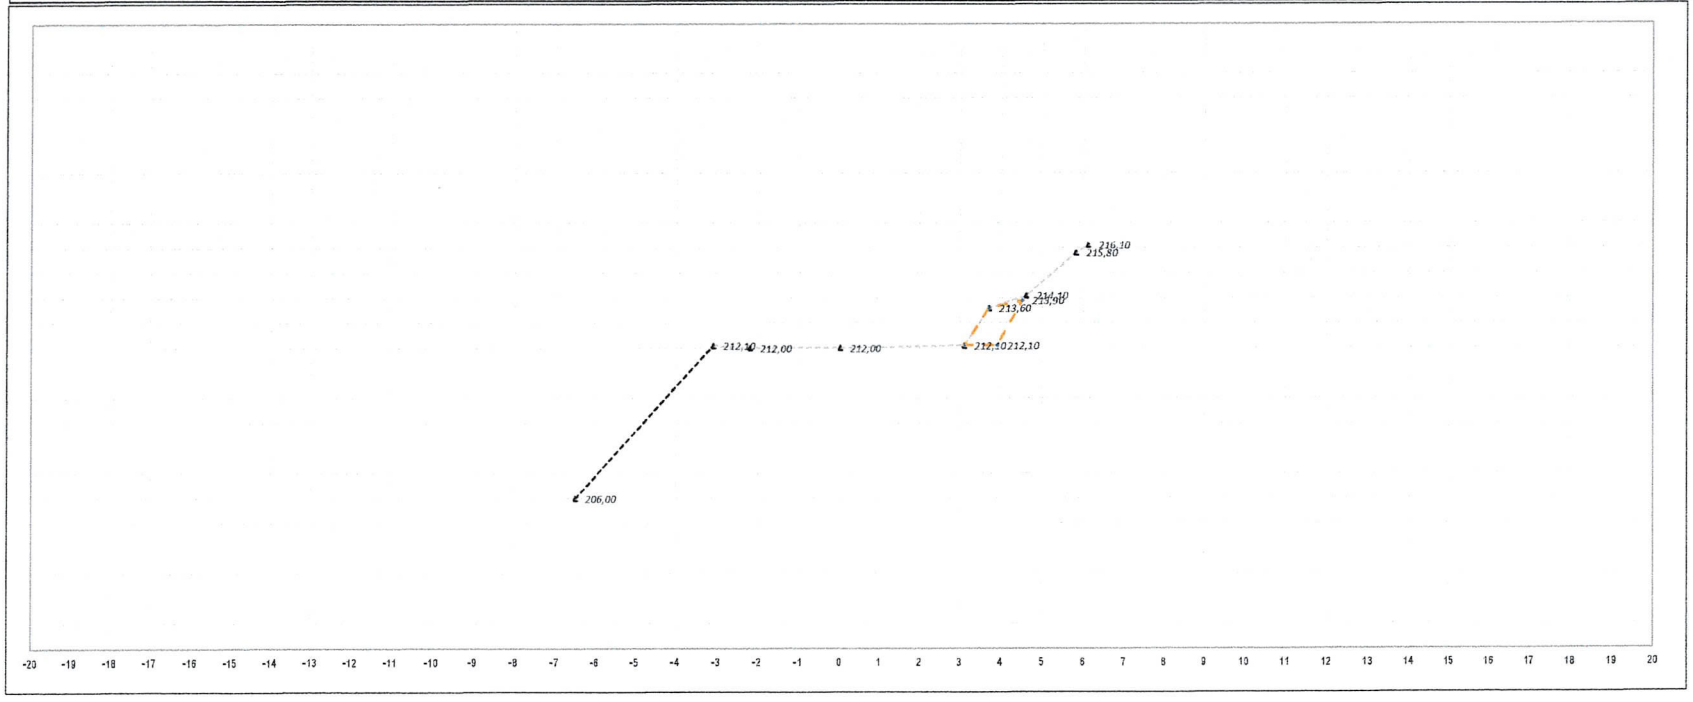

STA.	3 + 508	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,10	-2,20	0,00	3,10	3,70	4,60	5,80	6,10											
	Y													206,00	212,10	212,00	212,00	212,10	213,60	214,10	215,80	216,10											
GALIAN	X																3,10	3,10	3,90	4,50	3,70	3,10											1,230
	Y																212,10	212,10	212,10	213,90	213,60	212,10											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658	827	954	791	662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.892,74
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658	658	834	961	785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.895,20

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

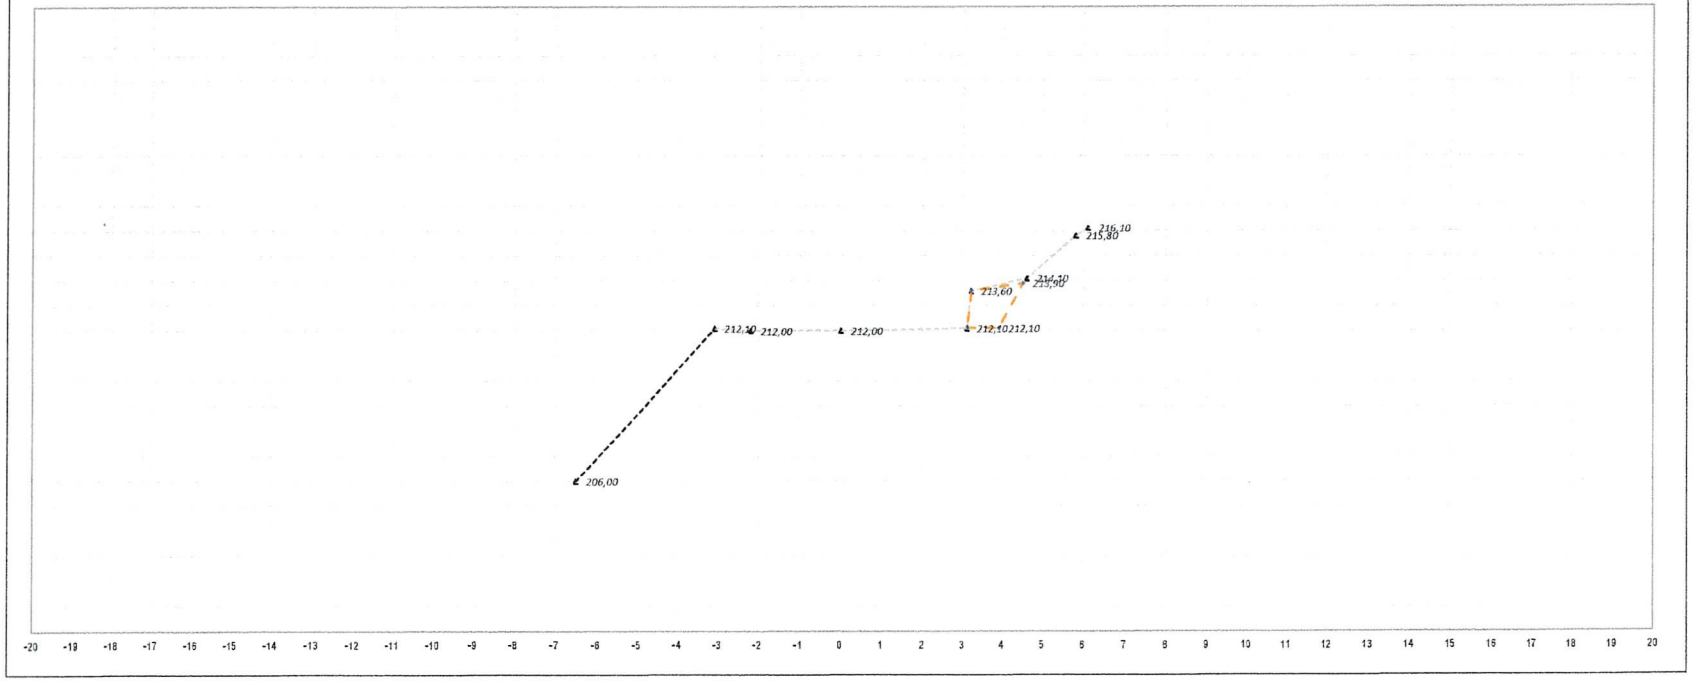

STA.	3 + 508	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,10	-2,20	0,00	3,10	3,20	4,60	5,80	6,10											
	Y													206,00	212,10	212,00	**212,00**	212,10	213,60	214,10	215,80	216,10											
GALIAN	X																3,10	3,10	3,90	4,50	3,20	3,10											1,680
	Y																212,10	212,10	212,10	213,90	213,60	212,10											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658	827	954	684	662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.785,79
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658	658	834	961	679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.789,15

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asmo Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

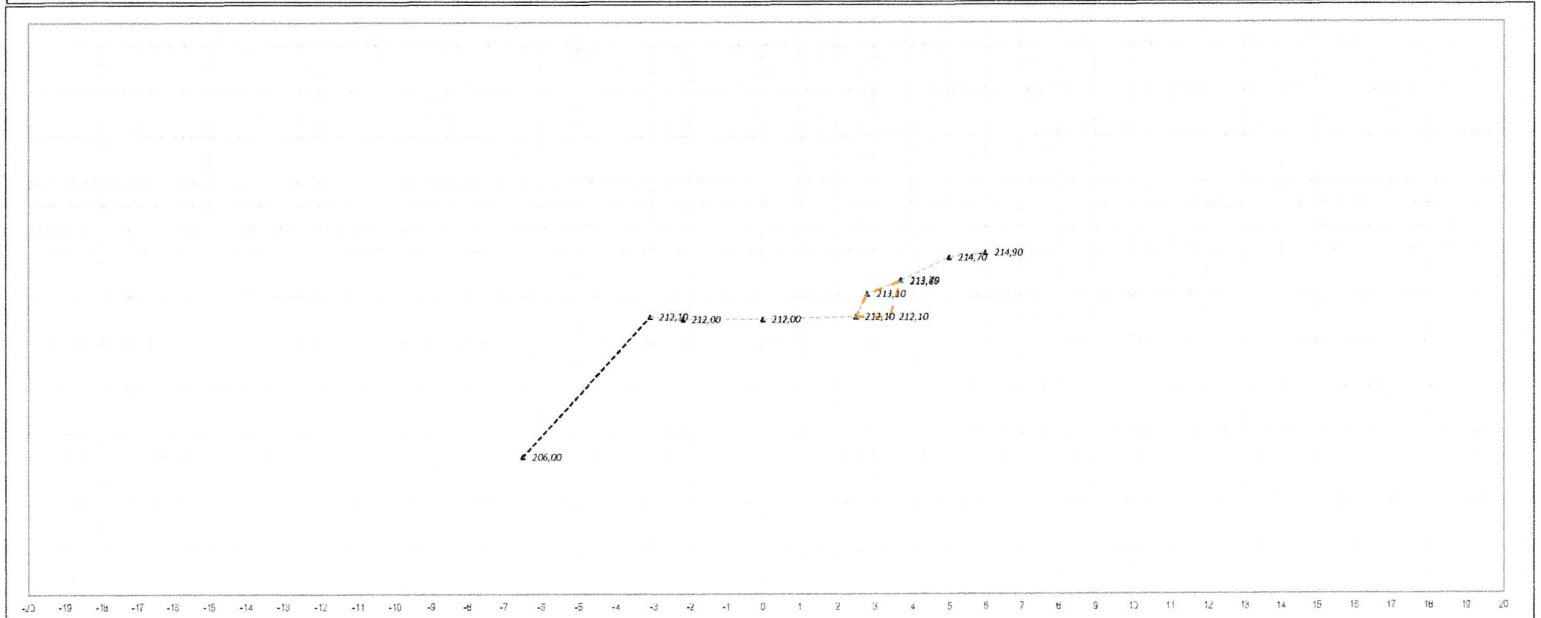

STA.	3 + 275	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,10	-2,20	0,00	2,50	2,80	3,70	5,00	6,00											
	Y													206,00	212,10	212,00	212,00	212,10	213,10	213,70	214,70	214,90											
GALIAN	X																2,50	2,50	3,40	3,70	2,80	2,50											1,065
	Y																212,10	212,10	212,10	213,65	213,10	212,10											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530	721	785	598	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.167,13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530	530	726	788	594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.169,26

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Anna Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sugirmono, ST
Pelaksana

BINTAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

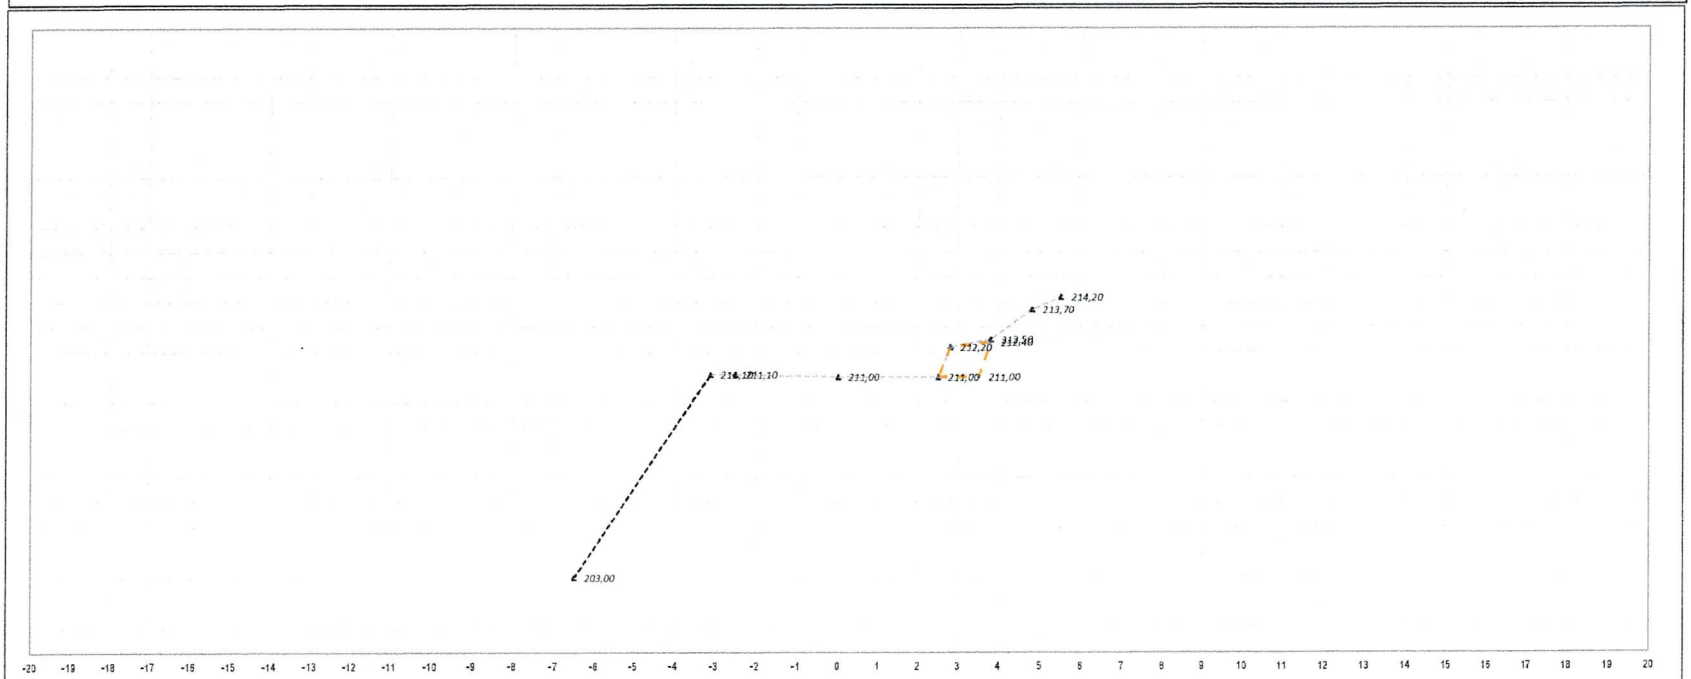

STA.	3 + 200	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,10	-2,50	0,00	2,50	2,80	3,80	4,80	5,50											
	Y													203,00	211,10	211,10	**211,00**	211,00	212,20	212,50	213,70	214,20											
GALIAN	X																2,50	2,50	3,50	3,80	2,80	2,50											1,270
	Y																211,00	211,00	211,00	212,40	212,20	211,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528	739	802	595	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.193,02
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528	528	743	806	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.195,56

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sugiyono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

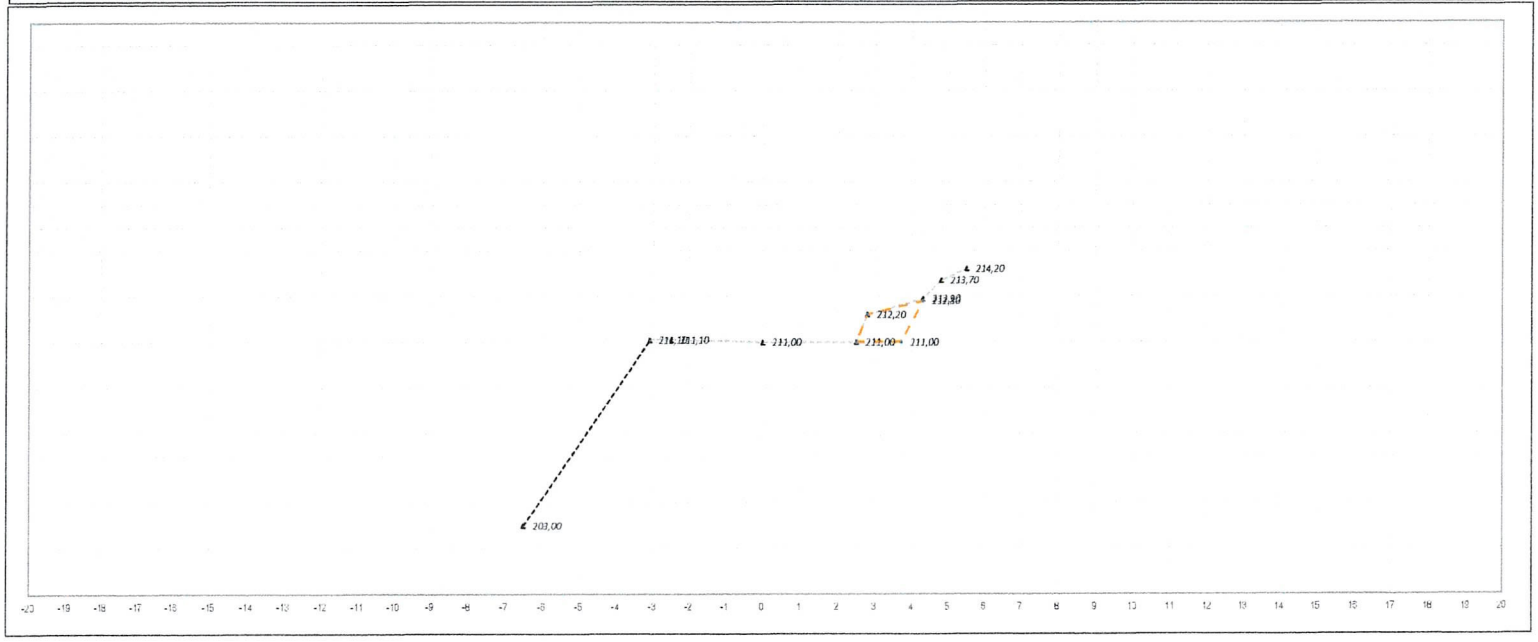

STA.	3 + 150	KOORDINAT CROSS SECTION																														Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,10	-2,50	0,00	2,50	2,80	4,30	4,80	5,50										
	Y													203,00	211,10	211,10	211,00	211,00	212,20	212,90	213,70	214.20										
GALIAN	X																2,50	2,50	3,70	4,30	2,80	2,50										1,890
	Y																211,00	211,00	211,00	212,80	212,20	211,00										
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528	781	907	596	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.341,84
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528	528	787	912	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.345,62

Pihak Dinas PUPR
Bidang Binamarga
Pengawas Lapangan

WA Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

NUSANTARA

Alma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

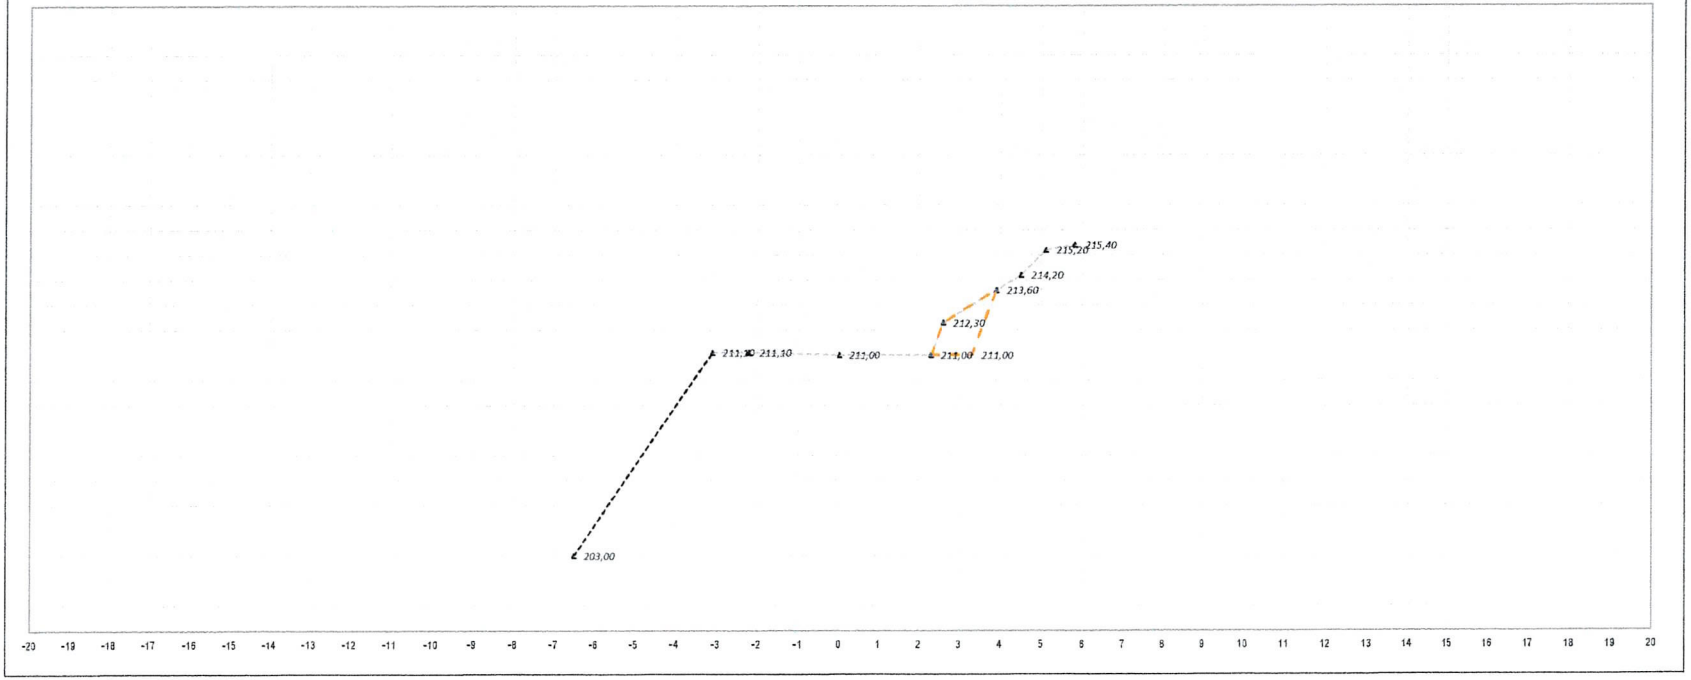

STA.	2 + 810	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,10	-2,20	0,00	2,30	2,60	3,90	4,50	5,10	5,80										
	Y													203,00	211,10	211,10	211,00	211,00	212,30	213,60	214,20	215,20	215,40										
GALIAN	X																2,30	2,30	3,30	3,90	2,60	2,30											1,950
	Y																211,00	211,00	211,00	213,60	212,30	211,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485	696	823	555	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.048,15
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485	485	705	828	549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.052,05

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hanpdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

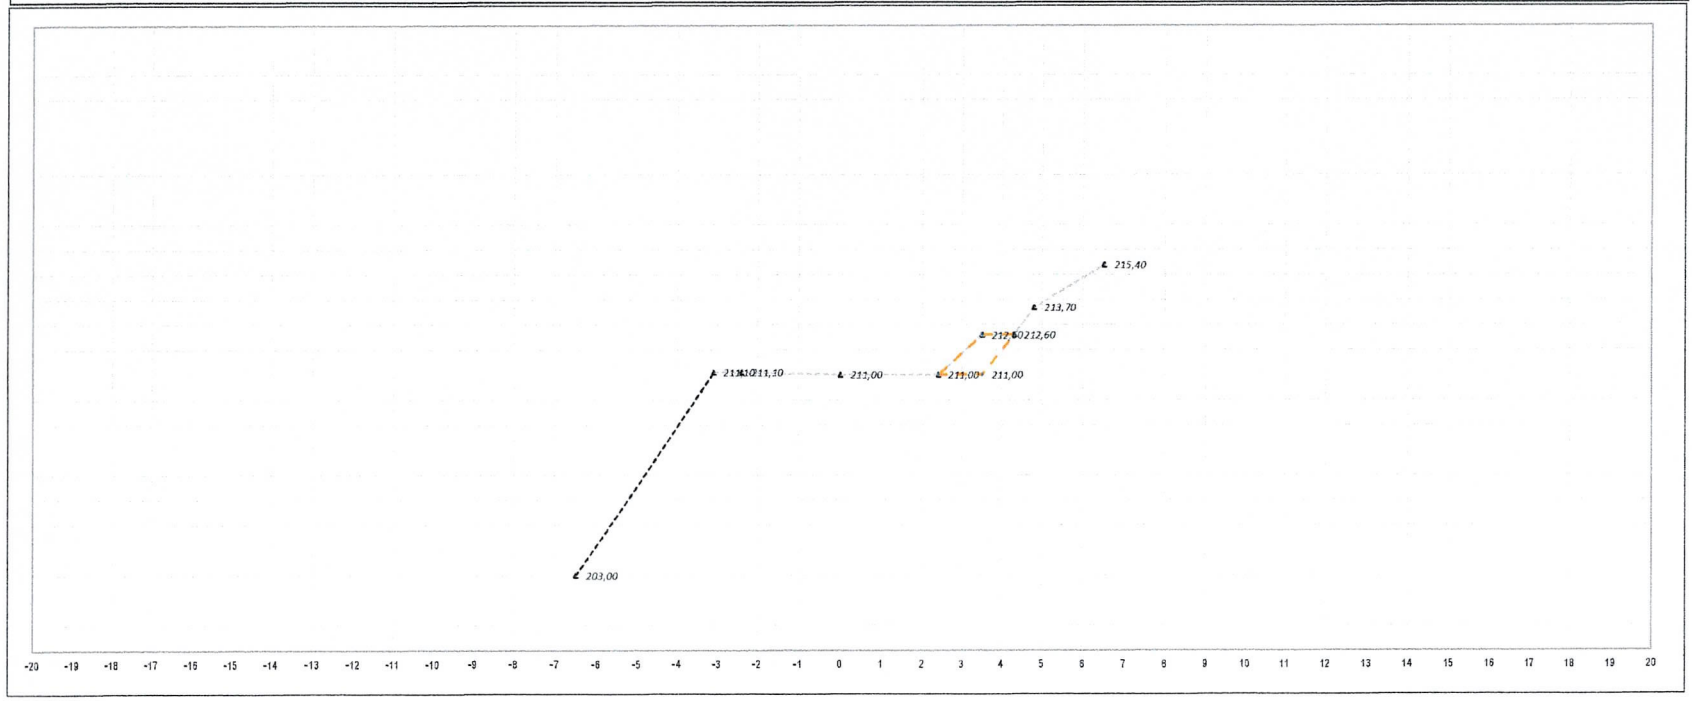

STA.	2 + 400	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,10	-2,40	0,00	2,40	3,50	4,30	4,80	6,50											
	Y													203,00	211,10	211,10	**211,00**	211,00	212,60	212,60	213,70	215,40											
GALIAN	X																2,40	2,40	3,50	4,30	3,50	2,40											1,520
	Y																211,00	211,00	211,00	212,60	212,60	211,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506	739	907	744	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.406,54
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506	506	744	914	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.409,58

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sugimono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

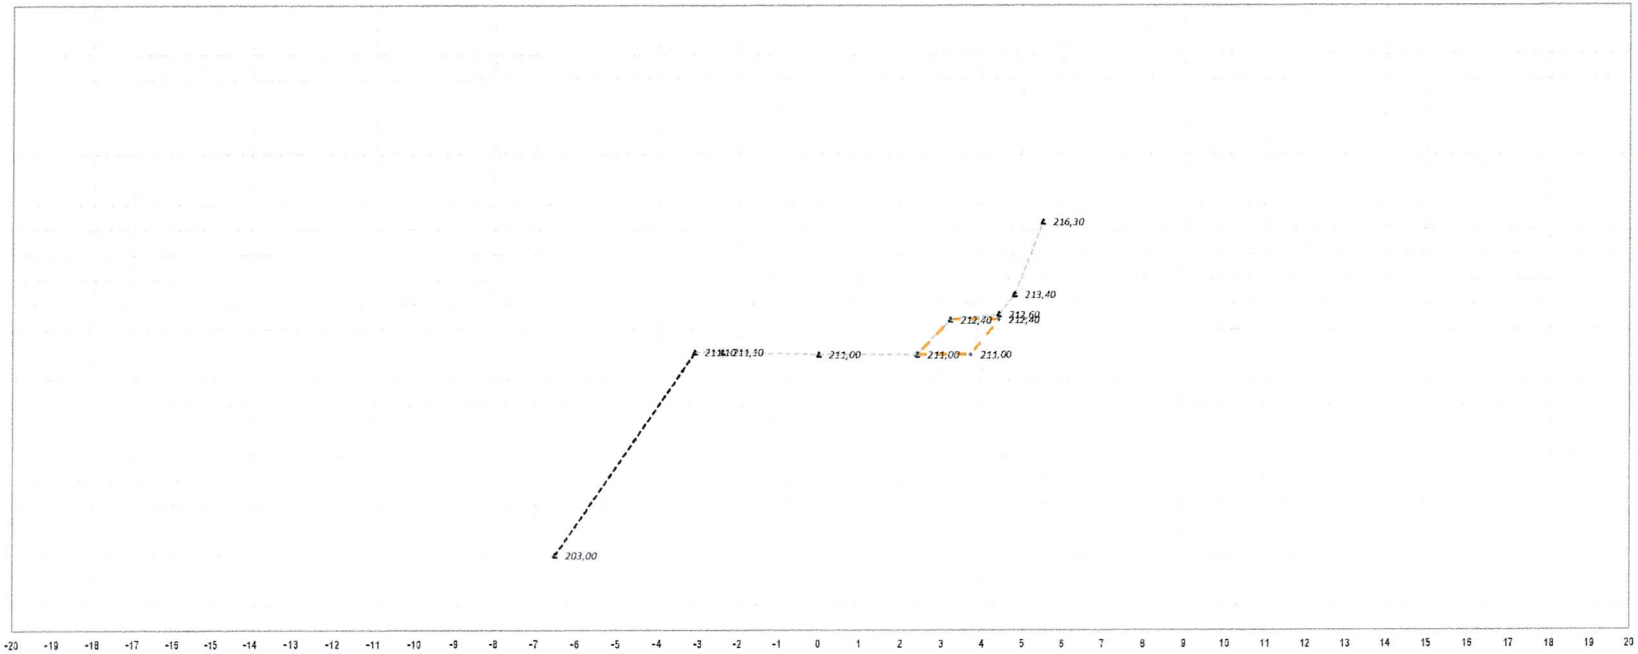

STA.	1 + 675	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,10	-2,40	0,00	2,40	3,20	4,40	4,80	5,50											
	Y													203,00	211,10	211,10	**211,00**	211,00	212,40	212,60	213,40	216,30											
GALIAN	X																2,40	2,40	3,70	4,40	3,20	2,40											1,750
	Y																211,00	211,00	211,00	212,40	212,40	211,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506	781	928	680	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.404,94
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506	506	786	935	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.408,44

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hanggika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

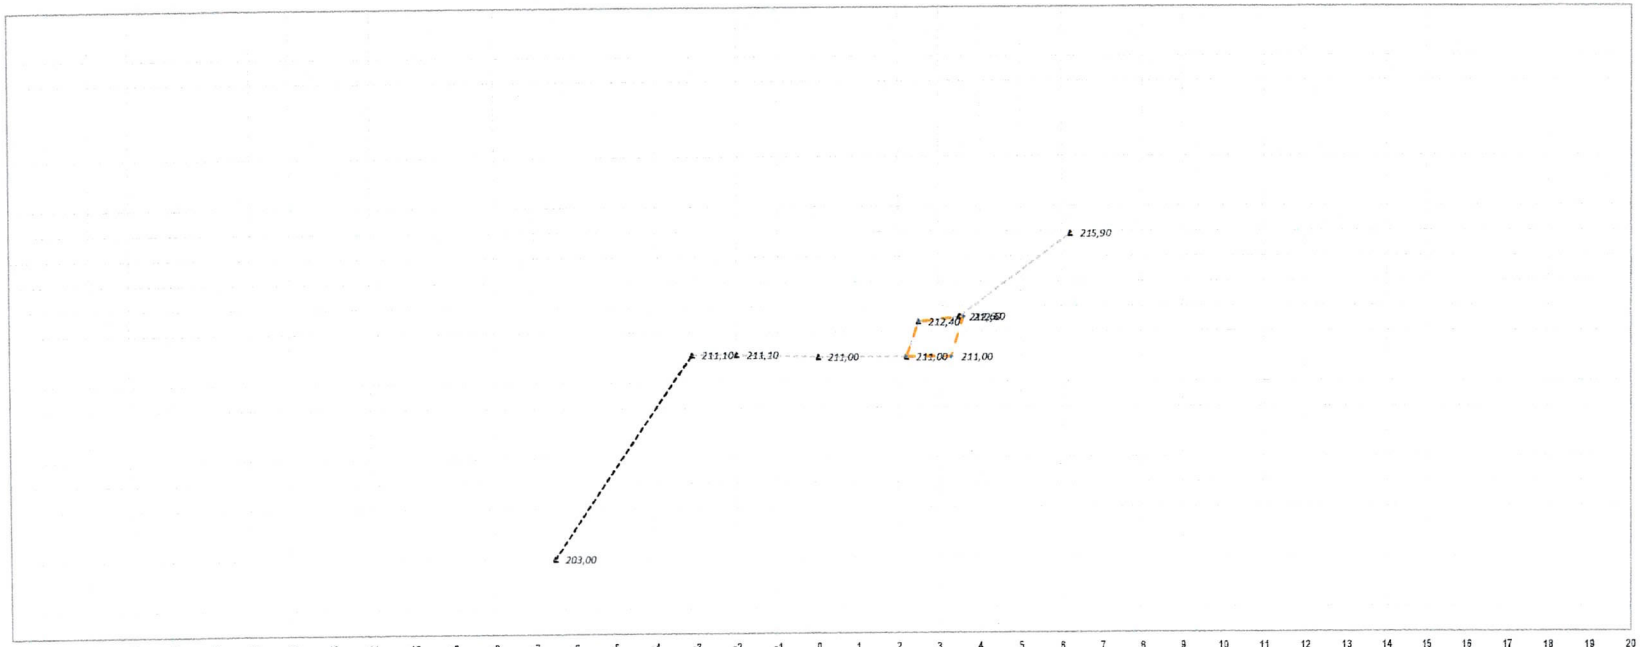

STA.	1 + 620	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,10	-2,00	0,00	2,20	2,50	3,50	6,20												
	Y													203,00	211,10	211,10	211,00	211,00	212,40	212,60	215,90												
GALIAN	X																2,20	2,20	3,30	3,60	2,50	2,20											1,620
	Y																211,00	211,00	211,00	212,60	212,40	211,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464	696	760	532	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.918,88
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464	464	702	765	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.922,12

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Nanadika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

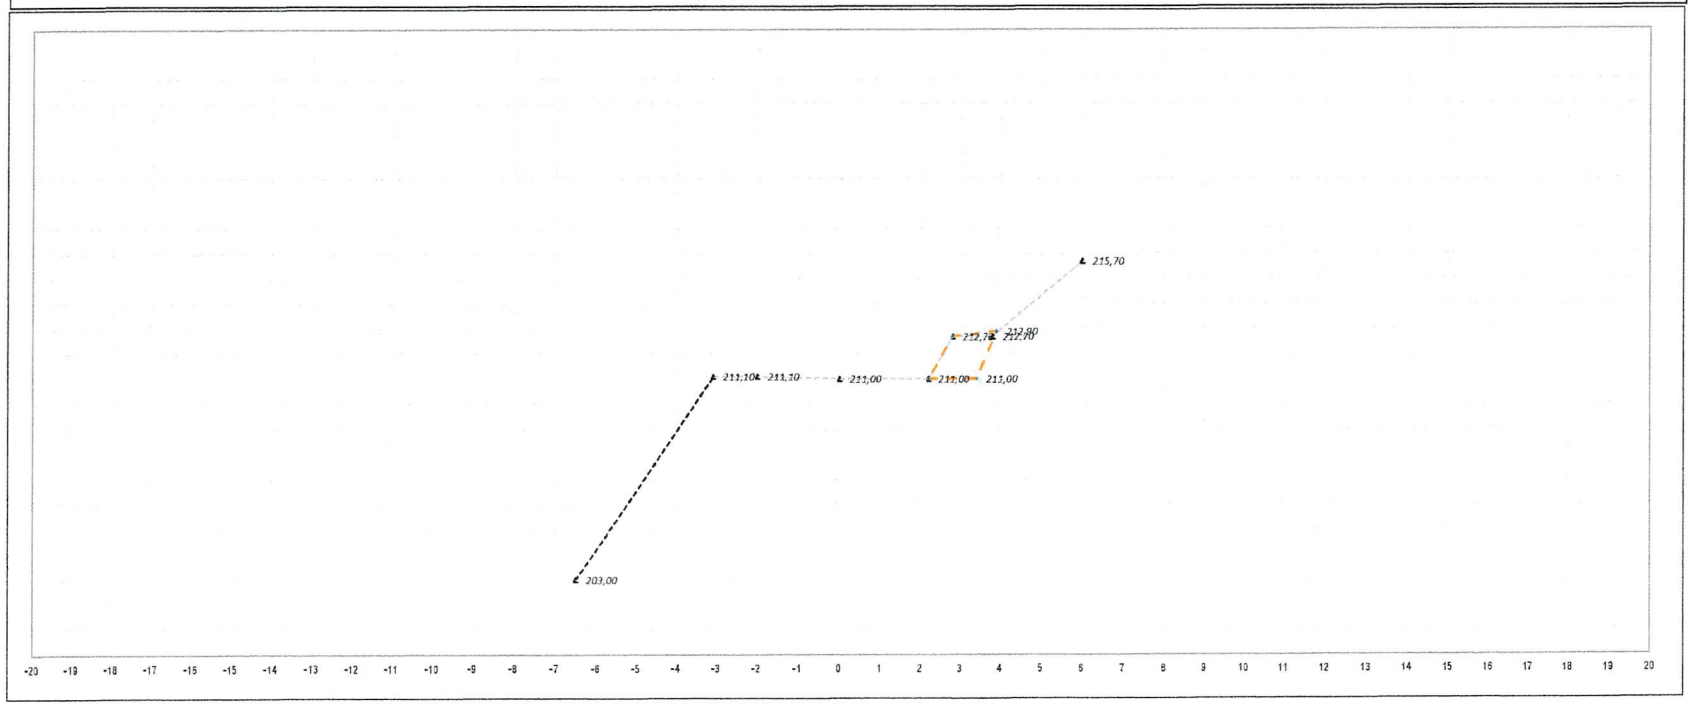

STA.	3 + 000	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,10	-2,00	0,00	2,20	2,80	3,80	6,00												
	Y													203,00	211,10	211,10	211,00	211,00	212,70	212,70	215,70												
GALIAN	X																2,20	2,20	3,40	3,90	2,80	2,20											2,015
	Y																211,00	211,00	211,00	212,90	212,70	211,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464	717	823	596	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.068,56
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464	464	724	830	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.072,59

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA. Hanggika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sugiarmoto, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

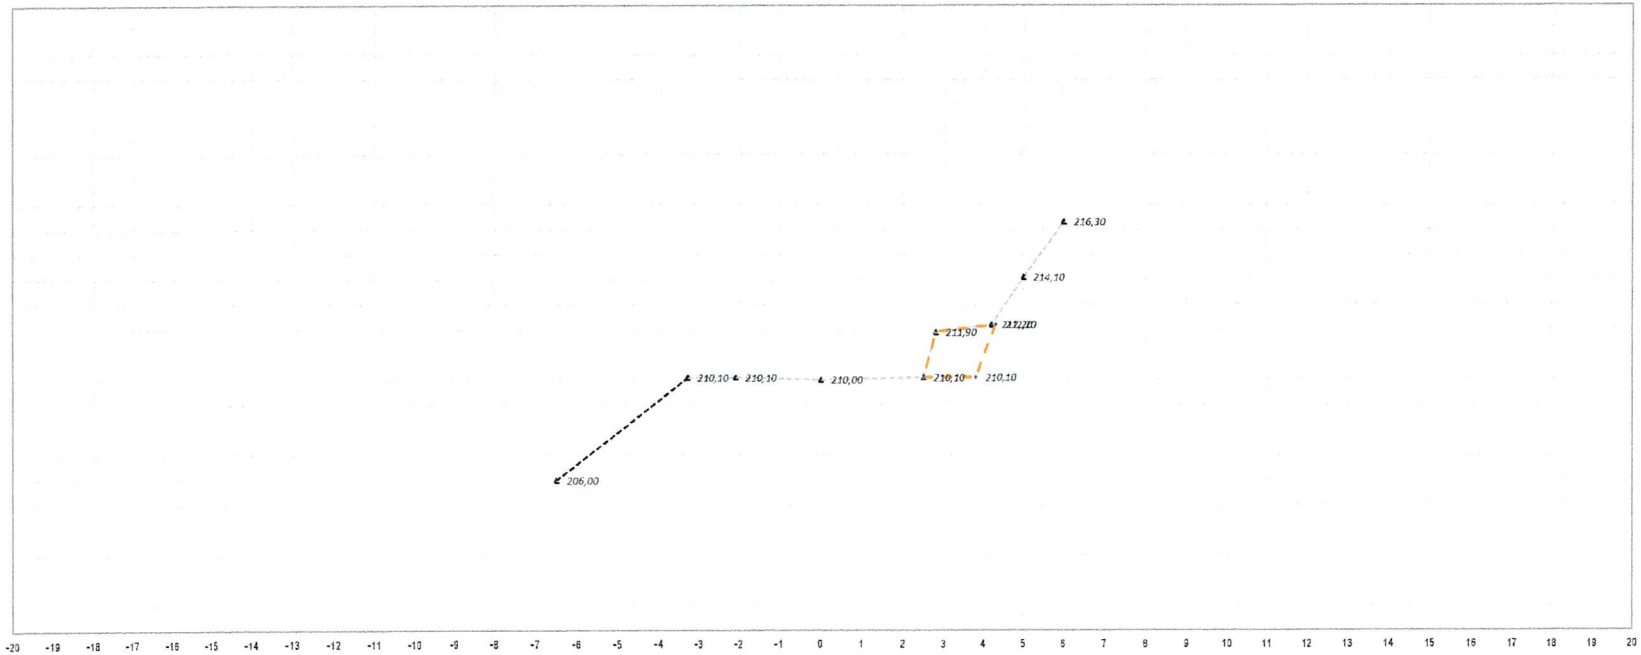

STA.	2 + 980	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,30	-2,10	0,00	2,50	2,80	4,20	5,00	6,00											
	Y													206,00	210,10	210,10	**210,00**	210,10	211,90	212,20	214,10	216,30											
GALIAN	X																2,50	2,50	3,80	4,30	2,80	2,50											2,670
	Y																210,10	210,10	210,10	212,20	211,90	210,10											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525	798	903	594	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.350,97
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525	525	806	911	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.356,31

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.bangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

PT.STAR MITRA SULAWESI

NUSANTARA

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

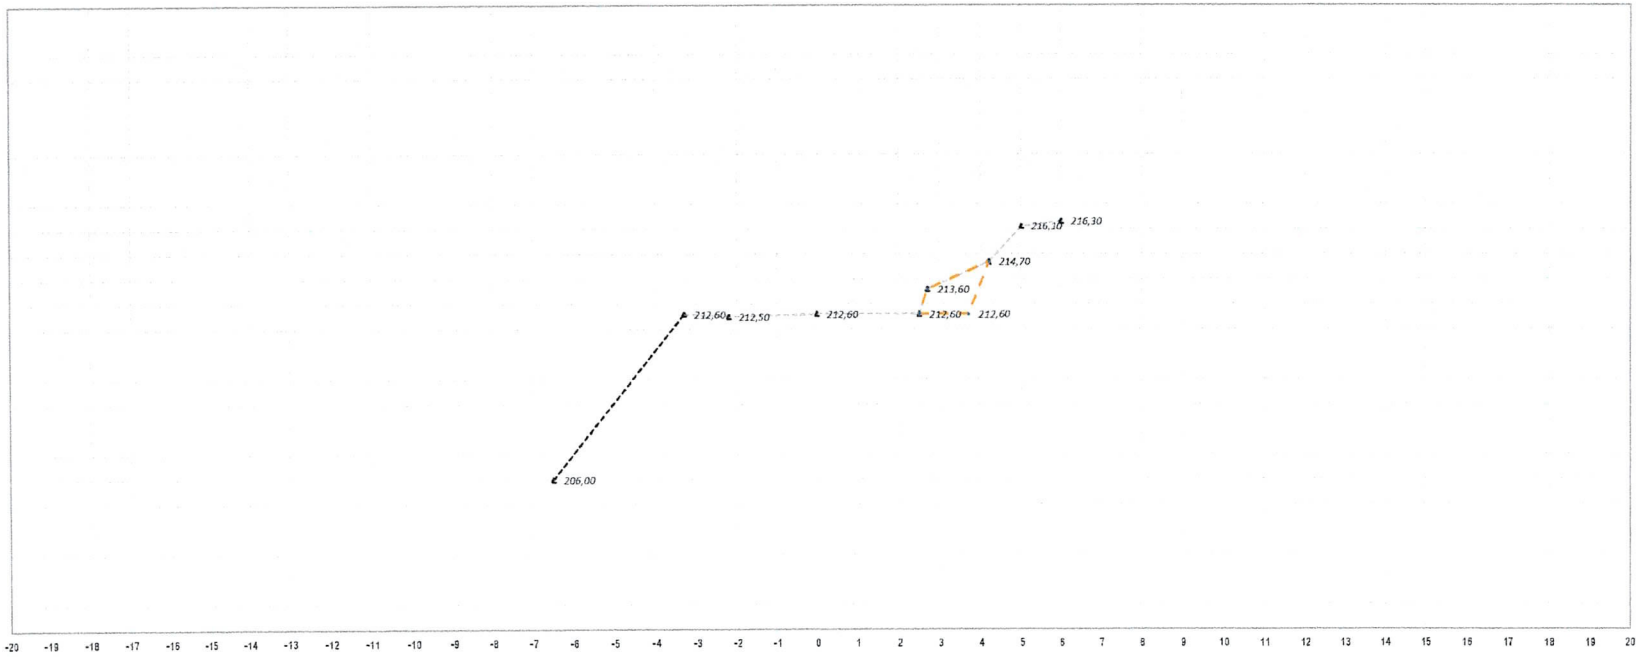

STA.	2 + 950	KOORDINAT CROSS SECTION																																Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,30	-2,20	0,00	2,50	2,70	4,20	5,00	6,00												
	Y													206,00	212,60	212,50	212,60	212,60	213,60	214,70	216,10	216,30												
GALIAN	X																2,50	2,50	3,70	4,20	2,70	2,50												1,900
	Y																212,60	212,60	212,60	214,70	213,60	212,60												
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532	787	893	580	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.324,73
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532	532	794	897	574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.328,53

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

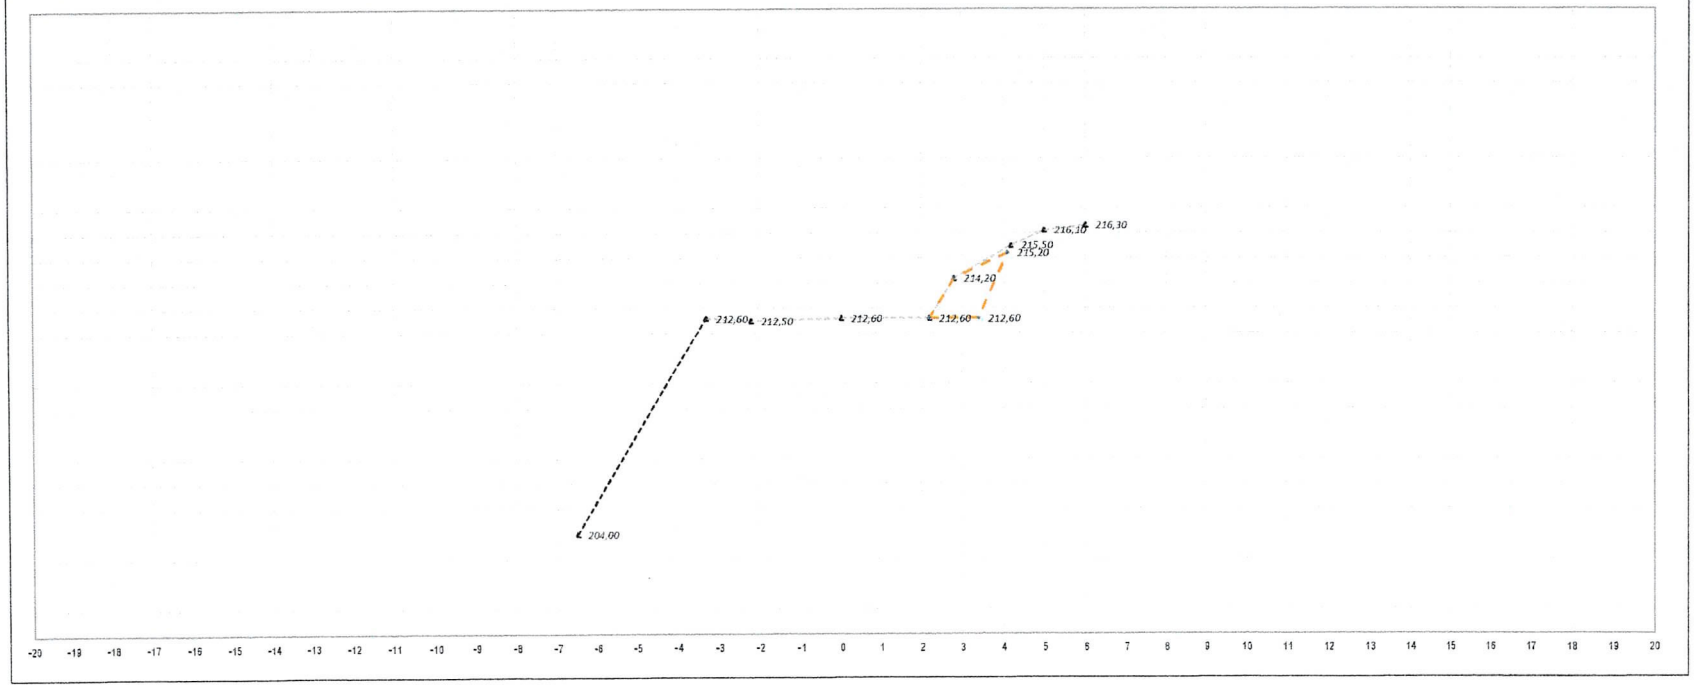

STA.	2 + 900	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,30	-2,20	0,00	2,20	2,80	4,20	5,00	6,00												
	Y													204,00	212,60	212,50	212,60	212,60	214,20	215,50	216,10	216,30												
GALIAN	X																2,20	2,20	3,40	4,10	2,80	2,20											2,300
	Y																212,60	212,60	212,60	215,20	214,20	212,60											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468	723	872	603	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.136,02
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468	468	732	878	595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.140,62

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA Hanggika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

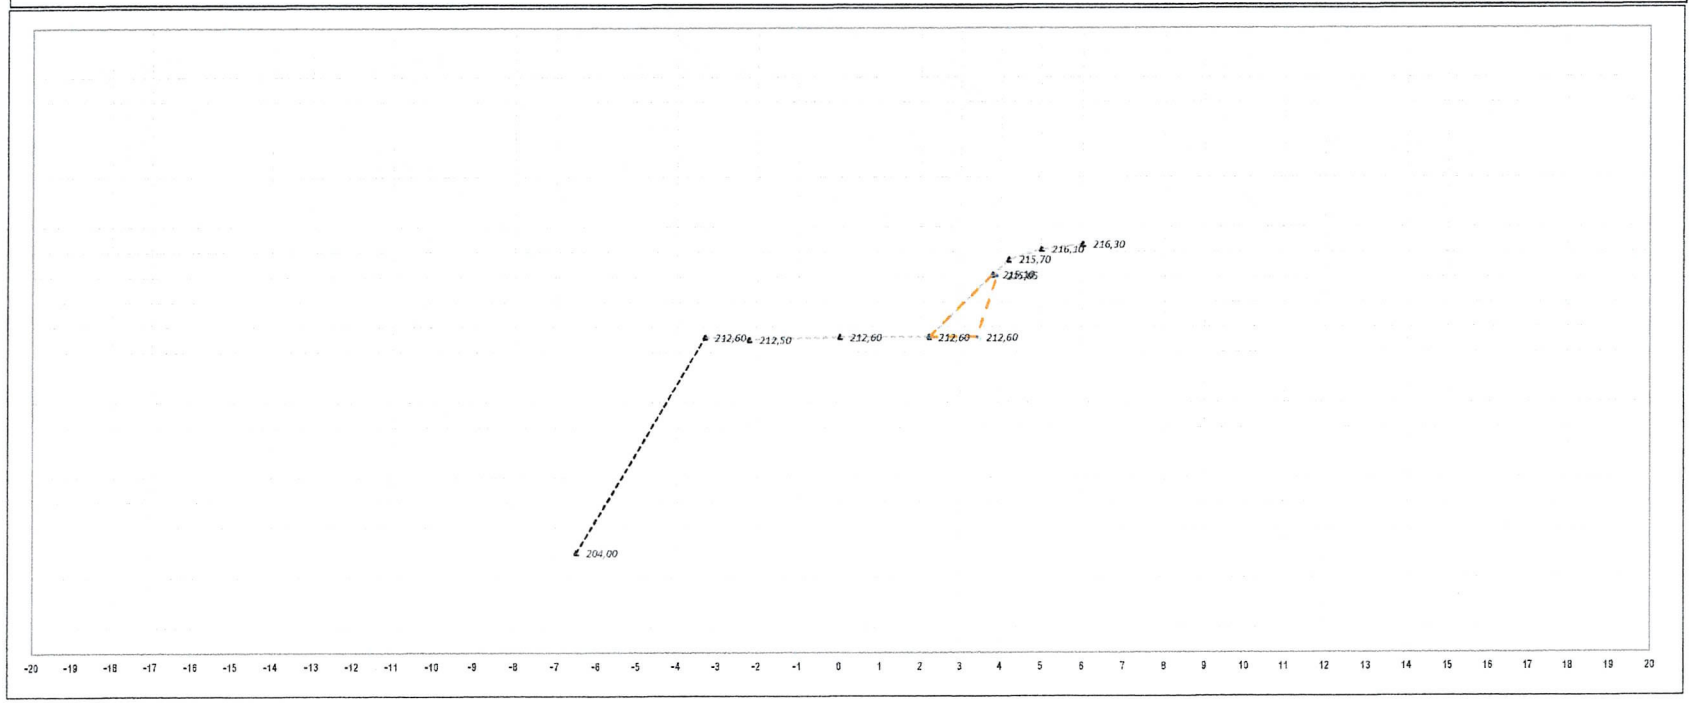

STA.	1 + 000	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,30	-2,20	0,00	2,20	3,80	4,20	5,00	6,00												
	Y													204,00	212,60	212,50	212,60	212,60	215,10	215,70	216,10	216,30											
GALIAN	X																2,20	2,20	3,40	3,90	3,80	2,20											1,635
	Y																212,60	212,60	212,60	215,05	215,10	212,60											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468	723	829	817	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.310,11
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468	468	731	839	808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.313,38

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hanodika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Galian Batu**
SATUAN : m3
NO. DIV. : 3.1.(3)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+970	*s.d*	2+374	Kanan	94.5	244.98	244.98	
2	2+450	*s.d*	3+851	Kanan	229.3	570.25	570.25	
JUMLAH					**323.8**	**815.23**	**815.23**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	-	m3
VOLUME USULAN CCO	.....	812.73	m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m3
MC UNTUK BULAN INI	.....	812.73	m3
MC SD BULAN INI	.....	812.73	m3
SISA VOLUME	.....	-	m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
SULAN, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

PROYEK : **PENINGKATAN JALAN KAWATA-LEDU-LEDU (POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN : GALIAN BATU

NO	STA.	LUASAN	LUASAN RATA2	PANJANG	VOLUME GALIAN BATU
1	0+970	1,920	1,920	2,50	4,800
	0+973	1,920			
2	1+120	2,850	2,850	3,00	8,550
	1+123	2,850			
3	1+250	2,873	2,873	3,00	8,618
	1+253	2,873			
4	1+300	3,230	3,230	4,00	12,920
	1+304	3,230			
5	1+350	2,148	2,148	25,00	53,688
	1+375	2,148			
6	1+542	2,520	2,520	4,00	10,080
	1+546	2,520			
7	1+610	3,395	3,395	6,00	20,370
	1+616	3,395			
8	1+655	2,715	2,715	10,00	27,150
	1+665	2,715			
9	1+800	2,523	2,523	30,00	75,675
	1+830	2,523			
10	1+902	1,915	1,915	3,00	5,745
	1+905	1,915			
11	2+370	3,845	3,845	4,00	15,380
	2+374	3,845			
JUMLAH				**94,50**	**244,98**

Diketahui Oleh,	Diperiksa Oleh,	Dikerjakan Oleh,
Pihak Dinas PUPR Kab.Lutim	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW.Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono,ST
Staf Teknik	Inspector	Pelaksana

PT.STAR MITRA SULAWESI

CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

PROYEK : **PENINGKATAN JALAN KAWATA-LEDU-LEDU (POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN : GALIAN BATU

NO	STA.	LUASAN	LUASAN RATA2	PANJANG	VOLUME GALIAN BATU
12	2+450	2,163	2,163	6,00	12,975
	2+456	2,163			
13	2+500	2,130	2,130	7,00	14,910
	2+507	2,130			
14	2+750	3,565	3,565	11,00	39,215
	2+761	3,565			
15	2+800	2,930	2,930	8,00	23,440
	2+808	2,930			
16	3+000	2,210	2,210	50,00	110,500
	3+050	2,210	2,210	50,00	110,500
	3+100	2,210	2,210	50,00	110,500
	3+150	2,210			
17	3+190	1,900	1,900	4,00	7,600
	3+194	1,900			
18	3+250	2,560	2,560	6,00	15,360
	3+256	2,560			
19	3+500	2,805	2,805	6,50	18,232
	3+507	2,805			
20	3+600	3,005	3,005	10,80	32,454
	3+611	3,005			
21	3+800	3,680	3,680	17,00	62,560
	3+817	3,680			
22	3+848	3,335	3,335	3,00	10,005
	3+851	3,335			
JUMLAH				**229,30**	**570,25**

Diketahui Oleh,	Diperiksa Oleh,	Dikerjakan Oleh,
Pihak Dinas PUPR Kab.Lutim	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW.Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono,ST
Staf Teknik	Inspector	Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

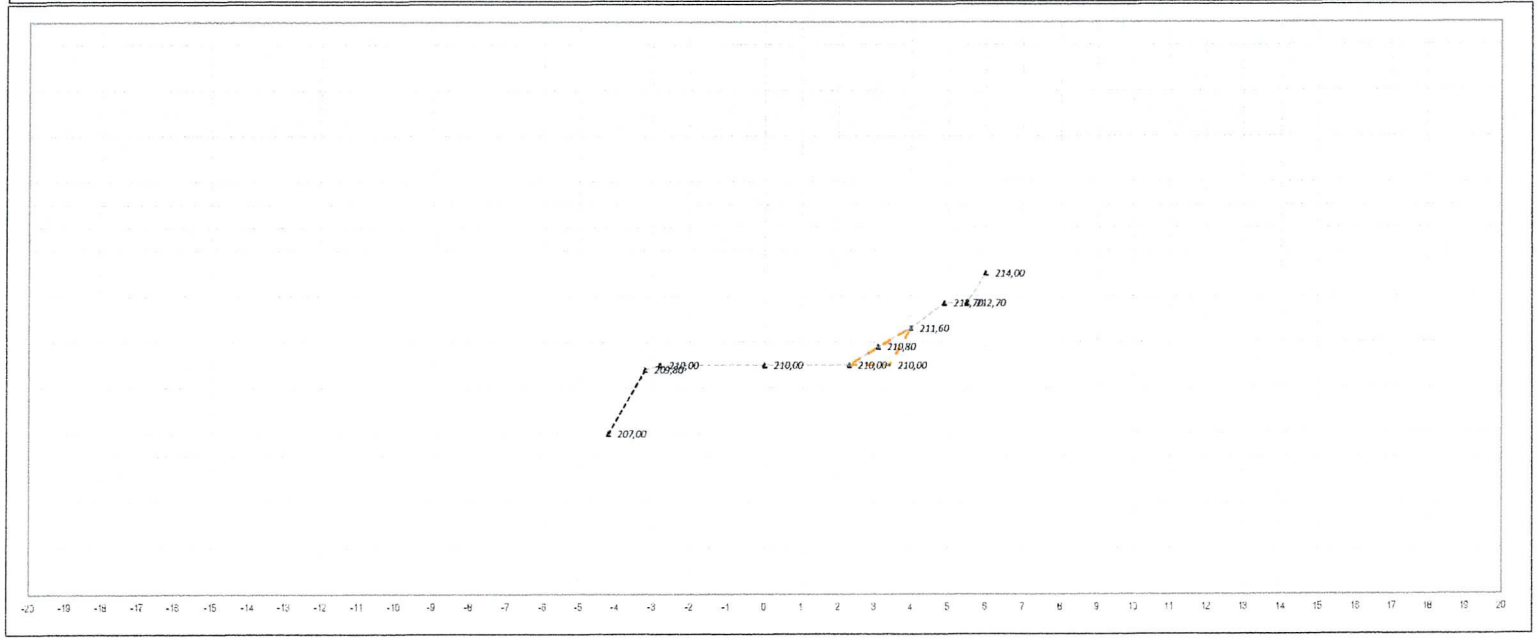

STA.	0 + 970	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,20	-3,20	-2,80	0,00	2,30	3,10	4,00	4,90	5,50	6,00										
	Y													207,00	209,80	210,00	210,00	210,00	210,80	211,60	212,70	212,70	214,00										
GALIAN	X																2,30	2,30	3,40	4,00	3,10	2,30											1,920
	Y																210,00	210,00	210,00	211,60	210,80	210,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483	714	840	656	485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.177,80
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483	483	719	843	651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.179,64

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Manodika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sugarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

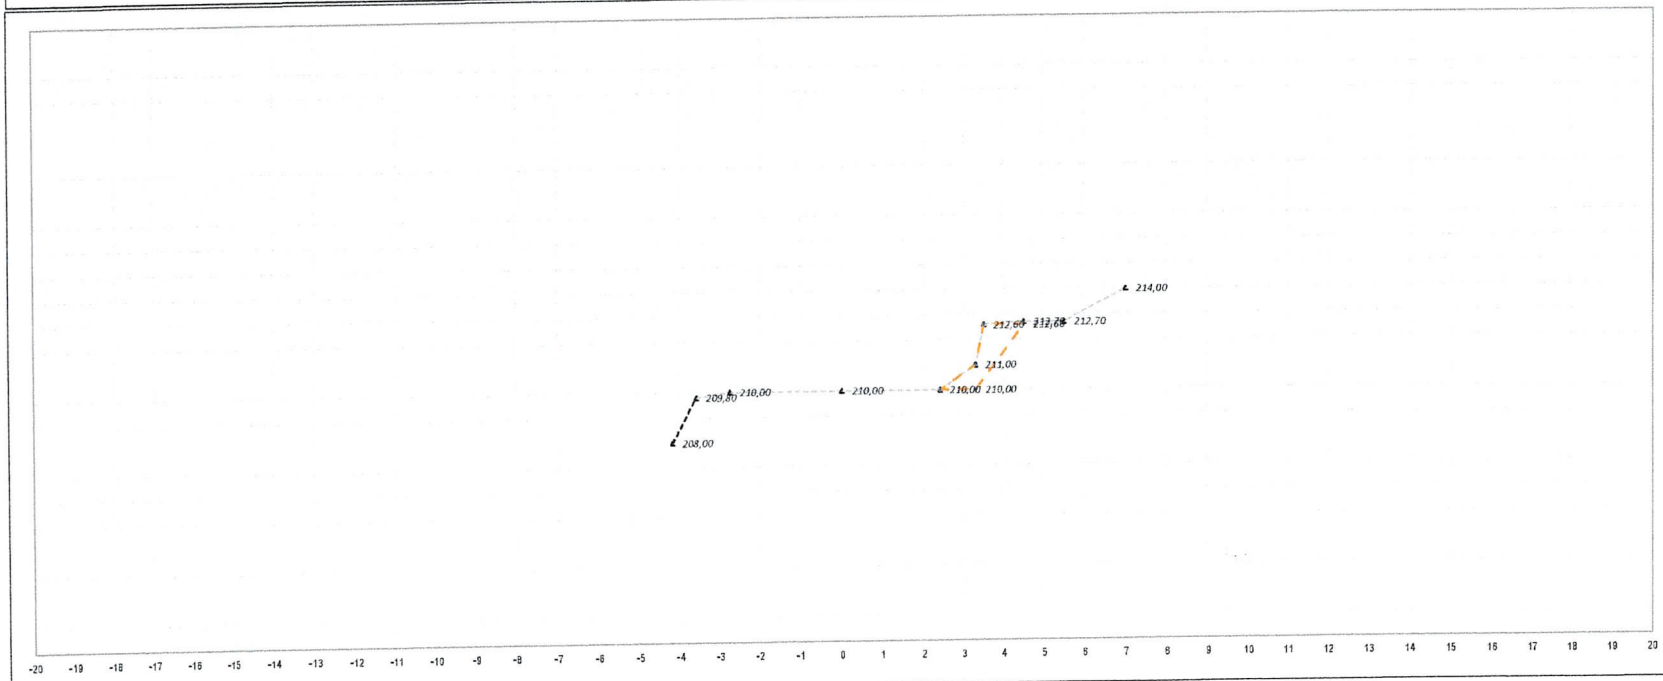

STA.	1 + 122	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,20	-3,60	-2,75	0,00	2,40	3,30	3,50	4,50	5,50	7,00										
	Y													208,00	209,80	210,00	210,00	210,00	211,00	212,60	212,70	212,70	214,00										
GALIAN	X																2,40	2,40	3,30	4,50	3,50	3,30	2,40										2,850
	Y																210,00	210,00	210,00	212,60	212,60	211,00	210,00										
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	693	945	744	702	506	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.094,08
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	504	702	957	739	693	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.097,78

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

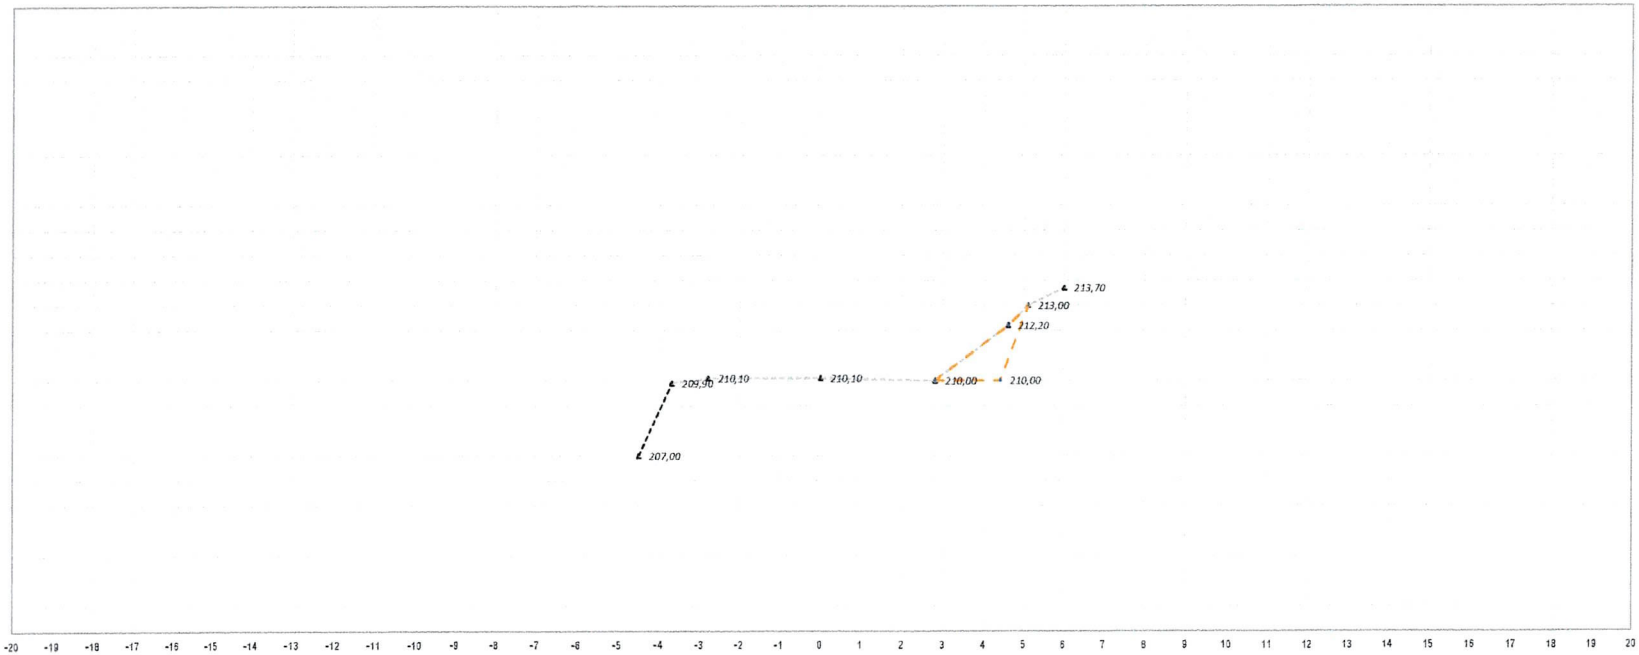

STA.	1 + 300	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,50	-3,70	-2,80	0,00	2,80	4,60	5,10	6,00												
	Y													207,00	209,90	210,10	210,10	210,00	212,20	213,00	213,70												
GALIAN	X																2,80	4,40	5,10	4,60	2,80												3,230
	Y																210,00	210,00	213,00	212,20	210,00												
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924	1.071	980	594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.568,96
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588	937	1.082	966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.573,42

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

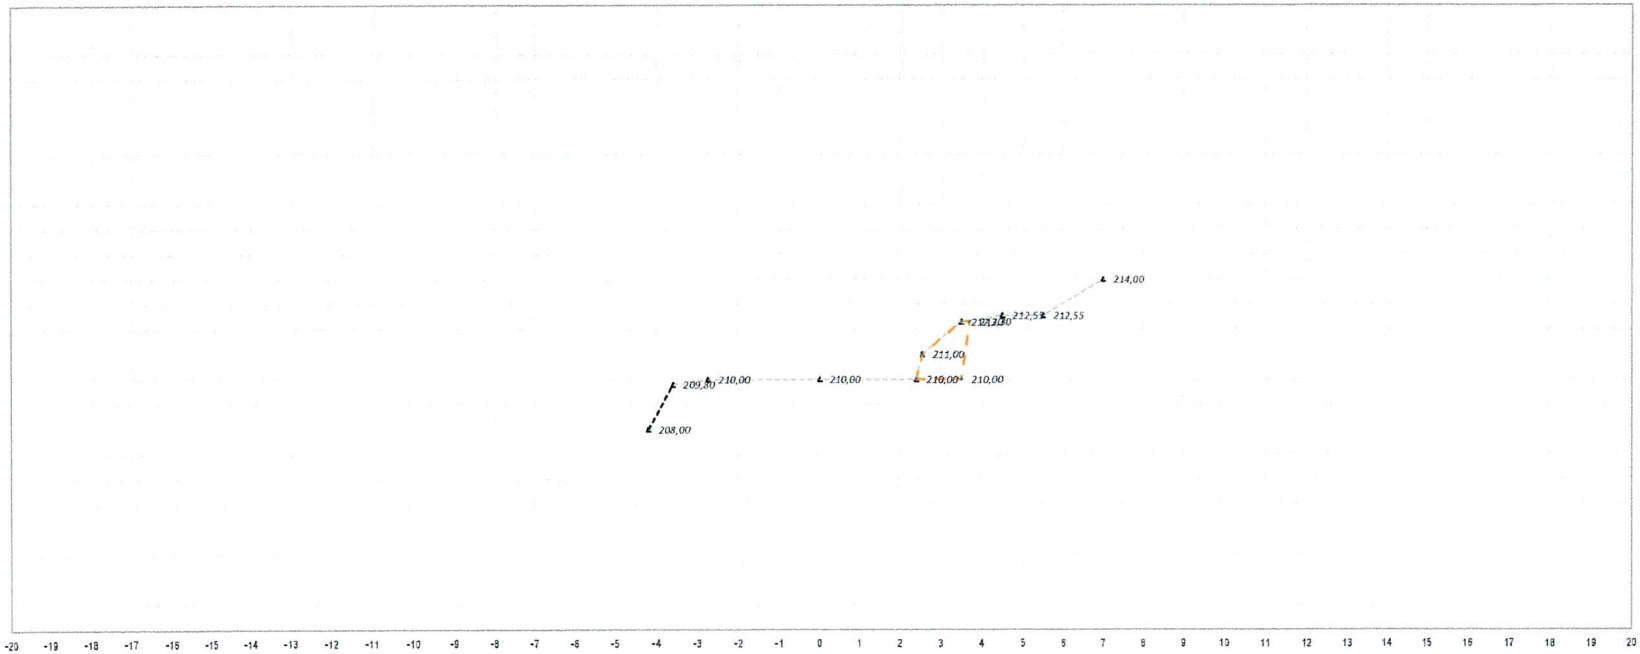

STA.	1 + 350	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,20	-3,60	-2,75	0,00	2,40	2,55	3,50	4,50	5,50	7,00										
	Y													208,00	209,80	210,00	**210,00**	210,00	211,00	212,30	212,55	212,55	214,00										
GALIAN	X																2,40	2,40	3,50	3,70	3,50	2,55	2,40										2,873
	Y																210,00	210,00	210,00	212,30	212,30	211,00	210,00										
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	735	777	743	541	506	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.806,82
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	504	743	786	739	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.810,56

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Akma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

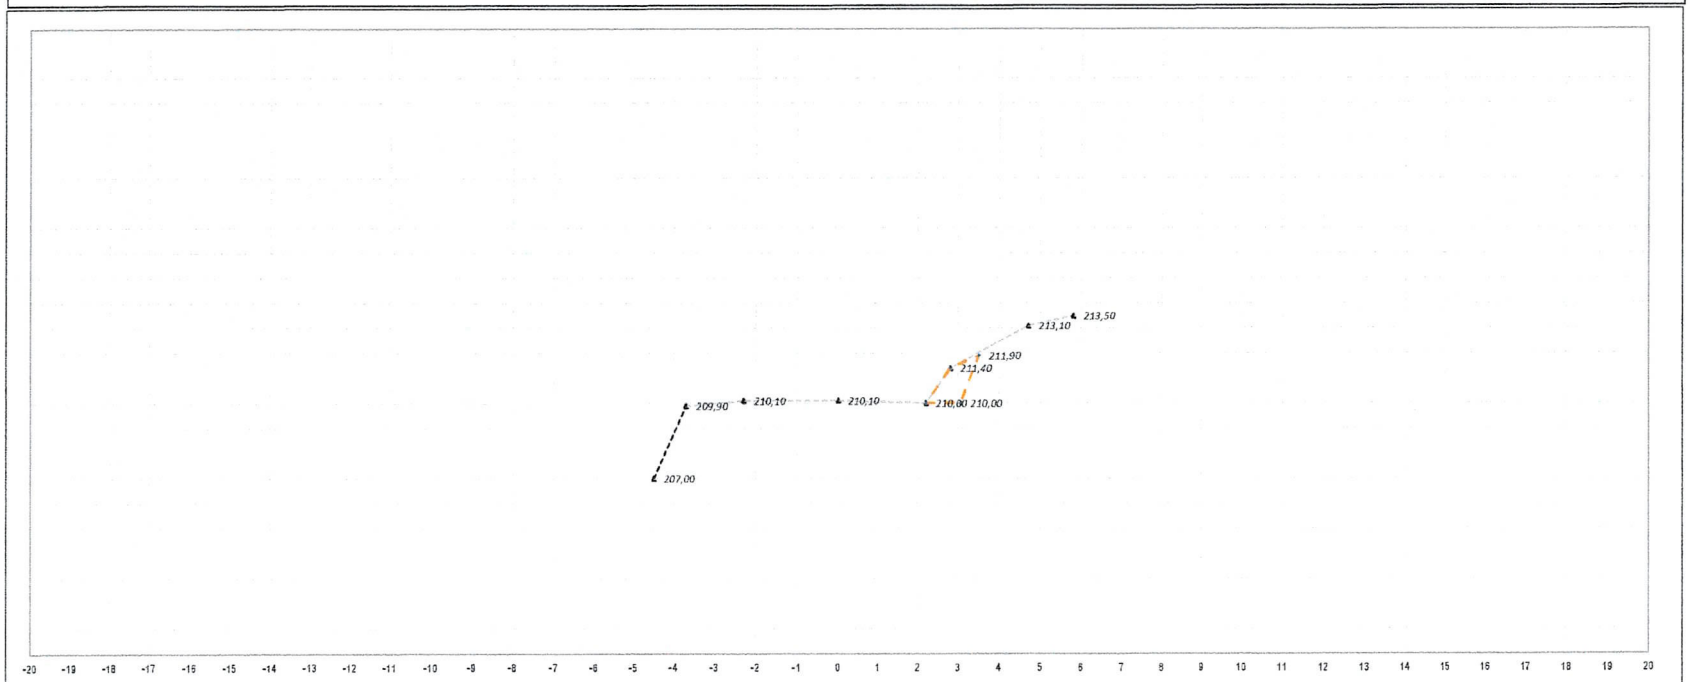

STA.	1 + 350	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,50	-3,70	-2,30	0,00	2,20	2,80	4,70	5,80												
	Y													207,00	209,90	210,10	210,10	210,00	211,40	213,10	213,50												
GALIAN	X																2,20	2,20	3,05	3,50	2,80	2,20											2,148
	Y																210,00	210,00	210,00	211,90	211,40	210,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462	641	735	593	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.895,90
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462	462	646	740	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.898,20

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

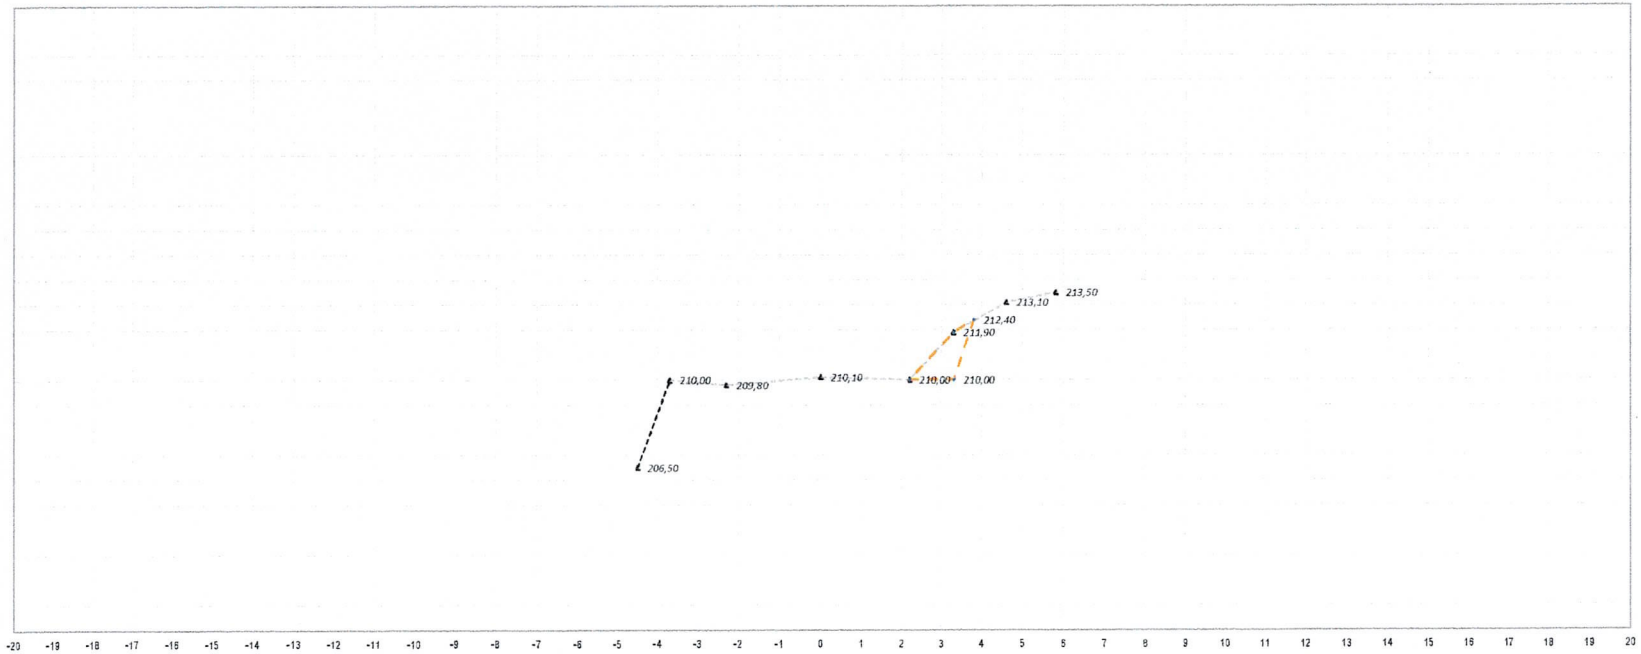

STA.	1 + 542	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,50	-3,70	-2,30	0,00	2,20	3,30	4,60	5,80												
	Y													206,50	210,00	209,80	**210,10**	210,00	211,90	213,10	213,50												
GALIAN	X																2,20	2,20	3,30	3,80	3,30	2,20											2,520
	Y																210,00	210,00	210,00	212,40	211,90	210,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462	693	798	701	466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.120,10
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462	462	701	805	693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.123,14

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Haqodika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

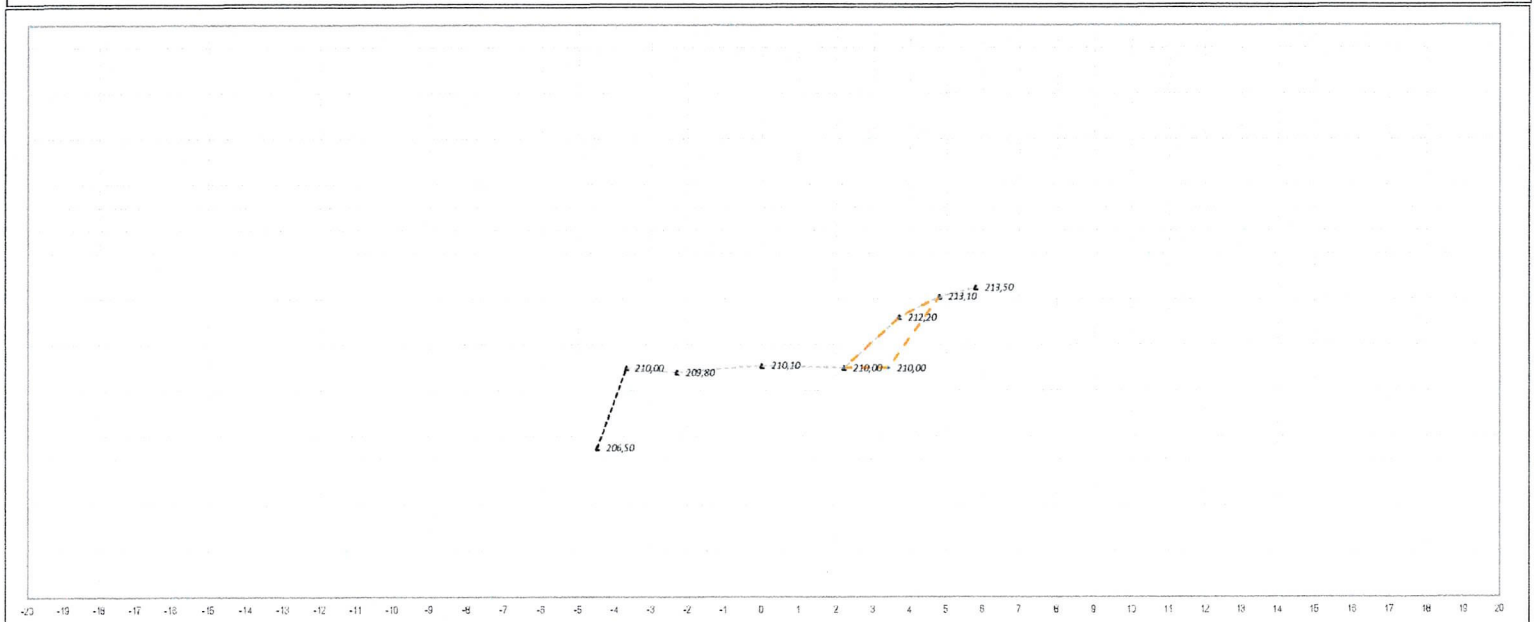

STA.	1 + 275	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,50	-3,70	-2,30	0,00	2,20	3,70	4,80	5,80												
	Y													206,50	210,00	209,80	210,10	210,00	212,20	213,10	213,50												
GALIAN	X																2,20	2,20	3,40	4,80	3,70	2,20											3,395
	Y																210,00	210,00	210,00	213,10	212,20	210,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462	714	1.008	788	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.439,31
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462	462	725	1.019	777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.444,10

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Agma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

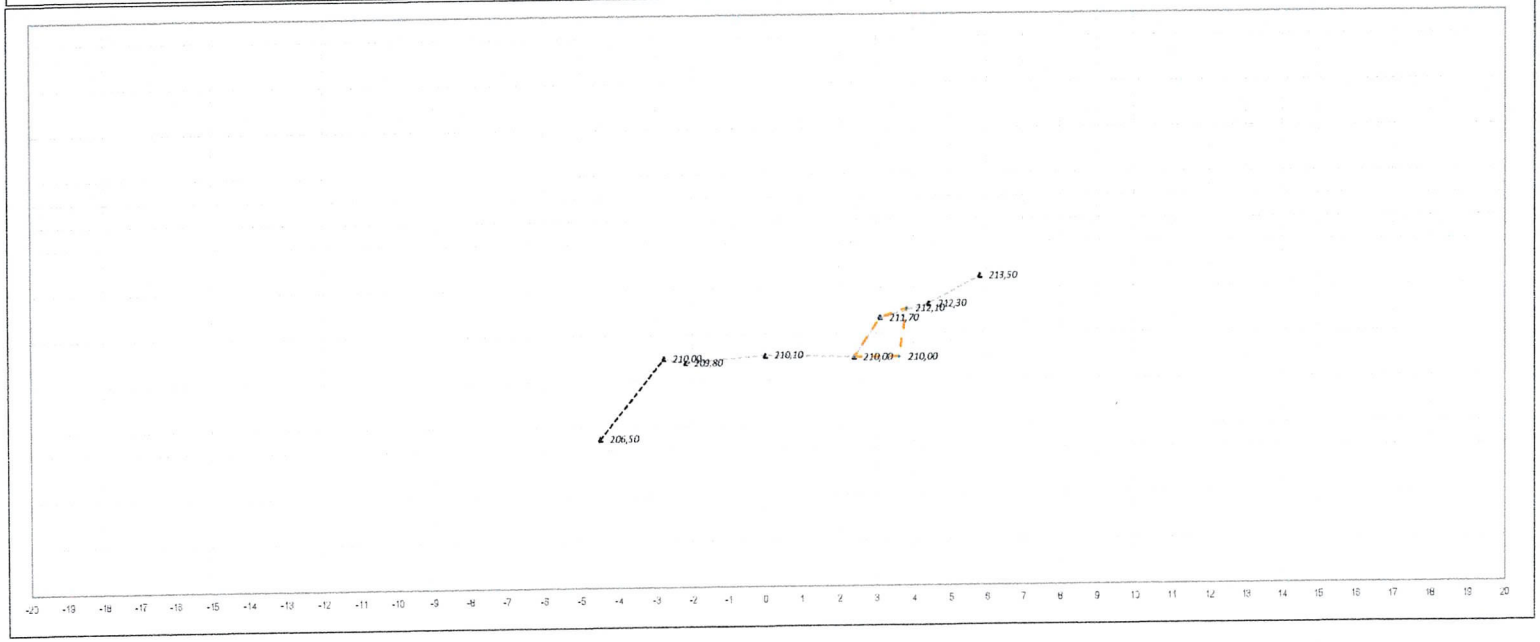

STA.	1 + 655	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,50	-2,80	-2,20	0,00	2,40	3,10	4,40	5,80												
	Y													206,50	210,00	209,80	**210,10**	210,00	211,70	212,30	213,50												
GALIAN	X																2,40	2,40	3,60	3,80	3,10	2,40											2,715
	Y																210,00	210,00	210,00	212,10	211,70	210,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	756	798	658	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.223,59
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	504	764	804	651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.227,02

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Mendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

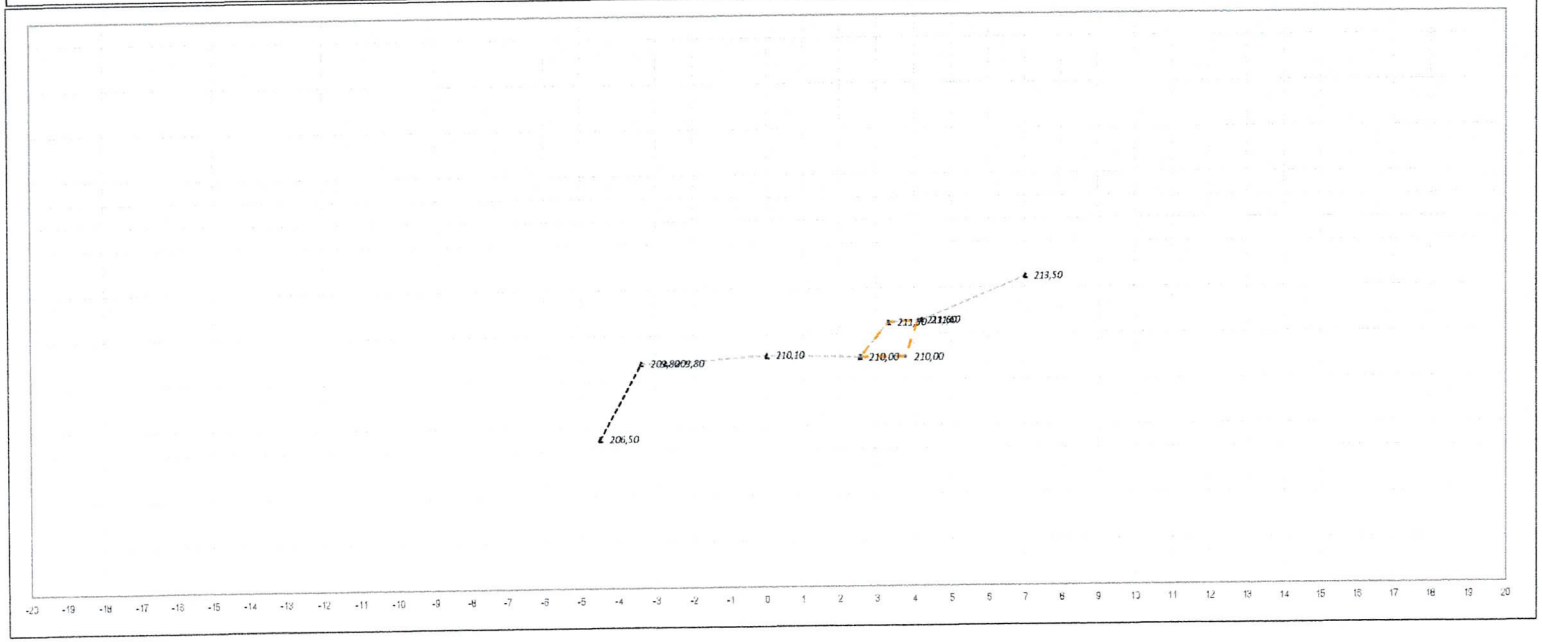

STA.	1 + 800	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,50	-3,40	-2,75	0,00	2,55	3,30	4,20	7,00												
	Y													206,50	209,80	209,80	210,10	210,00	211,50	211,60	213,50												
GALIAN	X																2,55	2,55	3,75	4,10	3,30	2,55											2,523
	Y																210,00	210,00	210,00	211,60	211,50	210,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536	788	861	698	539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.421,61
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536	536	794	867	693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.424,65

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Handika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

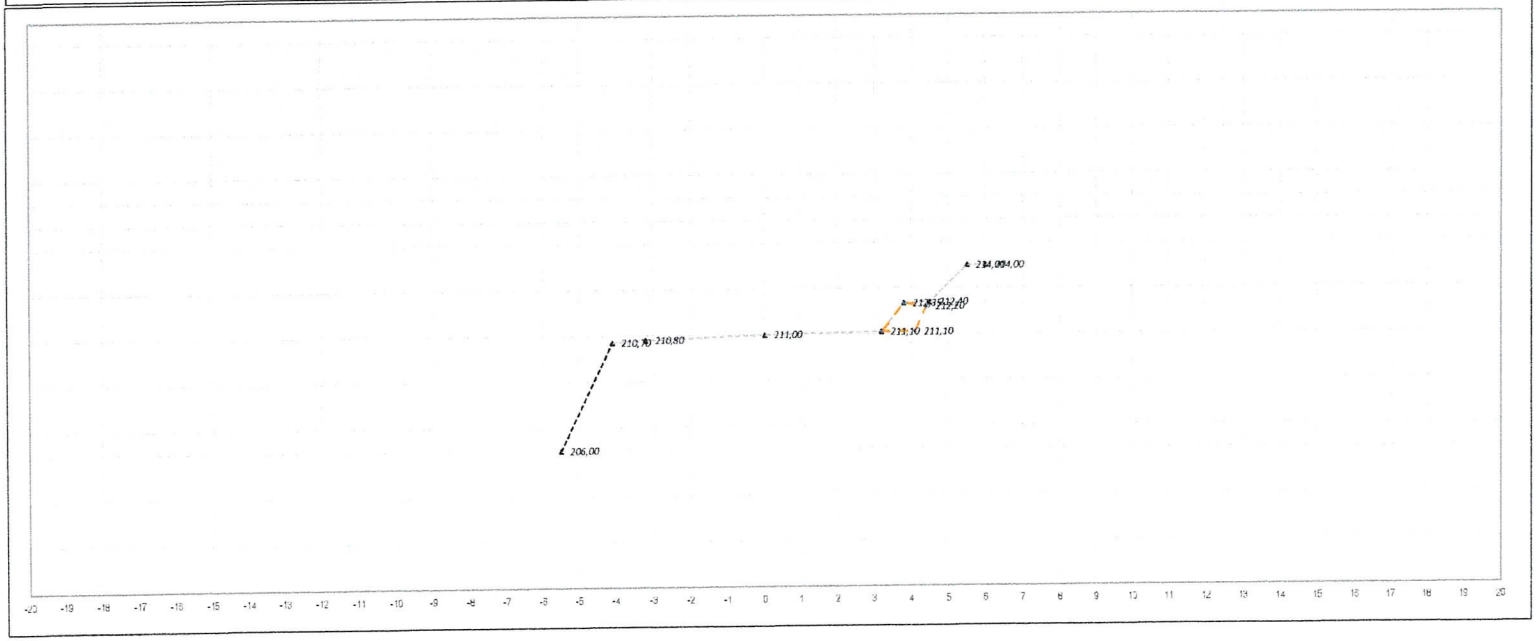

STA.	1 + 900	KOORDINAT CROSS SECTION																														Luasan m2
Existing	X													-5,50	-4,10	-3,20	0,00	3,20	3,80	4,50	5,50	6,00										
	Y													206,00	210,70	210,80	211,00	211,10	212,35	212,40	214,00	214,00										
GALIAN	X																3,20	3,20	4,10	4,40	3,80	3,20										1,915
	Y																211,10	211,10	211,10	212,20	212,35	211,10										
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676	866	929	806	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.955,75
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676	676	870	934	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.957,58

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

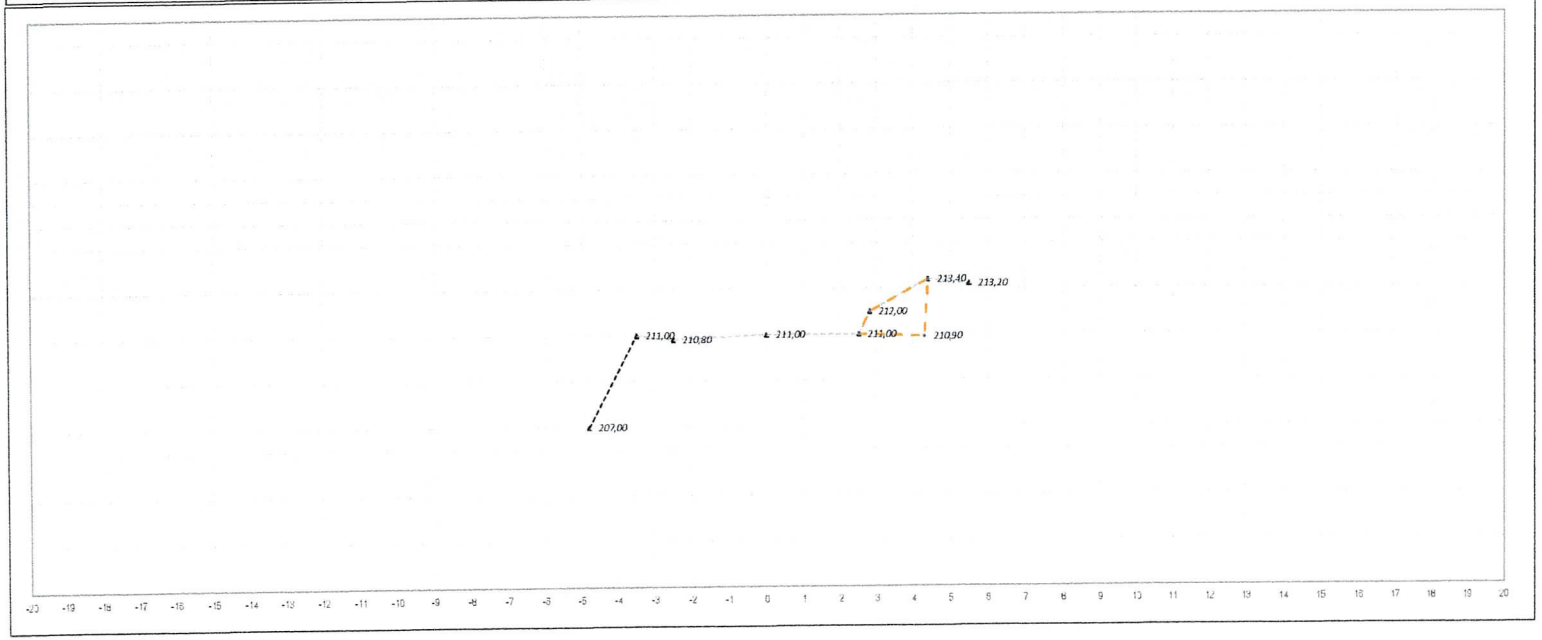

STA.	2 + 200	KOORDINAT CROSS SECTION																														Luasan m2
Existing	X													-4,80	-3,50	-2,50	0,00	2,50	2,80	4,40	5,50											
	Y													207,00	211,00	210,80	211,00	211,00	212,00	213,40	213,20											
GALIAN	X																2,50	4,30	4,40	2,80	2,50											3,845
	Y																211,00	210,90	213,40	212,00	211,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907	928	598	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.962,78
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527	918	933	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.968,47

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

Wa.Handika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Handa, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

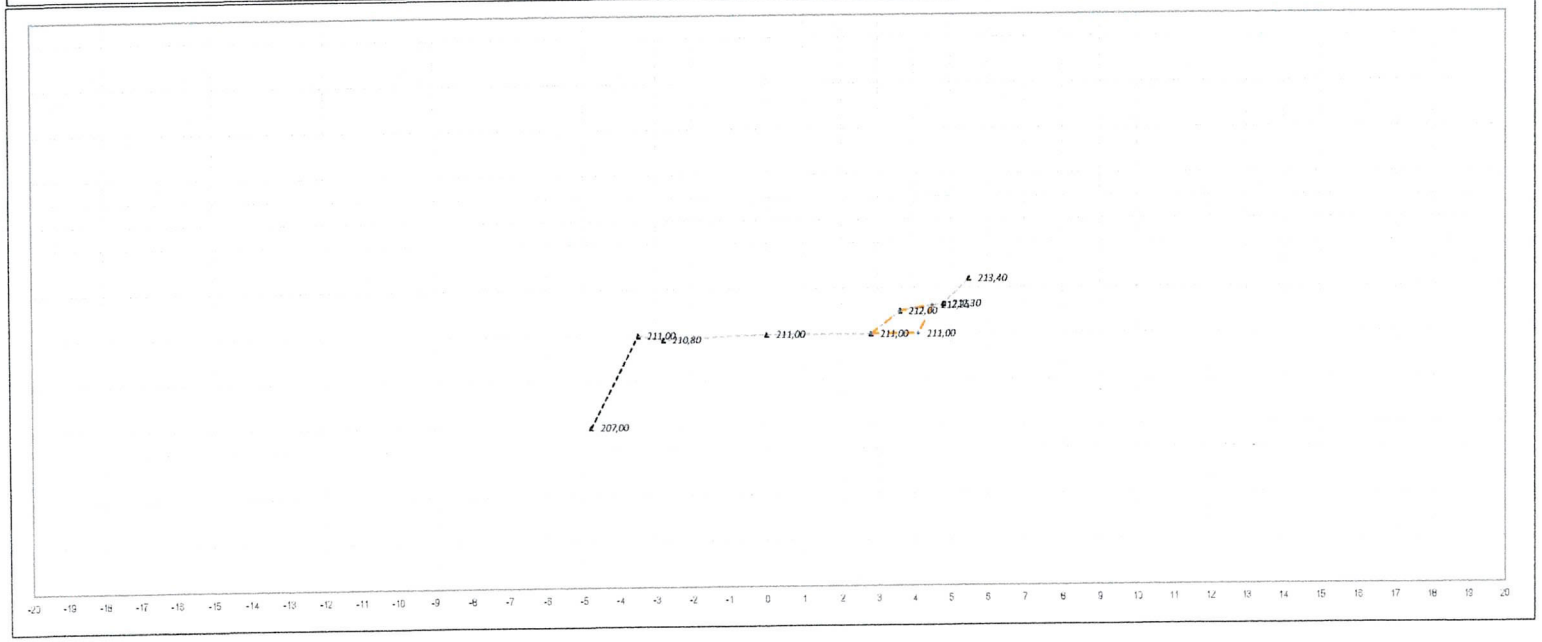

STA.	2 + 450	KOORDINAT CROSS SECTION																														Luasan m2
Existing	X													-4,80	-3,50	-2,80	0,00	2,80	3,60	4,80	5,50											
	Y													207,00	211,00	210,80	211,00	211,00	212,00	212,30	213,40											
GALIAN	X																2,80	2,80	4,10	4,50	3,60	2,80										2,163
	Y																211,00	211,00	211,00	212,25	212,00	211,00										
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591	865	950	764	594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.763,10
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591	591	870	954	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.765,43

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hanedika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latikum 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

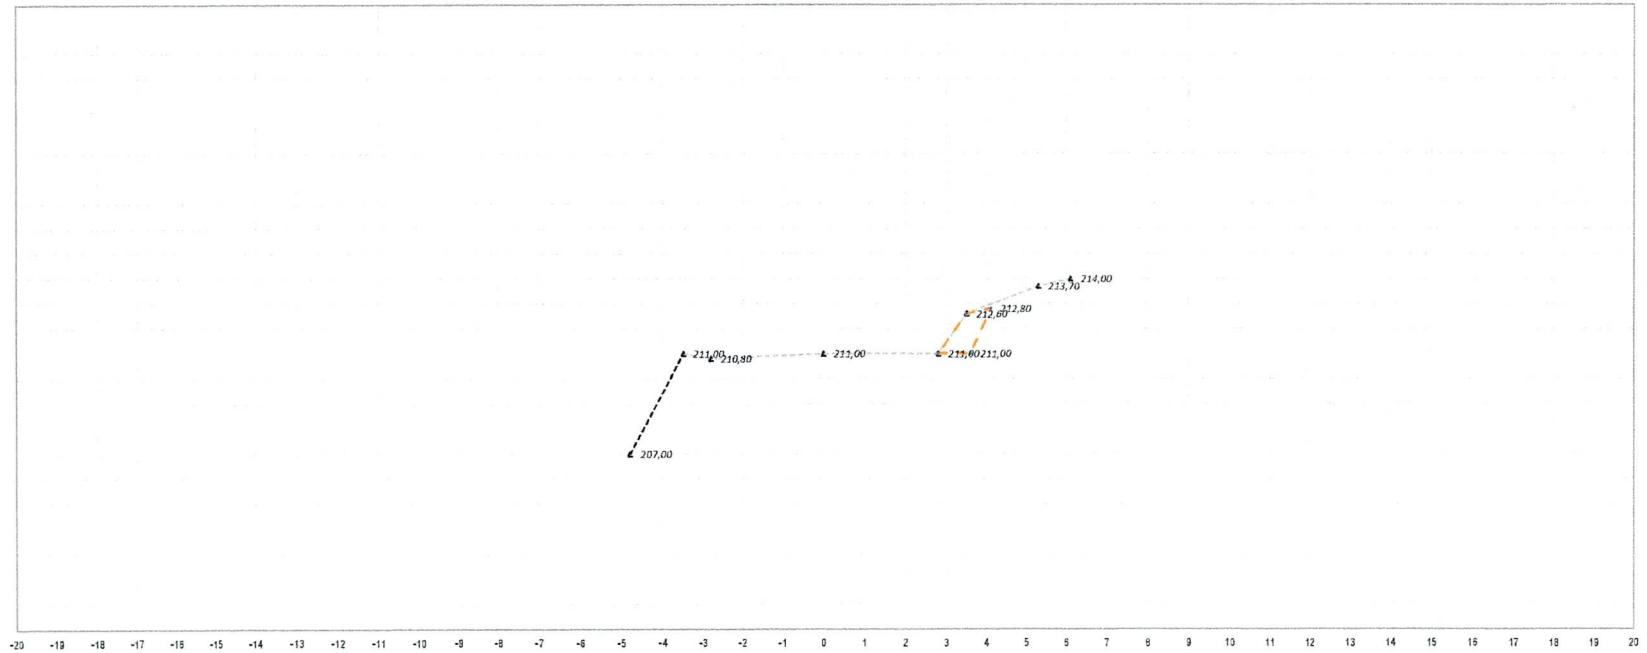

STA.	2 + 500	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,80	-3,50	-2,80	0,00	2,80	3,50	5,30	6,10												
	Y													207,00	211,00	210,80	**211,00**	211,00	212,60	213,70	214,00												
GALIAN	X																2,80	2,80	3,60	4,10	3,50	2,80											2,130
	Y																211,00	211,00	211,00	212,80	212,60	211,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591	760	865	745	595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.555,58
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591	591	766	872	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.557,84

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA. Hanandika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Suparmadu, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

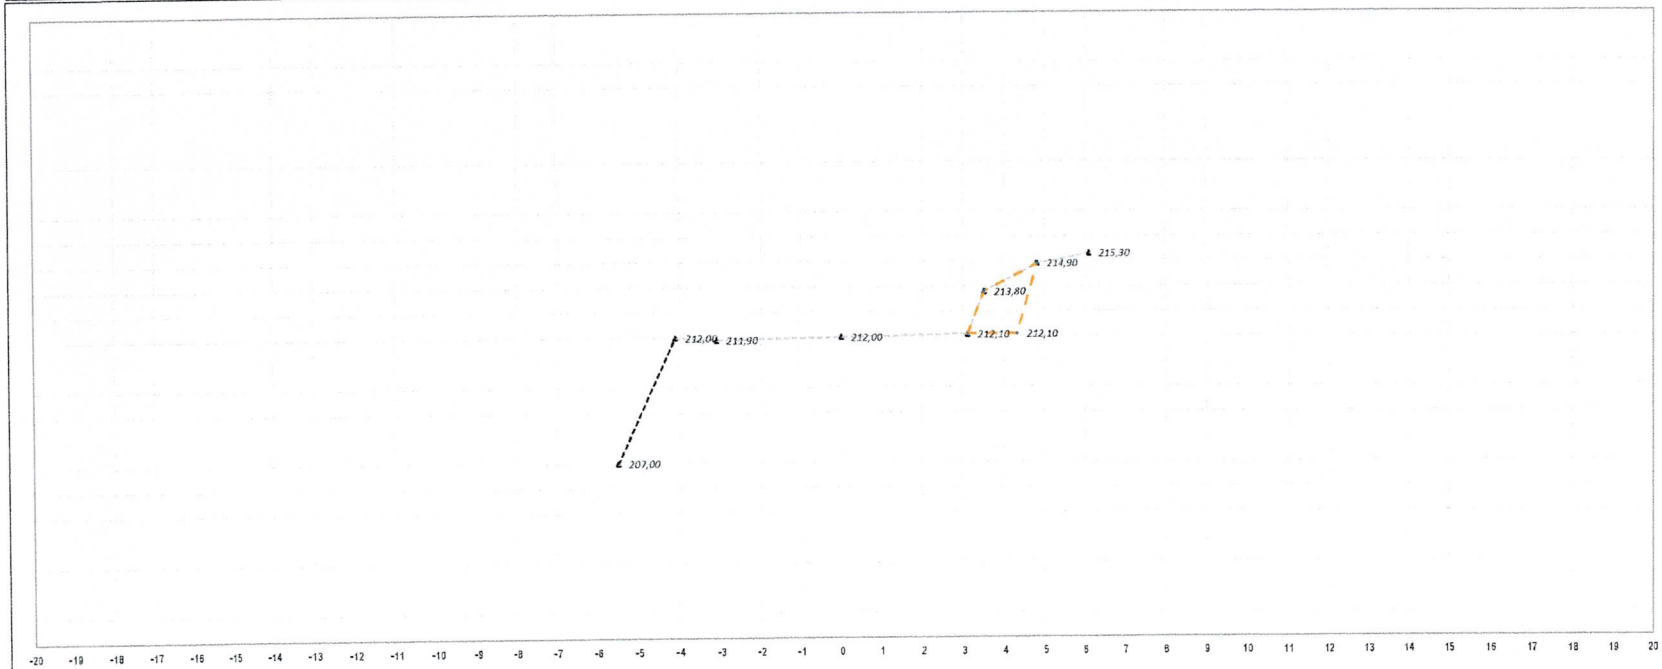

STA.	2 + 750	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-5,50	-4,10	-3,10	0,00	3,10	3,50	4,80	6,10												
	Y													207,00	212,00	211,90	212,00	212,10	213,80	214,90	215,30												
GALIAN	X																3,10	3,10	4,30	4,80	3,50	3,10											3,565
	Y																212,10	212,10	212,10	214,90	213,80	212,10											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658	912	1.018	752	663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.002,55
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658	658	924	1.026	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.007,68

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA Hanodika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

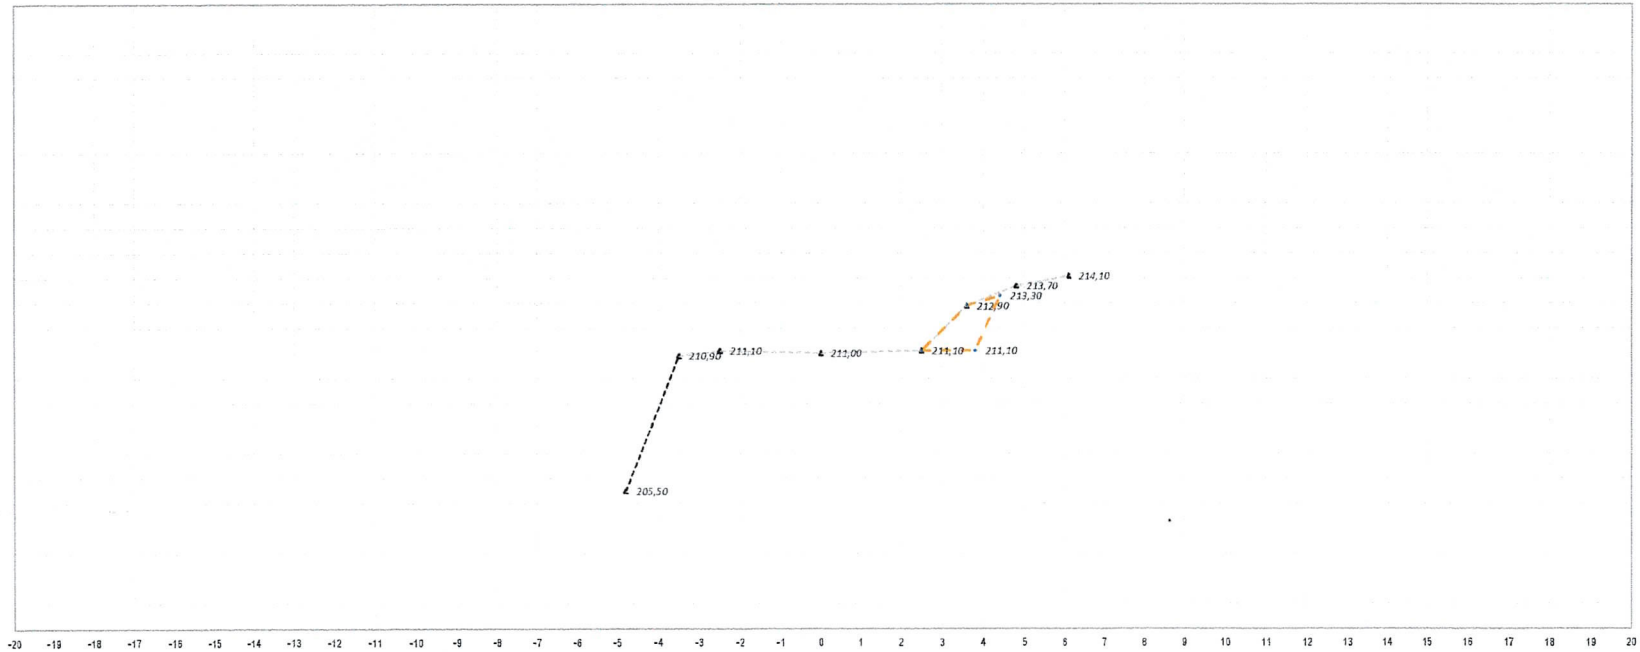

STA.	2 + 800	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,80	-3,50	-2,50	0,00	2,50	3,60	4,80	6,10												
	Y													205,50	210,90	211,10	**211,00**	211,10	212,90	213,70	214,10												
GALIAN	X																2,50	2,50	3,80	4,40	3,60	2,50											2,930
	Y																211,10	211,10	211,10	213,30	212,90	211,10											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528	802	929	768	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.558,90
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528	528	811	937	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.562,76

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

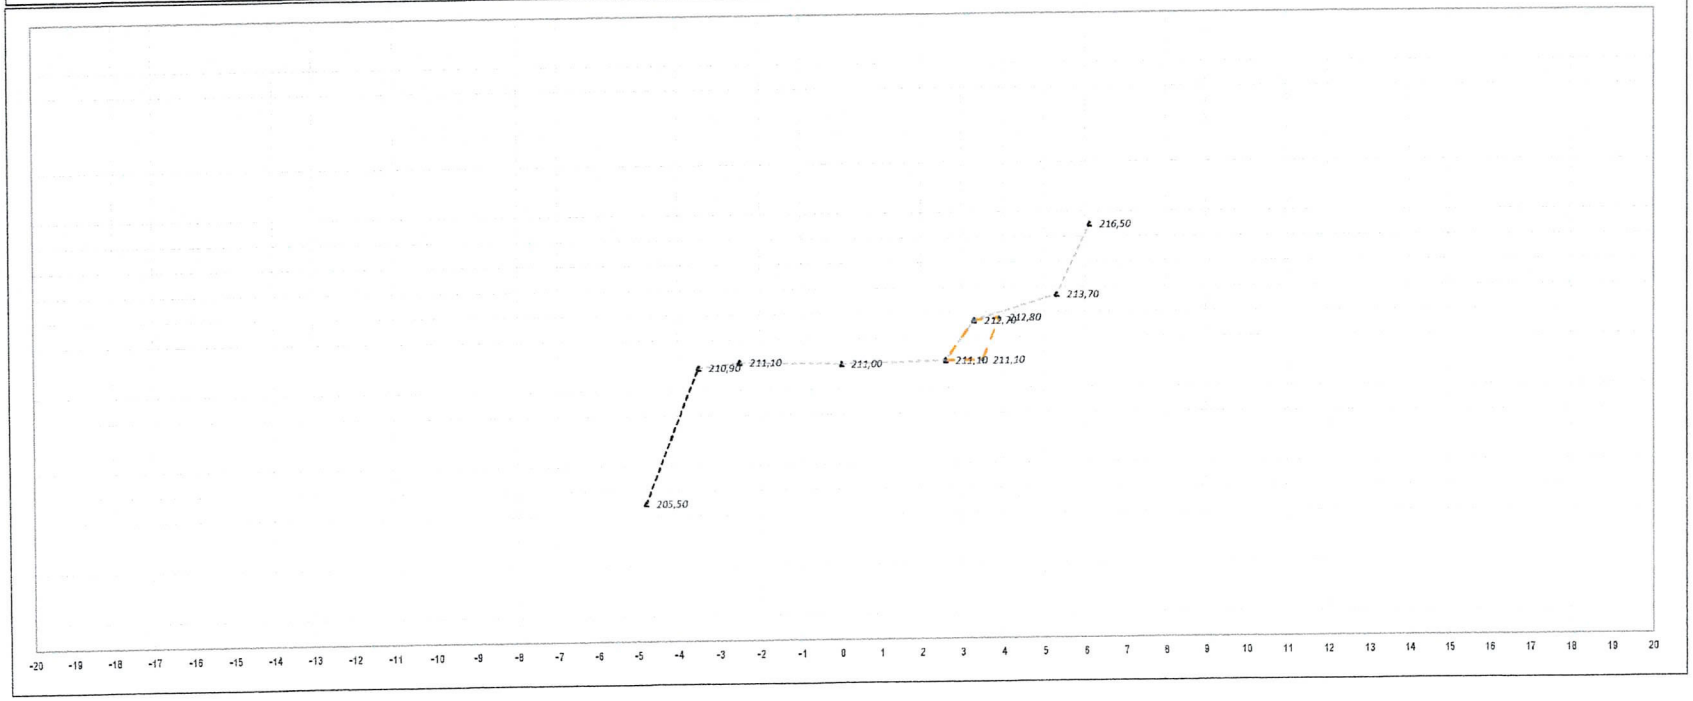

STA.	3 + 000	KOORDINAT CROSS SECTION																																Luasan m2
Existing	X													-4,80	-3,50	-2,50	0,00	2,60	3,30	5,30	6,10													
	Y													205,50	210,90	211,10	211,00	211,10	212,70	213,70	216,50													
GALIAN	X																2,60	2,60	3,50	3,90	3,30	2,60												2,210
	Y																211,10	211,10	211,10	212,80	212,70	211,10												
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549	739	823	702	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.366,26
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549	549	745	830	697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.368,68

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hanggika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

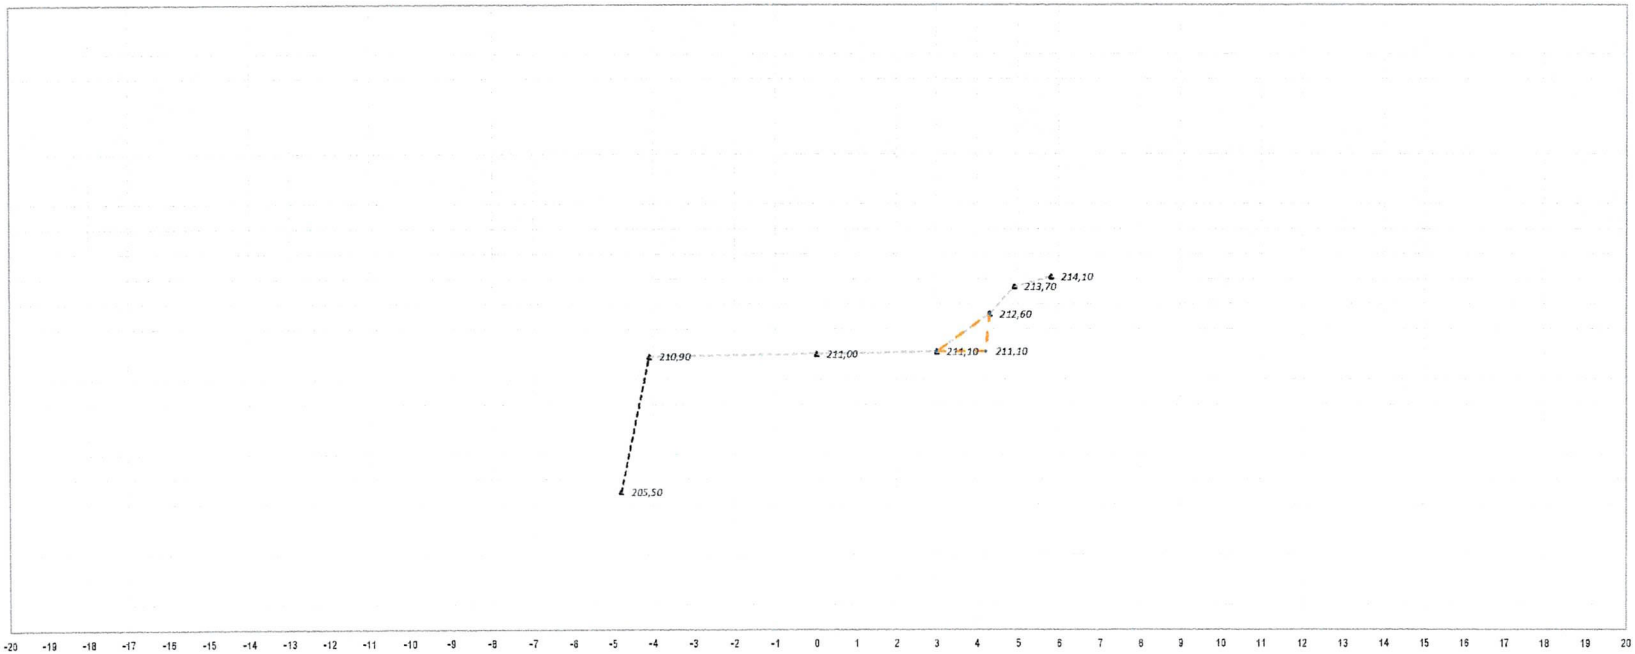

STA.	3 + 190	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,80	-4,10	3,00	0,00	3,00	4,30	4,90	5,80												
	Y													205,50	210,90	211,10	211,00	211,10	212,60	213,70	214,10												
GALIAN	X																3,00	3,00	4,20	4,30	3,00												1,900
	Y																211,10	211,10	211,10	212,60	211,10												
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633	887	908	638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.065,45
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633	633	893	908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.067,25

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hanqdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

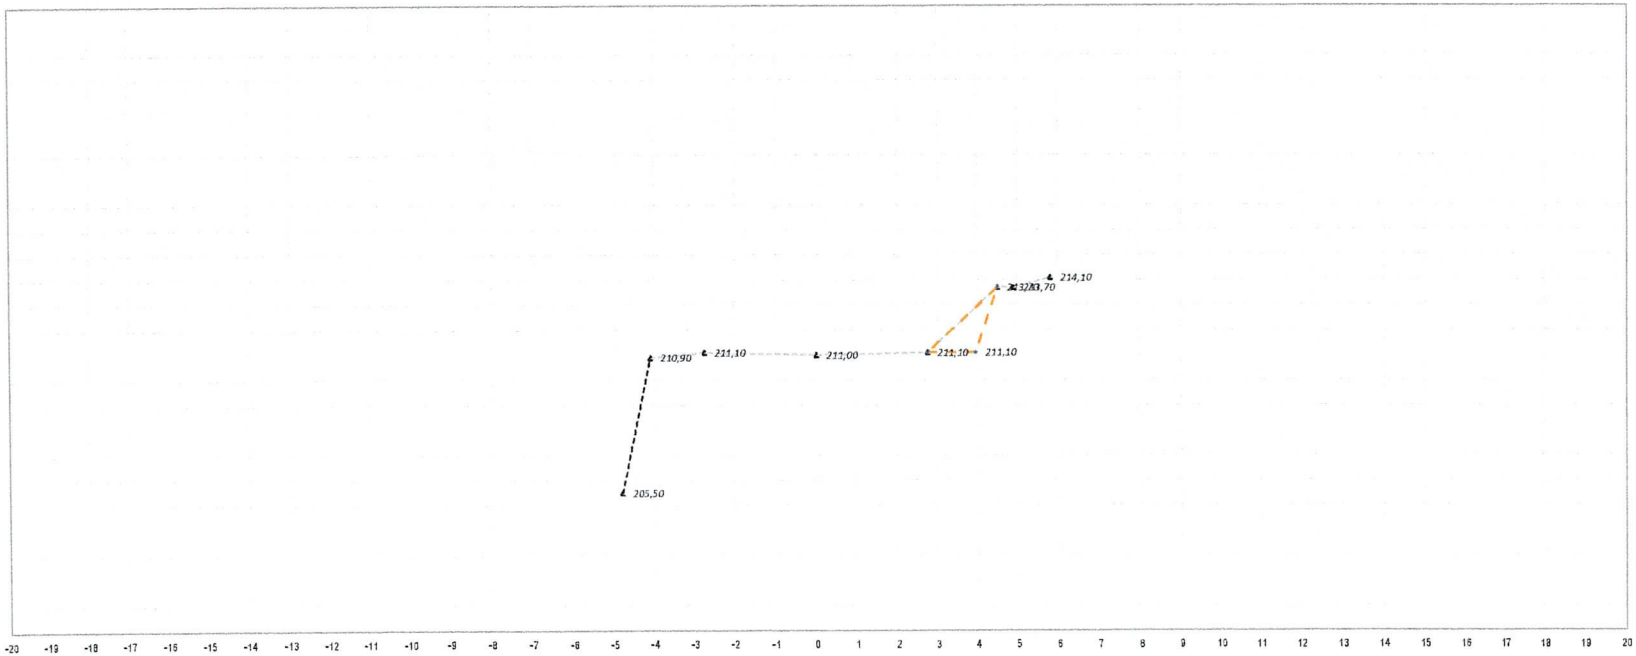

STA.	3 + 250	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,80	-4,10	-2,75	0,00	2,75	4,50	4,90	5,80												
	Y													205,50	210,90	211,10	**211,00**	211,10	213,70	213,70	214,10												
GALIAN	X																2,75	2,75	3,95	4,50	2,75												2,560
	Y																211,10	211,10	211,10	213,70	211,10												
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581	834	950	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.952,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581	581	844	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.955,12

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA Hangdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

PT. STAR MITRA SULAWESI

Sugimono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

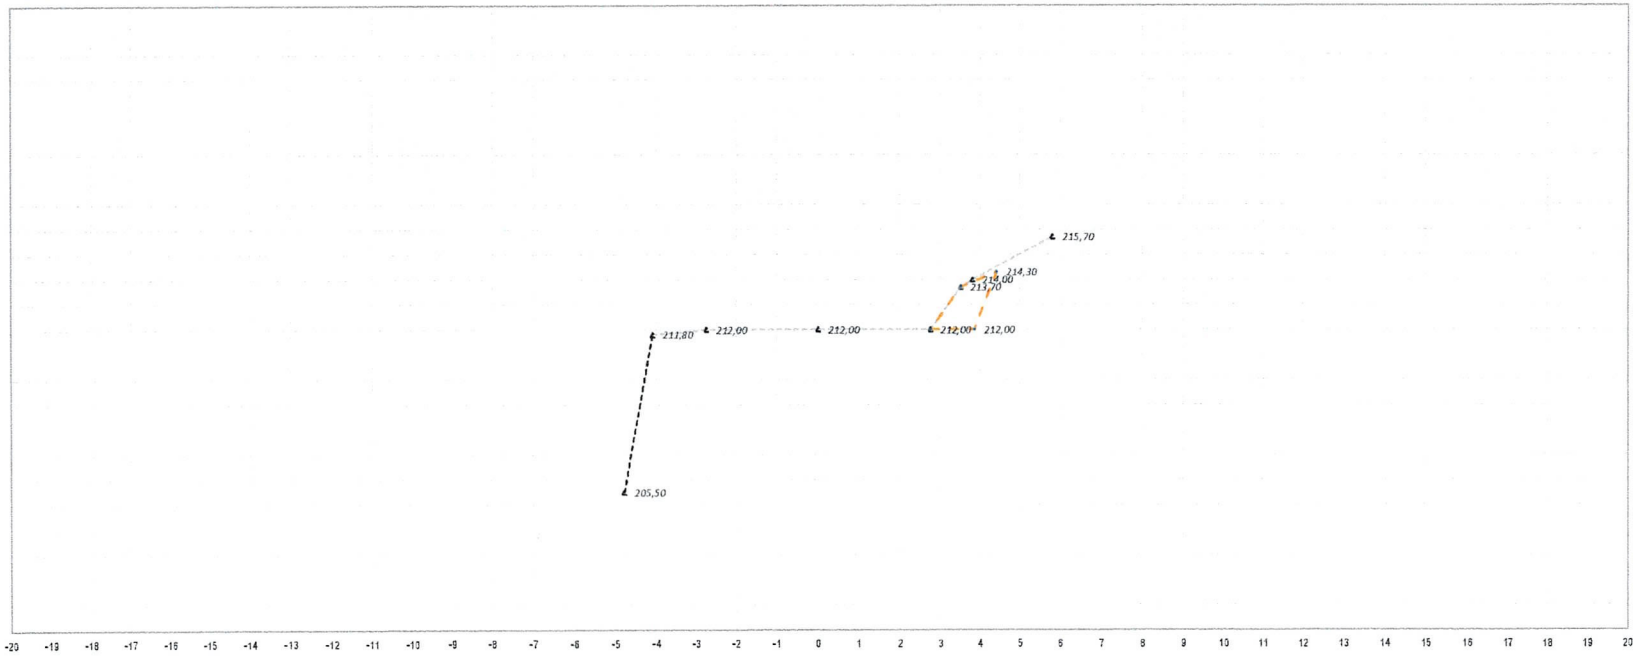

STA.	3 + 500	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,80	-4,10	-2,75	0,00	2,75	3,50	3,80	5,80												
	Y													205,50	211,80	212,00	**212,00**	212,00	213,70	214,00	215,70												
GALIAN	X																2,75	2,75	3,85	4,40	3,50	2,75											2,805
	Y																212,00	212,00	212,00	214,30	213,70	212,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	816	933	750	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.669,73
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	583	825	940	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.673,34

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA.Hanodika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

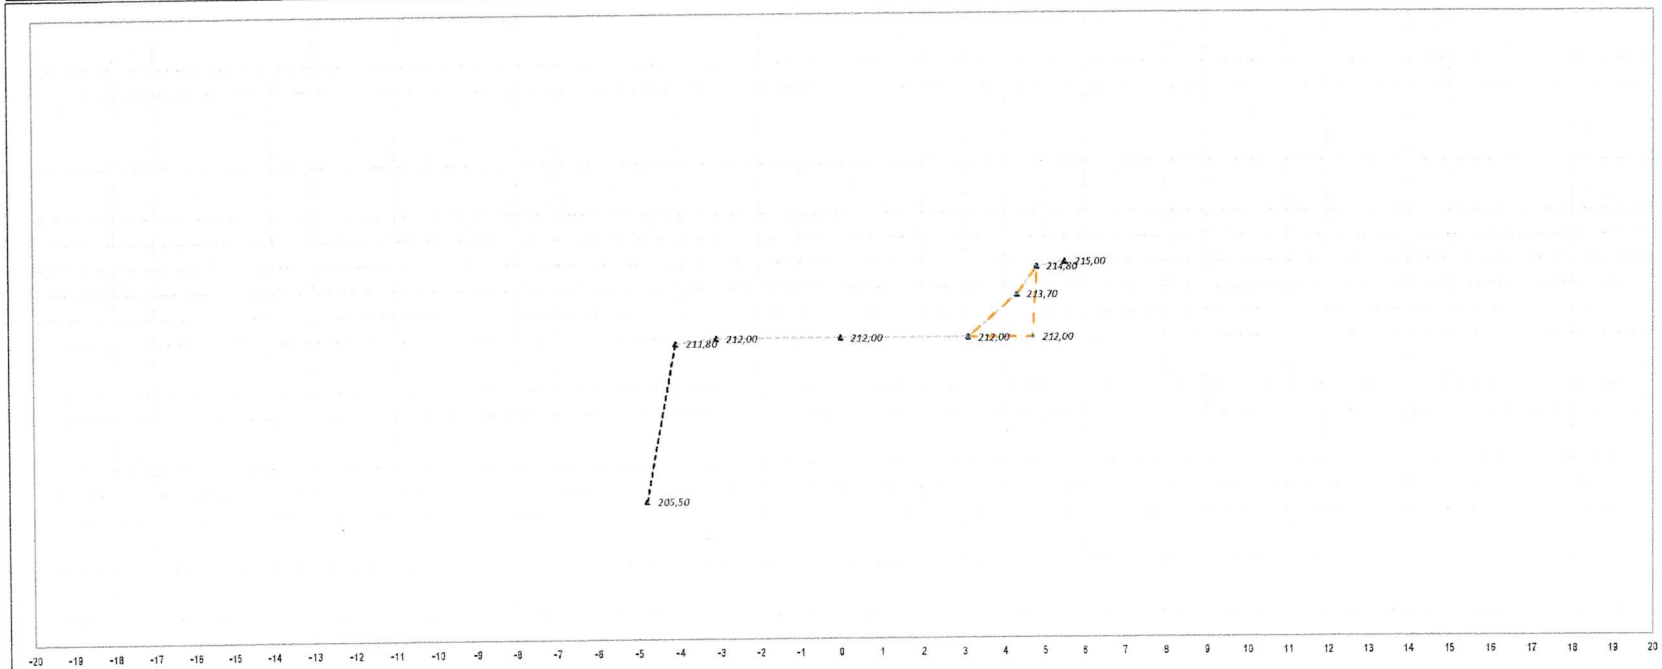

STA.	3 + 600	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-4,80	-4,10	-3,10	0,00	3,10	4,30	4,80	5,50												
	Y													205,50	211,80	212,00	212,00	212,00	213,70	214,80	215,00												
GALIAN	X																3,10	3,10	4,70	4,80	4,30	3,10											3,005
	Y																212,00	212,00	212,00	214,80	213,70	212,00											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657	996	1.018	924	662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.257,31
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657	657	1.010	1.026	912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,32

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA. Hanadika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

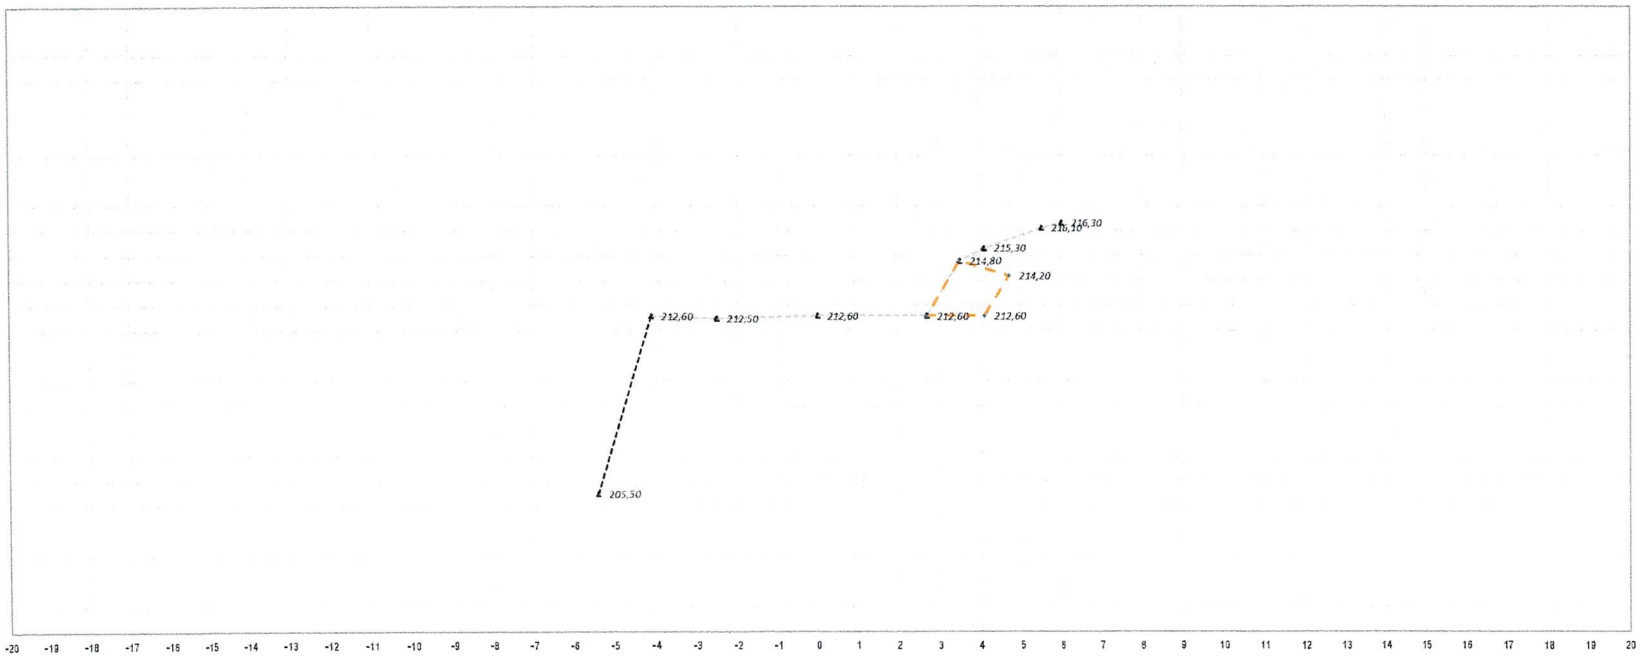

STA.	2 + 780	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-5,40	-4,10	-2,50	0,00	2,70	3,50	4,10	5,50	6,00											
	Y													205,50	212,60	212,50	212,60	212,60	214,80	215,30	216,10	216,30											
GALIAN	X																2,70	2,70	4,10	4,70	3,50	2,70											3,680
	Y																212,60	212,60	212,60	214,20	214,80	212,60											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574	872	999	750	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.774,56
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574	574	878	1.010	744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.779,92

Pihak Dinas PUPR
Bidang Bina Marga
Pengawas Lapangan

WA Hamdika
Staf Teknis

Pihak Konsultan Supervisi
CV. Latitude 79 Nusantara

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. Star Mitra Sulawesi

Sudarmono, ST
Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN GALIAN

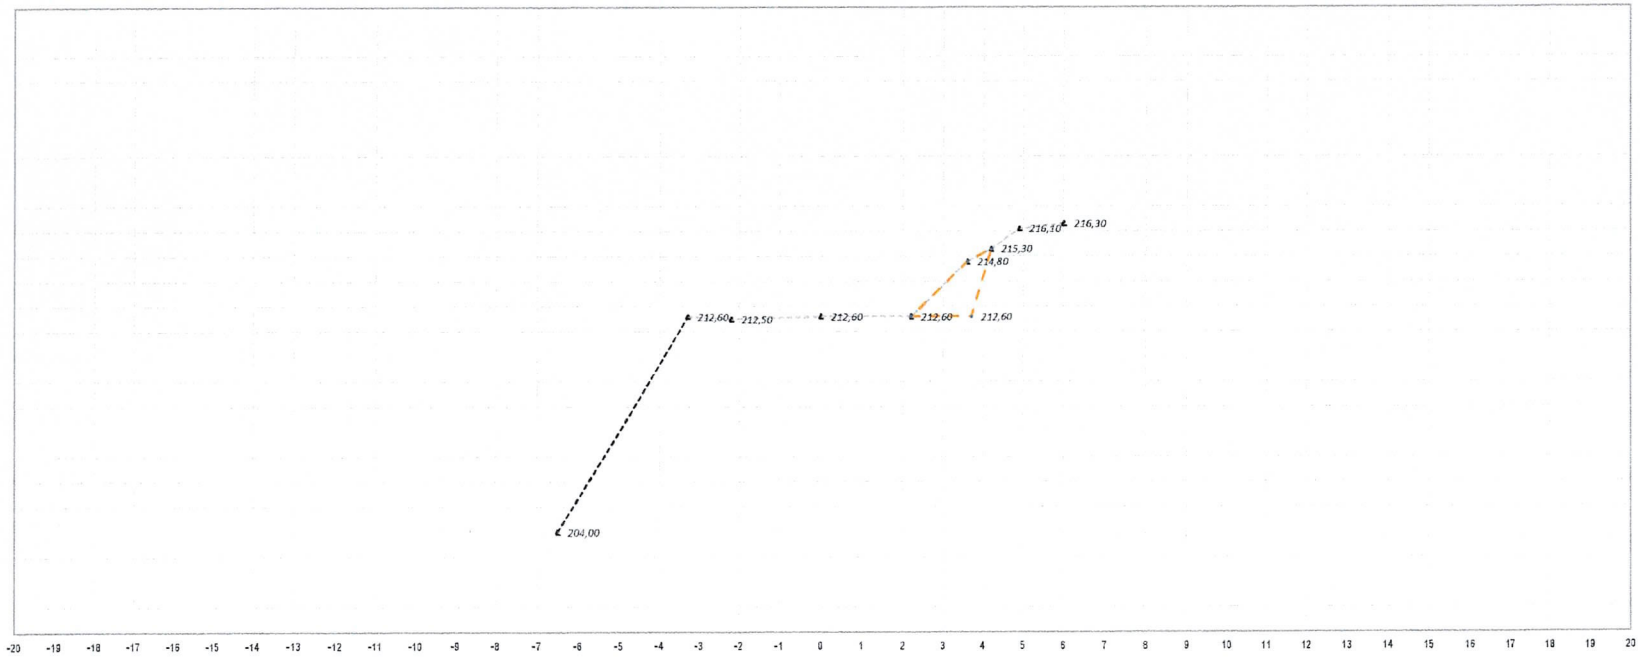

STA.	3 + 850	KOORDINAT CROSS SECTION																															Luasan m2
Existing	X													-6,50	-3,30	-2,20	0,00	2,20	3,60	4,20	4,90	6,00											
	Y													204,00	212,60	212,50	**212,60**	212,60	214,80	215,30	216,10	216,30											
GALIAN	X																2,20	2,20	3,70	4,20	3,60	2,20											3,335
	Y																212,60	212,60	212,60	215,30	214,80	212,60											
HITUNGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468	787	893	775	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.394,90
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468	468	797	902	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.399,57

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan Supervisi	Pihak Penyedia Jasa
Bidang Bina Marga	**CV. Latitude 79 Nusantara**	**PT. Star Mitra Sulawesi**
Pengawas Lapangan		
WA.Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Staf Teknis	Inspector	Pelaksana

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Penyiapan Badan Jalan**
SATUAN : m2
NO. DIV. : 3.3.(1)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+950	s.d	2+400	FULL	1,350.0	4,700.00	4,700.00	
2	2+400	s.d	3+850	FULL	1,400.0	8,700.00	7,937.50	
3	3+850	s.d	4+200	FULL	350.0	2,100.00	1,925.00	
1	0+000	s.d	1+450	FULL	1,400.0	8,700.00	7,975.00	
2	1+450	s.d	1+650	FULL	200.0	1,200.00	1,100.00	
JUMLAH					**4,700.0**	**25,400.00**	**23,637.50**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	29,702.86	m2
VOLUME USULAN CCO	.....	23,637.50	m2

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m2
MC UNTUK BULAN INI	.....	23,637.50	m2
MC SD BULAN INI	.....	23,637.50	m2
SISA VOLUME	.....	-	m2

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

PT. STAR MITRA SULAWESI
NUSANTARA

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : **PENYIAPAN BADAN JALAN**
Nomor Divisi : 3.3.(1)
Satuan : m2

NO	STA.	POSISI	DIMENSI				PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			DESAIN		USULAN CCO			DESAIN	CCO	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2				
										RUAS.01
1	0+950	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
2	1+000	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
3	1+050	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
4	1+100	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
5	1+150	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
6	1+200	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
7	1+250	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
8	1+300	FULL	2,00		2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
9	1+350	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
10	1+400	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
11	1+450	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
12	1+500	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
13	1+550	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
14	1+600	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
15	1+650	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
16	1+700	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
17	1+750	FULL	2,00	-	2,00					
						2,00	50,00	100,00	100,00	
18	1+800	FULL	2,00	-	2,00					
1	1+900	FULL	6,00	-	6,00					
						6,00	50,00	300,00	300,00	
2	1+950	FULL	6,00	-	6,00					
						6,00	50,00	300,00	300,00	
3	2+000	FULL	6,00	-	6,00					
						6,00	50,00	300,00	300,00	
4	2+050	FULL	6,00	-	6,00					
						6,00	50,00	300,00	300,00	
5	2+100	FULL	6,00	-	6,00					
						6,00	50,00	300,00	300,00	
6	2+150	FULL	6,00	-	6,00					
						6,00	50,00	300,00	300,00	
7	2+200	FULL	6,00	-	6,00					
						6,00	50,00	300,00	300,00	
8	2+250	FULL	6,00	-	6,00					
						6,00	50,00	300,00	300,00	
9	2+300	FULL	6,00	-	6,00					
						6,00	50,00	300,00	300,00	
10	2+350	FULL	6,00	-	6,00					
						6,00	50,00	300,00	300,00	
11	2+400	FULL	6,00	-	6,00					
						Jumlah	**1.350,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	m2

Pihak Dinas PUPR BID. BINA MARGA	Pihak Konsultan CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	Pihak Penyedia Jasa PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. HANGDIKA Staf Teknis	**ASMA HENDRA, ST** Inspector	**SUDARMONO, ST** Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : PENYIAPAN BADAN JALAN
Nomor Divisi : 3.3.(1)
Satuan : m2

NO	STA.	POSISI	DIMENSI				PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			DESAIN		USULAN CCO			DESAIN	CCO	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2				
										RUAS.01
1	2+400	FULL	6,00	-	6,00	6,00	50,00	300,00	300,00	
2	2+450	FULL	6,00	-	6,00	6,00	50,00	300,00	300,00	
3	2+500	FULL	6,00	-	6,00	6,00	50,00	300,00	300,00	
4	2+550	FULL	6,00	-	6,00	6,00	50,00	300,00	300,00	
5	2+600	FULL	6,00	-	6,00	6,00	50,00	300,00	300,00	
6	2+650	FULL	6,00	-	6,00	6,00	50,00	300,00	300,00	
7	2+700	FULL	6,00	-	6,00	5,75	50,00	300,00	287,50	
8	2+750	FULL	6,00	-	5,50	5,50	50,00	300,00	275,00	
9	2+800	FULL	6,00	-	5,50	5,50	50,00	300,00	275,00	
10	2+850	FULL	6,00	-	5,50	5,50	50,00	300,00	275,00	
11	2+900	FULL	6,00	-	5,50	5,50	50,00	300,00	275,00	
12	2+950	FULL	6,00	-	5,50	5,50	50,00	300,00	275,00	
13	3+000	FULL	6,00	-	5,50	5,50	50,00	300,00	275,00	
14	3+050	FULL	6,00	-	5,50	5,50	50,00	300,00	275,00	
15	3+100	FULL	6,00	-	5,50	5,50	50,00	300,00	275,00	
16	3+150	FULL	6,00	-	5,50	5,50	50,00	300,00	275,00	
17	3+200	FULL	6,00	-	5,50	5,50	50,00	300,00	275,00	
18	3+250	FULL	6,00	-	5,50	5,50	50,00	300,00	275,00	
19	3+300	FULL	6,00	-	5,00	5,25	50,00	300,00	262,50	
20	3+350	FULL	6,00	-	5,00	5,00	50,00	300,00	250,00	
21	3+400	FULL	6,00	-	5,00	5,00	50,00	300,00	250,00	
22	3+450	FULL	6,00	-	5,00	5,00	50,00	300,00	250,00	
23	3+500	FULL	6,00	-	5,00	5,00	50,00	300,00	250,00	
24	3+550	FULL	6,00	-	5,00	5,00	50,00	300,00	250,00	
25	3+600	FULL	6,00	-	5,00	5,00	50,00	300,00	250,00	
26	3+650	FULL	6,00	-	5,00	5,00	50,00	300,00	250,00	
27	3+700	FULL	6,00	-	5,50	5,25	50,00	300,00	262,50	
28	3+750	FULL	6,00	-	5,50	5,50	50,00	300,00	275,00	
29	3+800	FULL	6,00	-	5,50	5,50	50,00	300,00	275,00	
30	3+850	FULL	6,00	-	5,50	5,50	50,00	300,00	275,00	
						Jumlah	**1.400,00**	**8.700,00**	**7.937,50**	m2

Pihak Dinas PUPR BID. BINA MARGA	Pihak Konsultan CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	Pihak Penyedia Jasa PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika Staf Teknis	Asma Hendra, ST Inspector	Sudarmono, ST Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : PENYIAPAN BADAN JALAN
Nomor Divisi : 3.3.(1)
Satuan : m2

NO	STA.	POSISI	DIMENSI				PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			DESAIN		USULAN CCO			DESAIN	CCO	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2				
										RUAS.02
1	3+850	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
2	3+900	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
3	3+950	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
4	4+000	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
5	4+050	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
6	4+100	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
7	4+150	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
8	4+200	FULL	6,00	-	5,50					
						Jumlah	**350,00**	**2.100,00**	**1.925,00**	m2

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
BID. BINA MARGA	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Staf Teknis	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : PENYIAPAN BADAN JALAN
Nomor Divisi : 3.3.(1)
Satuan : m2

NO	STA.	POSISI	DIMENSI				PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			DESAIN		USULAN CCO			DESAIN	CCO	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2				
										RUAS.02
1	0+000	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
2	0+050	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
3	0+100	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
4	0+150	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
5	0+200	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
6	0+250	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
7	0+300	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
8	0+350	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
9	0+400	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
10	0+450	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
11	0+500	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
12	0+550	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
13	0+600	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
14	0+650	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
15	0+700	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
16	0+750	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
17	0+800	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
18	0+850	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
19	0+900	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
20	0+950	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
21	1+000	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
22	1+050	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
23	1+100	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
24	1+150	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
25	1+200	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
26	1+250	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
27	1+300	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
28	1+350	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
29	1+400	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
30	1+450	FULL	6,00	-	5,50					
						Jumlah	**1.400,00**	**8.700,00**	**7.975,00**	m2

Pihak Dinas PUPR BID. BINA MARGA	Pihak Konsultan CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	Pihak Penyedia Jasa PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Staf Teknis	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : PENYIAPAN BADAN JALAN
Nomor Divisi : 3.3.(1)
Satuan : m2

NO	STA.	POSISI	DIMENSI				PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			DESAIN		USULAN CCO			DESAIN	CCO	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2				
										RUAS.02
1	1+450	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
2	1+500	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
3	1+550	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
4	1+600	FULL	6,00	-	5,50					
						5,50	50,00	300,00	275,00	
5	1+650	FULL	6,00	-	5,50					
						Jumlah	**200,00**	**1.200,00**	**1.100,00**	m2

Pihak Dinas PUPR BID. BINA MARGA	Pihak Konsultan CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	Pihak Penyedia Jasa PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Staf Teknis	Inspector	Manager Teknik

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS	:	**PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR	:	PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN	:	**Lapis Pondasi Agregat Kelas A**
SATUAN	:	m3
NO. DIV.	:	5.1.(1)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+915	s.d	2+300	FULL	1,385.00	831.00	861.84	**RUAS. 1**
2	2+300	s.d	3+700	FULL	1,400.00	840.00	878.25	
3	3+700	s.d	4+200	FULL	500.00	300.00	303.23	
JUMLAH					**3,285.00**	**1,971.00**	**2,043.32**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	1,831.16	m3
VOLUME USULAN CCO	.....	2,040.60	m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m3
MC UNTUK BULAN INI	.....	2,040.60	m3
MC SD BULAN INI	.....	2,040.60	m3
SISA VOLUME	.....	-	m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

NUSANTARA

PT.STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Nomor Divisi : 5.1.(1)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			CCO		TERPASANG					CCO	TERPASANG	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2				
												RUAS. 01
1	0+915	FULL	4,00	0,15	4,05		0,15					
						4,13		0,15	35,00	21,00	21,66	
2	0+950	FULL	4,00	0,15	4,20		0,15					
						4,13		0,15	50,00	30,00	30,94	
3	1+000	FULL	4,00	0,15	4,05		0,15					
						4,08		0,15	50,00	30,00	30,56	
4	1+050	FULL	4,00	0,15	4,10		0,15					
						4,10		0,15	50,00	30,00	30,75	
5	1+100	FULL	4,00	0,15	4,10		0,15					
						4,10		0,15	50,00	30,00	30,75	
6	1+150	FULL	4,00	0,15	4,10		0,15					
						4,05		0,15	50,00	30,00	30,38	
7	1+200	FULL	4,00	0,15	4,00		0,15					
						4,08		0,15	50,00	30,00	30,56	
8	1+250	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,13		0,15	50,00	30,00	30,94	
9	1+300	FULL	4,00	0,15	4,10		0,15					
						4,08		0,15	50,00	30,00	30,56	
10	1+350	FULL	4,00	0,15	4,05		0,15					
						4,13		0,15	50,00	30,00	30,94	
11	1+400	FULL	4,00	0,15	4,20		0,15					
						4,18		0,15	50,00	30,00	31,31	
12	1+450	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
13	1+500	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,20		0,15	50,00	30,00	31,50	
14	1+550	FULL	4,00	0,15	4,25		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
15	1+600	FULL	4,00	0,15	4,05		0,15					
						4,10		0,15	50,00	30,00	30,75	
16	1+650	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,10		0,15	50,00	30,00	30,75	
17	1+700	FULL	4,00	0,15	4,05		0,15					
						4,10		0,15	50,00	30,00	30,75	
18	1+750	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
19	1+800	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,05		0,15	50,00	30,00	30,38	
20	1+850	FULL	4,00	0,15	3,95		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
21	1+900	FULL	4,00	0,15	4,35		0,15					
						4,35		0,15	50,00	30,00	32,63	
22	1+950	FULL	4,00	0,15	4,35		0,15					
						4,30		0,15	50,00	30,00	32,25	
23	2+000	FULL	4,00	0,15	4,25		0,15					
						4,20		0,15	50,00	30,00	31,50	
24	2+050	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
25	2+100	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
26	2+150	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
27	2+200	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,20		0,15	50,00	30,00	31,50	
28	2+250	FULL	4,00	0,15	4,25		0,15					
						4,35		0,15	50,00	30,00	32,63	
29	2+300	FULL	4,00	0,15	4,45		0,15					
								Jumlah	**1.385,0**	**831,00**	**861,84**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Penyedia Jasa
Pengawas Teknis	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
NIP. 19671015 200801 1 004	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Nomor Divisi : 5.1.(1)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			CCO		TERPASANG					CCO	TERPASANG	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2				
												RUAS. 01
1	2+300	FULL	4,00	0,15	4,45		0,15					
						4,30		0,15	50,00	30,00	32,25	
2	2+350	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,30		0,15	50,00	30,00	32,25	
3	2+400	FULL	4,00	0,15	4,45		0,15					
						4,30		0,15	50,00	30,00	32,25	
4	2+450	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,10		0,15	50,00	30,00	30,75	
5	2+500	FULL	4,00	0,15	4,05		0,15					
						4,05		0,15	50,00	30,00	30,38	
6	2+550	FULL	4,00	0,15	4,05		0,15					
						4,10		0,15	50,00	30,00	30,75	
7	2+600	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
8	2+650	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
9	2+700	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,20		0,15	50,00	30,00	31,50	
10	2+750	FULL	4,00	0,15	4,25		0,15					
						4,20		0,15	50,00	30,00	31,50	
11	2+800	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
12	2+850	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
13	2+900	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
14	2+950	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,20		0,15	50,00	30,00	31,50	
15	3+000	FULL	4,00	0,15	4,25		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
16	3+050	FULL	4,00	0,15	4,05		0,15					
						4,10		0,15	50,00	30,00	30,75	
17	3+100	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
18	3+150	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
19	3+200	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,20		0,15	50,00	30,00	31,50	
20	3+250	FULL	4,00	0,15	4,25		0,15					
						4,25		0,15	50,00	30,00	31,88	
21	3+300	FULL	4,00	0,15	4,25		0,15					
						4,25		0,15	50,00	30,00	31,88	
22	3+350	FULL	4,00	0,15	4,25		0,15					
						4,25		0,15	50,00	30,00	31,88	
23	3+400	FULL	4,00	0,15	4,25		0,15					
						4,20		0,15	50,00	30,00	31,50	
24	3+450	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,25		0,15	50,00	30,00	31,88	
25	3+500	FULL	4,00	0,15	4,35		0,15					
						4,20		0,15	50,00	30,00	31,50	
26	3+550	FULL	4,00	0,15	4,05		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
27	3+600	FULL	4,00	0,15	4,25		0,15					
						4,20		0,15	50,00	30,00	31,50	
28	3+650	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,10		0,15	50,00	30,00	30,75	
29	3+700	FULL	4,00	0,15	4,05		0,15					
								Jumlah	**1.400,0**	**840,00**	**878,25**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Penyedia Jasa
Pengawas Teknis	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
NIP. 19671015 200801 1 004	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Nomor Divisi : 5.1.(1)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			CCO		TERPASANG					CCO	TERPASANG	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2				
												RUAS. 01
1	3+700	FULL	4,00	0,15	4,05		0,15					
						4,15		0,15	50,00	30,00	31,13	
2	3+750	FULL	4,00	0,15	4,25		0,15					
						4,20		0,15	50,00	30,00	31,50	
3	3+800	FULL	4,00	0,15	4,15		0,15					
						4,10		0,15	50,00	30,00	30,75	
4	3+850	FULL	4,00	0,15	4,05		0,15					
						4,00		0,15	50,00	30,00	30,00	
5	3+900	FULL	4,00	0,15	3,95		0,15					
						3,95		0,15	50,00	30,00	29,63	
6	3+950	FULL	4,00	0,15	3,95		0,15					
						3,95		0,15	50,00	30,00	29,63	
7	4+000	FULL	4,00	0,15	3,95		0,15					
						4,00		0,15	50,00	30,00	30,00	
8	4+050	FULL	4,00	0,15	4,05		0,15					
						4,03		0,15	50,00	30,00	30,19	
9	4+100	FULL	4,00	0,15	4,00		0,15					
						4,02		0,15	50,00	30,00	30,11	
10	4+150	FULL	4,00	0,15	4,03		0,15					
						4,04		0,15	50,00	30,00	30,30	
11	4+200	FULL	4,00	0,15	4,05		0,15					
								Jumlah	**500,0**	**300,00**	**303,23**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Penyedia Jasa
Pengawas Teknis	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
NIP. 19671015 200801 1 004	Inspector	Manager Teknik

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Lapis Pondasi Agregat Kelas A**
SATUAN : m3
NO. DIV. : 5.1.(1)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+000	s.d	1+400	FULL	1,400.00	945.00	956.85	**RUAS. 2**
2	1+400	s.d	1+650	FULL	250.00	168.75	169.50	
JUMLAH					**1,650.00**	**1,113.75**	**1,126.35**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	1,080.00	m3
VOLUME USULAN CCO	.....	1,113.75	m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m3
MC UNTUK BULAN INI	.....	1,113.75	m3
MC SD BULAN INI	.....	1,113.75	m3
SISA VOLUME	.....	-	m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

NUSANTARA

PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Nomor Divisi : 5.1.(1)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			CCO		TERPASANG					CCO	TERPASANG	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2				
												RUAS. 02
1	0+000	FULL	4,50	0,15	4,70		0,15					
						4,60		0,15	50,00	33,75	34,50	
2	0+050	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,55		0,15	50,00	33,75	34,13	
3	0+100	FULL	4,50	0,15	4,60		0,15					
						4,55		0,15	50,00	33,75	34,13	
4	0+150	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,50		0,15	50,00	33,75	33,75	
5	0+200	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,50		0,15	50,00	33,75	33,75	
6	0+250	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,55		0,15	50,00	33,75	34,13	
7	0+300	FULL	4,50	0,15	4,60		0,15					
						4,58		0,15	50,00	33,75	34,31	
8	0+350	FULL	4,50	0,15	4,55		0,15					
						4,53		0,15	50,00	33,75	33,94	
9	0+400	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,55		0,15	50,00	33,75	34,13	
10	0+450	FULL	4,50	0,15	4,60		0,15					
						4,60		0,15	50,00	33,75	34,50	
11	0+500	FULL	4,50	0,15	4,60		0,15					
						4,55		0,15	50,00	33,75	34,13	
12	0+550	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,50		0,15	50,00	33,75	33,75	
13	0+600	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,50		0,15	50,00	33,75	33,75	
14	0+650	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,50		0,15	50,00	33,75	33,75	
15	0+700	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,50		0,15	50,00	33,75	33,75	
16	0+750	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,50		0,15	50,00	33,75	33,75	
17	0+800	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,50		0,15	50,00	33,75	33,75	
18	0+850	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,58		0,15	50,00	33,75	34,31	
19	0+900	FULL	4,50	0,15	4,65		0,15					
						4,63		0,15	50,00	33,75	34,69	
20	0+950	FULL	4,50	0,15	4,60		0,15					
						4,62		0,15	50,00	33,75	34,61	
21	1+000	FULL	4,50	0,15	4,63		0,15					
						4,62		0,15	50,00	33,75	34,61	
22	1+050	FULL	4,50	0,15	4,60		0,15					
						4,60		0,15	50,00	33,75	34,50	
23	1+100	FULL	4,50	0,15	4,60		0,15					
						4,60		0,15	50,00	33,75	34,50	
24	1+150	FULL	4,50	0,15	4,60		0,15					
						4,63		0,15	50,00	33,75	34,69	
25	1+200	FULL	4,50	0,15	4,60		0,15					
						4,63		0,15	50,00	33,75	34,69	
26	1+250	FULL	4,50	0,15	4,65		0,15					
						4,55		0,15	50,00	33,75	34,13	
27	1+300	FULL	4,50	0,15	4,60		0,15					
						4,50		0,15	50,00	33,75	33,75	
28	1+350	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
29	1+400	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
								Jumlah	**1.400,0**	**945,00**	**956,85**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Penyedia Jasa
Pengawas Teknis	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
NIP. 19671015 200801 1 004	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Nomor Divisi : 5.1.(1)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			CCO		TERPASANG					CCO	TERPASANG	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2				
												RUAS. 02
1	1+400	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,50		0,15	50,00	33,75	33,75	
2	1+450	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,50		0,15	50,00	33,75	33,75	
3	1+500	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,50		0,15	50,00	33,75	33,75	
4	1+550	FULL	4,50	0,15	4,50		0,15					
						4,53		0,15	50,00	33,75	33,94	
5	1+600	FULL	4,50	0,15	4,55		0,15					
						4,58		0,15	50,00	33,75	34,31	
6	1+650	FULL	4,50	0,15	4,60		0,15					
								Jumlah	**250,0**	**168,75**	**169,50**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Penyedia Jasa
Pengawas Teknis	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
NIP. 19671015 200801 1 004	Inspector	Manager Teknik

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS	:	**PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR	:	PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN	:	**Lapis Pondasi Agregat Kelas B**
SATUAN	:	m3
NO. DIV.	:	5.1.(2)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+915	*s.d*	1+750	Kanan	835.00	219.19	229.13	**RUAS. 1**
2	2+000	s.d	3+400	Full	1,400.00	1,260.00	1,291.16	
3	3+400	*s.d*	4+212	Full	812.00	730.80	711.16	
JUMLAH					**3,047.00**	**2,210.63**	**2,231.45**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	2,080.82	m3
VOLUME USULAN CCO	.....	2,210.63	m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m3
MC UNTUK BULAN INI	.....	2,210.63	m3
MC SD BULAN INI	.....	2,210.63	m3
SISA VOLUME	.....	-	m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

NUSANTARA

PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Nomor Divisi : 5.1.(2)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			RENCANA		USULAN CCO					RENCANA	USULAN CCO	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2				
												RUAS. 01
1	2+000	FULL	6,00	0,15	6,52	6,35	0,15	0,15	50,00	45,00	47,59	
2	2+050	FULL	6,00	0,15	6,17	6,54	0,15	0,15	50,00	45,00	49,01	
3	2+100	FULL	6,00	0,15	6,90	6,83	0,15	0,15	50,00	45,00	51,23	
4	2+150	FULL	6,00	0,15	6,76	6,59	0,15	0,15	50,00	45,00	49,43	
5	2+200	FULL	6,00	0,15	6,42	6,50	0,15	0,15	50,00	45,00	48,71	
6	2+250	FULL	6,00	0,15	6,57	6,45	0,15	0,15	50,00	45,00	48,38	
7	2+300	FULL	6,00	0,15	6,33	6,29	0,15	0,15	50,00	45,00	47,14	
8	2+350	FULL	6,00	0,15	6,24	6,52	0,15	0,15	50,00	45,00	48,90	
9	2+400	FULL	6,00	0,15	6,80	6,66	0,15	0,15	50,00	45,00	49,95	
10	2+450	FULL	6,00	0,15	6,52	6,17	0,15	0,15	50,00	45,00	46,28	
11	2+500	FULL	6,00	0,15	5,82	5,97	0,15	0,15	50,00	45,00	44,74	
12	2+550	FULL	6,00	0,15	6,11	6,22	0,15	0,15	50,00	45,00	46,61	
13	2+600	FULL	6,00	0,15	6,32	6,14	0,15	0,15	50,00	45,00	46,01	
14	2+650	FULL	6,00	0,15	5,95	6,00	0,15	0,15	50,00	45,00	45,00	
15	2+700	FULL	6,00	0,15	6,05	6,10	0,15	0,15	50,00	45,00	45,71	
16	2+750	FULL	6,00	0,15	6,14	6,00	0,15	0,15	50,00	45,00	44,96	
17	2+800	FULL	6,00	0,15	5,85	5,90	0,15	0,15	50,00	45,00	44,25	
18	2+850	FULL	6,00	0,15	5,95	5,94	0,15	0,15	50,00	45,00	44,55	
19	2+900	FULL	6,00	0,15	5,93	5,87	0,15	0,15	50,00	45,00	43,99	
20	2+950	FULL	6,00	0,15	5,80	5,63	0,15	0,15	50,00	45,00	42,19	
21	3+000	FULL	6,00	0,15	5,45	5,57	0,15	0,15	50,00	45,00	41,74	
22	3+050	FULL	6,00	0,15	5,68	5,77	0,15	0,15	50,00	45,00	43,24	
23	3+100	FULL	6,00	0,15	5,85	5,98	0,15	0,15	50,00	45,00	44,81	
24	3+150	FULL	6,00	0,15	6,10	6,09	0,15	0,15	50,00	45,00	45,64	
25	3+200	FULL	6,00	0,15	6,07	6,11	0,15	0,15	50,00	45,00	45,79	
26	3+250	FULL	6,00	0,15	6,14	6,17	0,15	0,15	50,00	45,00	46,28	
27	3+300	FULL	6,00	0,15	6,20	6,03	0,15	0,15	50,00	45,00	45,19	
28	3+350	FULL	6,00	0,15	5,85	5,85	0,15	0,15	50,00	45,00	43,88	
29	3+400	FULL	6,00	0,15	5,85							
								Jumlah	**1.400,0**	**1.260,00**	**1.291,16**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Penyedia Jasa
Pengawas Teknis	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
NIP. 19671015 200801 1 004	Inspector	Manager Teknik

NUSANTARA

PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Nomor Divisi : 5.1.(2)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			DESAIN		USULAN CCO					DESAIN	USULAN CCO	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2				
												RUAS. 01
1	3+400	FULL	6,00	0,15	5,85	5,93	0,15	0,15	50,00	45,00	44,44	
2	3+450	FULL	6,00	0,15	6,00	5,94	0,15	0,15	50,00	45,00	44,55	
3	3+500	FULL	6,00	0,15	5,88	5,79	0,15	0,15	50,00	45,00	43,43	
4	3+550	FULL	6,00	0,15	5,70	5,80	0,15	0,15	50,00	45,00	43,50	
5	3+600	FULL	6,00	0,15	5,90	5,78	0,15	0,15	50,00	45,00	43,31	
6	3+650	FULL	6,00	0,15	5,65	5,75	0,15	0,15	50,00	45,00	43,13	
7	3+700	FULL	6,00	0,15	5,85	6,03	0,15	0,15	50,00	45,00	45,19	
8	3+750	FULL	6,00	0,15	6,20	6,11	0,15	0,15	50,00	45,00	45,83	
9	3+800	FULL	6,00	0,15	6,02	5,93	0,15	0,15	50,00	45,00	44,44	
10	3+850	FULL	6,00	0,15	5,83	5,66	0,15	0,15	50,00	45,00	42,41	
11	3+900	FULL	6,00	0,15	5,48	5,55	0,15	0,15	50,00	45,00	41,63	
12	3+950	FULL	6,00	0,15	5,62	5,84	0,15	0,15	50,00	45,00	43,76	
13	4+000	FULL	6,00	0,15	6,05	5,93	0,15	0,15	50,00	45,00	44,44	
14	4+050	FULL	6,00	0,15	5,80	5,77	0,15	0,15	50,00	45,00	43,24	
15	4+100	FULL	6,00	0,15	5,73	5,74	0,15	0,15	50,00	45,00	43,01	
16	4+150	FULL	6,00	0,15	5,74	5,90	0,15	0,15	62,00	55,80	54,87	
17	4+212	FULL	6,00	0,15	6,06							
								Jumlah	**812,0**	**730,80**	**711,16**	m3

Pihak Dinas PUPR
Pengawas Teknis

AW. Hangdika
NIP. 19671015 200801 1 004

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmond, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Nomor Divisi : 5.1.(2)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			CCO		TERPASANG					CCO	TERPASANG	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2				
												RUAS. 02
1	0+000	FULL	5,45	0,15	5,30	5,40	0,15	0,15	50,00	40,88	40,50	
2	0+050	FULL	5,45	0,15	5,50	5,49	0,15	0,15	50,00	40,88	41,18	
3	0+100	FULL	5,45	0,15	5,48	5,44	0,15	0,15	50,00	40,88	40,80	
4	0+150	FULL	5,45	0,15	5,40	5,40	0,15	0,15	50,00	40,88	40,50	
5	0+200	FULL	5,45	0,15	5,40	5,48	0,15	0,15	50,00	40,88	41,06	
6	0+250	FULL	5,45	0,15	5,55	5,53	0,15	0,15	50,00	40,88	41,44	
7	0+300	FULL	5,45	0,15	5,50	5,50	0,15	0,15	50,00	40,88	41,25	
8	0+350	FULL	5,45	0,15	5,50	5,48	0,15	0,15	50,00	40,88	41,06	
9	0+400	FULL	5,45	0,15	5,45	5,45	0,15	0,15	50,00	40,88	40,88	
10	0+450	FULL	5,45	0,15	5,45	5,23	0,15	0,15	50,00	40,88	39,19	
11	0+500	FULL	5,45	0,15	5,00	5,00	0,15	0,15	50,00	40,88	37,50	
12	0+550	FULL	5,45	0,15	5,00	5,25	0,15	0,15	50,00	40,88	39,38	
13	0+600	FULL	5,45	0,15	5,50	5,43	0,15	0,15	50,00	40,88	40,69	
14	0+650	FULL	5,45	0,15	5,35	5,43	0,15	0,15	50,00	40,88	40,69	
15	0+700	FULL	5,45	0,15	5,50	5,48	0,15	0,15	50,00	40,88	41,06	
16	0+750	FULL	5,45	0,15	5,45	5,43	0,15	0,15	50,00	40,88	40,69	
17	0+800	FULL	5,45	0,15	5,40	5,44	0,15	0,15	50,00	40,88	40,80	
18	0+850	FULL	5,45	0,15	5,48	5,49	0,15	0,15	50,00	40,88	41,18	
19	0+900	FULL	5,45	0,15	5,50	5,48	0,15	0,15	50,00	40,88	41,06	
20	0+950	FULL	5,45	0,15	5,45	5,48	0,15	0,15	50,00	40,88	41,06	
21	1+000	FULL	5,45	0,15	5,50	5,50	0,15	0,15	50,00	40,88	41,25	
22	1+050	FULL	5,45	0,15	5,50	5,45	0,15	0,15	50,00	40,88	40,88	
23	1+100	FULL	5,45	0,15	5,40	5,45	0,15	0,15	50,00	40,88	40,88	
24	1+150	FULL	5,45	0,15	5,50	5,50	0,15	0,15	50,00	40,88	41,25	
25	1+200	FULL	5,45	0,15	5,50	5,48	0,15	0,15	50,00	40,88	41,06	
26	1+250	FULL	5,45	0,15	5,45	5,45	0,15	0,15	50,00	40,88	40,88	
27	1+300	FULL	5,45	0,15	5,45	5,48	0,15	0,15	50,00	40,88	41,06	
28	1+350	FULL	5,45	0,15	5,50	5,50	0,15	0,15	50,00	40,88	41,25	
29	1+400	FULL	5,45	0,15	5,50							
								Jumlah	**1.400,0**	**1.144,50**	**1.140,45**	m3

Pihak Dinas PUPR
Pengawas Teknis

AW. Hangdika
NIP. 19671015 200801 1 004

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Nomor Divisi : 5.1.(2)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			DESAIN		USULAN CCO					DESAIN	USULAN CCO	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2				
												RUAS. 02
1	1+400	FULL	5,45	0,15	5,50	5,47	0,15	0,15	50,00	40,88	40,99	
2	1+450	FULL	5,45	0,15	5,43	5,44	0,15	0,15	50,00	40,88	40,80	
3	1+500	FULL	5,45	0,15	5,45	5,48	0,15	0,15	50,00	40,88	41,06	
4	1+550	FULL	5,45	0,15	5,50	5,50	0,15	0,15	50,00	40,88	41,25	
5	1+600	FULL	5,45	0,15	5,50	5,48	0,15	0,15	50,00	40,88	41,06	
6	1+650	FULL	5,45	0,15	5,45		0,15					
								Jumlah	**250,0**	**204,38**	**205,16**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Penyedia Jasa
Pengawas Teknis	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
NIP. 19671015 200801 1 004	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Nomor Divisi : 5.1.(2)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			DESAIN		USULAN CCO					DESAIN	USULAN CCO	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2				
												RUAS. 01
1	0+915	FULL	1,75	0,15	1,80		0,15					
						1,85		0,15	35,00	9,19	9,71	
2	0+950	FULL	1,75	0,15	1,90		0,15					
						1,85		0,15	50,00	13,13	13,88	
3	1+000	FULL	1,75	0,15	1,80		0,15					
						1,78		0,15	50,00	13,13	13,31	
4	1+050	FULL	1,75	0,15	1,75		0,15					
						1,78		0,15	50,00	13,13	13,31	
5	1+100	FULL	1,75	0,15	1,80		0,15					
						1,80		0,15	50,00	13,13	13,50	
6	1+150	FULL	1,75	0,15	1,80		0,15					
						1,80		0,15	50,00	13,13	13,50	
7	1+200	FULL	1,75	0,15	1,80		0,15					
						1,88		0,15	50,00	13,13	14,06	
8	1+250	FULL	1,75	0,15	1,95		0,15					
						1,93		0,15	50,00	13,13	14,44	
9	1+300	FULL	1,75	0,15	1,90		0,15					
						1,95		0,15	50,00	13,13	14,63	
10	1+350	FULL	1,75	0,15	2,00		0,15					
						2,00		0,15	50,00	13,13	15,00	
11	1+400	FULL	1,75	0,15	2,00		0,15					
						1,88		0,15	50,00	13,13	14,06	
12	1+450	FULL	1,75	0,15	1,75		0,15					
						1,73		0,15	50,00	13,13	12,94	
13	1+500	FULL	1,75	0,15	1,70		0,15					
						1,75		0,15	50,00	13,13	13,13	
14	1+550	FULL	1,75	0,15	1,80		0,15					
						1,80		0,15	50,00	13,13	13,50	
15	1+600	FULL	1,75	0,15	1,80		0,15					
						1,79		0,15	50,00	13,13	13,43	
16	1+650	FULL	1,75	0,15	1,78		0,15					
						1,79		0,15	50,00	13,13	13,43	
17	1+700	FULL	1,75	0,15	1,80		0,15					
						1,78		0,15	50,00	13,13	13,31	
18	1+750	FULL	1,75	0,15	1,75		0,15					
								Jumlah	**835,0**	**219,19**	**229,13**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Penyedia Jasa
Pengawas Teknis	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
NIP. 19671015 200801 1 004	Inspector	Manager Teknik

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS	:	**PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR	:	PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN	:	**Lapis Pondasi Agregat Kelas B**
SATUAN	:	m3
NO. DIV.	:	5.1.(2)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+000	s.d	1+400	FULL	1,400.00	1,144.50	1,140.45	**RUAS. 2**
2	1+400	s.d	1+650	FULL	250.00	204.38	205.16	
JUMLAH					**1,650.00**	**1,350.88**	**1,347.61**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	1,440.00	m3
VOLUME USULAN CCO	.....	1,346.25	m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m3
MC UNTUK BULAN INI	.....	1,346.25	m3
MC SD BULAN INI	.....	1,346.25	m3
SISA VOLUME	.....	-	m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

NUSANTARA

PT.STAR MITRA SULAWESI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air**
SATUAN : m3
NO. DIV. : 2.1.(1)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+950	s.d	2+200	Kanan	1,250.00	428.40	428.40	
2	2+200	s.d	3+400	Kanan	1,200.00	449.85	449.85	
3	3+400	s.d	4+200	Kanan	800.00	370.75	370.75	
JUMLAH					**3,250.00**	**1,249.00**	**1,249.00**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	2,807.57	m3
VOLUME USULAN CCO	.....	1,249.00	m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m3
MC UNTUK BULAN INI	.....	1,249.00	m3
MC SD BULAN INI	.....	1,249.00	m3
SISA VOLUME	.....	-	m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

NUSANTARA

PT.STAR MITRA SULAWESI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS	:	**PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR	:	PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN	:	**Pasangan Batu dengan Mortar**
SATUAN	:	m3
NO. DIV.	:	2.2.(1)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+950	s.d	1+100	KANAN	150.0	85.38	83.61	
2	1+100	s.d	1+250	KANAN	150.0	85.38	96.10	
3	1+250	s.d	1+400	KANAN	150.0	85.38	91.54	
4	1+400	s.d	1+550	KANAN	150.0	85.38	94.55	
5	1+550	s.d	1+700	KANAN	150.0	85.38	95.49	
6	1+700	s.d	1+850	KANAN	150.0	85.38	95.18	
7	1+850	s.d	2+450	KANAN	600.0	87.69	85.93	
8	2+450	s.d	2+600	KANAN	150.0	85.38	85.55	
9	2+600	s.d	2+740	KANAN	140.0	80.75	79.74	
10	2+750	s.d	2+890	KANAN	140.0	80.75	81.26	
11	2+890	s.d	3+030	KANAN	140.0	80.75	80.19	
12	3+030	s.d	3+170	KANAN	140.0	80.75	79.88	
13	3+170	s.d	3+360	KANAN	190.0	60.13	59.08	
14	3+360	s.d	3+510	KANAN	150.0	85.38	82.70	
15	3+510	s.d	3+660	KANAN	150.0	69.38	69.27	
16	3+660	s.d	3+810	KANAN	150.0	69.38	69.76	
17	3+810	s.d	3+852	KANAN	42.0	19.43	19.28	
JUMLAH					**2,742.0**	**1,311.99**	**1,349.07**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	1,755.01	m3
VOLUME USULAN CCO	.....	1,755.01	m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m3
MC UNTUK BULAN INI	.....	1,755.01	m3
MC SD BULAN INI	.....	1,755.01	m3
SISA VOLUME	.....	-	m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Pasangan Batu dengan Mortar**
SATUAN : m3
NO. DIV. : 2.2.(1)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	1+930	s.d	2+080	KANAN	150.0	87.56	94.14	
2	2+080	s.d	2+340	KANAN	224.0	122.00	140.12	
3	2+340	s.d	3+252	KANAN	87.0	50.79	59.69	
4	3+852	s.d	4+210	KANAN	358.0	208.98	245.24	
5		s.d						
6		s.d						
7		s.d						
8		s.d						
9		s.d						
10		s.d						
JUMLAH					**669.0**	**469.34**	**539.19**	

VOLUME KONTRAK AWAL 1,755.01 m3
VOLUME USULAN CCO 1,755.01 m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU ..... - m3
MC UNTUK BULAN INI 1,755.01 m3
MC SD BULAN INI 1,755.01 m3
SISA VOLUME ..... - m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

NUSANTARA
PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Nomor Divisi : 5.1.(2)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			CCO		TERPASANG					CCO	TERPASANG	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2				
												RUAS. 02
1	0+000	FULL	5,45	0,15	5,30		0,15					
						5,40		0,15	50,00	40,88	40,50	
2	0+050	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
						5,49		0,15	50,00	40,88	41,18	
3	0+100	FULL	5,45	0,15	5,48		0,15					
						5,44		0,15	50,00	40,88	40,80	
4	0+150	FULL	5,45	0,15	5,40		0,15					
						5,40		0,15	50,00	40,88	40,50	
5	0+200	FULL	5,45	0,15	5,40		0,15					
						5,48		0,15	50,00	40,88	41,06	
6	0+250	FULL	5,45	0,15	5,55		0,15					
						5,53		0,15	50,00	40,88	41,44	
7	0+300	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
						5,50		0,15	50,00	40,88	41,25	
8	0+350	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
						5,48		0,15	50,00	40,88	41,06	
9	0+400	FULL	5,45	0,15	5,45		0,15					
						5,45		0,15	50,00	40,88	40,88	
10	0+450	FULL	5,45	0,15	5,45		0,15					
						5,23		0,15	50,00	40,88	39,19	
11	0+500	FULL	5,45	0,15	5,00		0,15					
						5,00		0,15	50,00	40,88	37,50	
12	0+550	FULL	5,45	0,15	5,00		0,15					
						5,25		0,15	50,00	40,88	39,38	
13	0+600	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
						5,43		0,15	50,00	40,88	40,69	
14	0+650	FULL	5,45	0,15	5,35		0,15					
						5,43		0,15	50,00	40,88	40,69	
15	0+700	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
						5,48		0,15	50,00	40,88	41,06	
16	0+750	FULL	5,45	0,15	5,45		0,15					
						5,43		0,15	50,00	40,88	40,69	
17	0+800	FULL	5,45	0,15	5,40		0,15					
						5,44		0,15	50,00	40,88	40,80	
18	0+850	FULL	5,45	0,15	5,48		0,15					
						5,49		0,15	50,00	40,88	41,18	
19	0+900	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
						5,48		0,15	50,00	40,88	41,06	
20	0+950	FULL	5,45	0,15	5,45		0,15					
						5,48		0,15	50,00	40,88	41,06	
21	1+000	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
						5,50		0,15	50,00	40,88	41,25	
22	1+050	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
						5,45		0,15	50,00	40,88	40,88	
23	1+100	FULL	5,45	0,15	5,40		0,15					
						5,45		0,15	50,00	40,88	40,88	
24	1+150	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
						5,50		0,15	50,00	40,88	41,25	
25	1+200	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
						5,48		0,15	50,00	40,88	41,06	
26	1+250	FULL	5,45	0,15	5,45		0,15					
						5,45		0,15	50,00	40,88	40,88	
27	1+300	FULL	5,45	0,15	5,45		0,15					
						5,48		0,15	50,00	40,88	41,06	
28	1+350	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
						5,50		0,15	50,00	40,88	41,25	
29	1+400	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
								Jumlah	**1.400,0**	**1.144,50**	**1.140,45**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Penyedia Jasa
Pengawas Teknis	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AWI Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
NIP. 19671015 200801 1 004	Inspector	Manager Teknik

NUSANTARA

PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Nomor Divisi : 5.1.(2)
Satuan : m3

NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
			DESAIN		USULAN CCO					DESAIN	USULAN CCO	
			Lebar	Tebal	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2				
												RUAS. 02
1	1+400	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
						5,47		0,15	50,00	40,88	40,99	
2	1+450	FULL	5,45	0,15	5,43		0,15					
						5,44		0,15	50,00	40,88	40,80	
3	1+500	FULL	5,45	0,15	5,45		0,15					
						5,48		0,15	50,00	40,88	41,06	
4	1+550	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
						5,50		0,15	50,00	40,88	41,25	
5	1+600	FULL	5,45	0,15	5,50		0,15					
						5,48		0,15	50,00	40,88	41,06	
6	1+650	FULL	5,45	0,15	5,45		0,15					
								Jumlah	**250,0**	**204,38**	**205,16**	m3

Pihak Dinas PUPR	Pihak Konsultan	Penyedia Jasa
Pengawas Teknis	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
NIP. 19671015 200801 1 004	Inspector	Manager Teknik

NUSANTARA

PT. STAR MITRA SULAWESI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi**
SATUAN : Ltr
NO. DIV. : 6.1 (1)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+900	s.d	2+050	FULL	1,275.00	3,680.00	3,680.00	**RUAS. 1**
2	2+050	s.d	3+500	FULL	1,450.00	4,640.00	4,640.00	
3	3+500	s.d	4+200	FULL	700.00	2,240.00	2,240.00	
1	0+000	s.d	1+450	FULL	1,450.00	4,872.00	4,872.00	**RUAS. 2**
2	1+450	s.d	1+650	FULL	200.00	672.00	672.00	
JUMLAH					**5,075.00**	**16,104.00**	**16,104.00**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	15,596.56	Ltr
VOLUME USULAN CCO	.....	16,080.00	Ltr

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	Ltr
MC UNTUK BULAN INI	.....	16,080.00	Ltr
MC SD BULAN INI	.....	16,080.00	Ltr
SISA VOLUME	.....	-	Ltr

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
SULAN, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

NUSANTARA

PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

NAMA PAKET : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**

KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI

KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi**

SATUAN Liter

NO. DIV. : 6.1.(1)

NO	KM.	POSISI	CCO		TERPASANG		PANJANG	Ltr/m				VOLUME		KETERANGAN
			LBR	INDEKS	LBR	INDEKS		CCO	RATA2	PASANG	RATA2	CCO	PASANG	
														RUAS. 01
1	0 + 900	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
2	0 + 950	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
3	1 + 000	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
4	1 + 050	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
5	1 + 100	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
6	1 + 150	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
7	1 + 200	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
8	1 + 250	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
9	1 + 300	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
10	1 + 350	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
11	1 + 400	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
12	1 + 450	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
13	1 + 500	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
14	1 + 550	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
15	1 + 600	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
16	1 + 650	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
17	1 + 700	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
18	1 + 750	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
19	1 + 800	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
20	1 + 850	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
21	1 + 900	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
22	1 + 950	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
23	2 + 000	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80	50,00	3,20	3,20	3,20	3,20	160,00	160,00	
24	2 + 050	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
JUMLAH							**1.275,0**					**3.680,0**	**3.680,0**	

Pihak Dinas PUPR
Pihak Staf Teknis Dinas PU

AW. HANGDIKA
Pengawas Lapangan

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ASMA HENDRA, ST
Inspector

Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

SUDARMONO, ST
Manger Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

NAMA PAKET : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**

KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI

KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi

SATUAN Liter

NO. DIV. : 6.1.(1)

NO	KM.	POSISI	CCO		TERPASANG		PANJANG	Ltr/m				VOLUME		KETERANGAN
			LBR	INDEKS	LBR	INDEKS		CCO	RATA2	PASANG	RATA2	CCO	PASANG	
														RUAS. 01
1	2 + 050	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
2	2 + 100	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
3	2 + 150	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
4	2 + 200	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
5	2 + 250	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
6	2 + 300	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
7	2 + 350	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
8	2 + 400	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
9	2 + 450	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
10	2 + 500	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
11	2 + 550	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
12	2 + 600	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
13	2 + 650	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
14	2 + 700	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
15	2 + 750	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
16	2 + 800	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
17	2 + 850	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
18	2 + 900	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
19	2 + 950	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
20	3 + 000	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
21	3 + 050	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
22	3 + 100	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
23	3 + 150	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
24	3 + 200	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
25	3 + 250	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
26	3 + 300	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
27	3 + 350	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
28	3 + 400	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
29	3 + 450	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,0	160,0	
30	3 + 500	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
JUMLAH							**1.450,0**					**4.640,0**	**4.640,0**	

Pihak Dinas PUPR
Pihak Staf Teknis Dinas PU

AW. HANGDIKA
Pengawas Lapangan

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ASMA HENDRA, ST
Inspector

Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

SUDARMONO, ST
Manger Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

NAMA PAKET : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**

KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI

KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi

SATUAN Liter

NO. DIV. : 6.1.(1)

NO	KM.	POSISI	CCO		TERPASANG		PANJANG	Ltr/m				VOLUME		KETERANGAN
			LBR	INDEKS	LBR	INDEKS		CCO	RATA2	PASANG	RATA2	CCO	PASANG	
														RUAS. 01
1	3 + 500	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
2	3 + 550	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
3	3 + 600	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
4	3 + 650	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
5	3 + 700	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
6	3 + 750	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
7	3 + 800	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
8	3 + 850	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
9	3 + 900	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
10	3 + 950	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
11	4 + 000	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
12	4 + 050	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
13	4 + 100	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
14	4 + 150	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
							50,00		3,20		3,20	160,00	160,00	
15	4 + 200	FULL	4,00	0,80	4,00	0,80		3,20		3,20				
JUMLAH							**700,0**					**2.240,0**	**2.240,0**	

Pihak Dinas PUPR Pihak Staf Teknis Dinas PU	Pihak Konsultan CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	Penyedia Jasa PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. HANGDIKA Pengawas Lapangan	ASMA HENDRA, ST Inspector	SUDARMONO, ST Manger Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

NAMA PAKET : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**

KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI

KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi**

SATUAN Liter

NO. DIV. : 6.1.(1)

NO	KM.	POSISI	CCO		TERPASANG		PANJANG	Ltr/m				VOLUME		KETERANGAN
			LBR	INDEKS	LBR	INDEKS		CCO	RATA2	PASANG	RATA2	CCO	PASANG	
														RUAS. 02
1	0 + 000	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
2	0 + 050	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
3	0 + 100	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
4	0 + 150	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
5	0 + 200	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
6	0 + 250	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
7	0 + 300	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
8	0 + 350	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
9	0 + 400	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
10	0 + 450	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
11	0 + 500	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
12	0 + 550	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
13	0 + 600	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
14	0 + 650	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
15	0 + 700	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
16	0 + 750	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
17	0 + 800	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
18	0 + 850	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
19	0 + 900	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
20	0 + 950	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
21	1 + 000	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
22	1 + 050	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
23	1 + 100	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
24	1 + 150	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
25	1 + 200	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
26	1 + 250	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
27	1 + 300	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
28	1 + 350	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
29	1 + 400	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
30	1 + 450	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
JUMLAH							**1.450,0**					**4.872,0**	**4.872,0**	

Pihak Dinas PUPR Pihak Staf Teknis Dinas PU	Pihak Konsultan CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	Penyedia Jasa PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. HANGDIKA Pengawas Lapangan	ASMA HENDRA, ST Inspector	SUDARMONO, ST Manger Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

NAMA PAKET : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**

KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI

KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi

SATUAN Liter

NO. DIV. : 6.1.(1)

NO	KM.	POSISI	CCO		TERPASANG		PANJANG	Ltr/m				VOLUME		KETERANGAN
			LBR	INDEKS	LBR	INDEKS		CCO	RATA2	PASANG	RATA2	CCO	PASANG	
														RUAS. 02
1	1 + 450	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
2	1 + 500	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
3	1 + 550	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
4	1 + 600	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
							50,00		3,36		3,36	168,00	168,00	
5	1 + 650	FULL	4,20	0,80	4,20	0,80		3,36		3,36				
JUMLAH							**200,0**					**672,0**	**672,0**	

Pihak Dinas PUPR
Pihak Staf Teknis Dinas PU

AW. HANGDIKA
Pengawas Lapangan

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ASMA HENDRA, ST
Inspector

Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

SUDARMONO, ST
Manger Teknik

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS	:	**PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR	:	PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN	:	**Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)**
SATUAN	:	Ton
NO. DIV.	:	6.5.(2)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+900	s.d	1+550	FULL	650.00	356.87	394.71	**RUAS. 1**
2	1+550	s.d	2+200	FULL	650.00	356.87	389.95	
3	2+200	s.d	2+850	FULL	650.00	356.87	408.98	
4	2+850	s.d	3+500	FULL	650.00	356.87	391.30	
5	3+500	s.d	4+200	FULL	700.00	356.87	617.44	
JUMLAH					**3,300.00**	**1,784.33**	**2,202.38**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	1,671.47	Ton
VOLUME USULAN CCO	.....	1,842.21	Ton

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	Ton
MC UNTUK BULAN INI	.....	1,842.21	Ton
MC SD BULAN INI	.....	1,842.21	Ton
SISA VOLUME	.....	-	Ton

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

NUSANTARA

PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

NAMA PAKET : **PEMBANGUNAN JALAN**
NAMA RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN : **Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)**
NO. ITEM : 6.5.(2)
SATUAN : Ton

NO	STATION	Posisi	CCO				TERPASANG				Panjang	Density	Rata2	Kadar Aspal Minyak	Rata2	Aspal Minyak (Ton)	RUAS 01 : DESA KAWATA				RUAS . 01		KET.
																	Volume (Ton)		Aditif (Kg)		AC - BC (Ton)		
			Lebar	Rata2	Tebal	Rata2	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2							RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	
1	0+900	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,2	0,060	0,062	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,61	0,005	0,005	27,451	29,608	
2	0+950	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,25	4,2	0,064	0,062	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,61	0,005	0,005	27,451	29,608	
3	1+000	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,1	0,060	0,062	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,02	0,005	0,005	27,451	29,017	
4	1+050	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,15	4,2	0,063	0,064	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,38	0,005	0,005	27,451	30,380	
5	1+100	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,15	4,2	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,86	0,005	0,005	27,451	30,855	
6	1+150	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,15	4,1	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,49	0,005	0,005	27,451	30,483	
7	1+200	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,05	4,1	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,67	0,005	0,005	27,451	30,669	
8	1+250	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,065	0,064	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,57	0,005	0,005	27,451	30,563	
9	1+300	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,15	4,1	0,063	0,064	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,20	0,005	0,005	27,451	30,197	
10	1+350	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,2	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	31,05	0,005	0,005	27,451	31,041	
11	1+400	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,25	4,2	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	31,42	0,005	0,005	27,451	31,412	
12	1+450	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	31,23	0,005	0,005	27,451	31,226	
13	1+500	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,3	0,065	0,061	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,66	0,005	0,005	27,451	29,653	
14	1+550	FULL	4,0		0,06		4,30		0,057			2,288		0,058									
JUMLAH											**650,0**					20,702	356,93	394,77	0,062	0,062	**356,866**	**394,711**	TON
																			62,105	**62,105**			

Diketahui oleh,
Pihak Staf Teknis Dinas PU

AW. HANGDIKA
Pengawas Lapangan

Diperiksa Oleh,
Pihak Konsultan **CV. LATITUDE 79 NUSANTARA**

ASMA HENDRA, ST
Inspector

Pihak Pelaksana,
Kontraktor Pelaksana **PT. STAR MITRA SULAWESI**

SUDARMONO, ST
Mnager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

NAMA PAKET : **PEMBANGUNAN JALAN**
NAMA RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN : **Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)**
NO. ITEM : 6.5.(2)
SATUAN : Ton

NO	STATION	Posisi	CCO				TERPASANG				Panjang	Density	Rata2	Kadar Aspal Minyak	Rata2	Aspal Minyak (Ton)	RUAS 01 : DESA KAWATA				RUAS . 01		KET.
																	Volume (Ton)		Aditif (Kg)		AC - BC (Ton)		
			Lebar	Rata2	Tebal	Rata2	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2							RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	
1	1+550	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,30	4,2	0,057	0,061	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,31	0,005	0,005	27,451	29,305	
2	1+600	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,2	0,065	0,063	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,91	0,005	0,005	27,451	29,905	
3	1+650	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,061	0,062	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,44	0,005	0,005	27,451	29,430	
4	1+700	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,2	0,063	0,060	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	28,49	0,005	0,005	27,451	28,481	
5	1+750	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,057	0,061	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,31	0,005	0,005	27,451	29,305	
6	1+800	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,1	0,065	0,067	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	31,43	0,005	0,005	27,451	31,421	
7	1+850	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,2	0,069	0,067	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	32,19	0,005	0,005	27,451	32,187	
8	1+900	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,40	4,4	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	32,72	0,005	0,005	27,451	32,714	
9	1+950	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,40	4,4	0,065	0,062	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,85	0,005	0,005	27,451	30,849	
10	2+000	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,30	4,3	0,059	0,060	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	28,93	0,005	0,005	27,451	28,924	
11	2+050	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,060	0,062	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,55	0,005	0,005	27,451	29,545	
12	2+100	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,063	0,061	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,07	0,005	0,005	27,451	29,064	
13	2+150	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,058	0,060	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	28,83	0,005	0,005	27,451	28,824	
14	2+200	FULL	4,0		0,06		4,20		0,062			2,288		0,058									
JUMLAH											**650,0**					20,702	356,93	390,02	0,062	0,062	**356,866**	**389,953**	TON
																			62,105	**62,105**			

Diketahui oleh,
Pihak Staf Teknis Dinas PU

AW. HANGDIKA
Pengawas Lapangan

Diperiksa Oleh,
Pihak Konsultan **CV. LATITUDE 79 NUSANTARA**

ASMA HENDRA, ST
Inspector

Pihak Pelaksana,
Kontraktor Pelaksana **PT. STAR MITRA SULAWESI**

SUDARMONO, ST
Mnager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

NAMA PAKET : **PEMBANGUNAN JALAN**
NAMA RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN : **Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)**
NO. ITEM : 6.5.(2)
SATUAN : Ton

NO	STATION	Posisi	CCO				TERPASANG				Panjang	Density	Rata2	Kadar Aspal Minyak	Rata2	Aspal Minyak (Ton)	RUAS 01 : DESA KAWATA				RUAS . 01		KET.
																	Volume (Ton)		Aditif (Kg)		AC - BC (Ton)		
			Lebar	Rata2	Tebal	Rata2	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2							RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	
1	2+200	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,3	0,062	0,062	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,90	0,005	0,005	27,451	29,897	
2	2+250	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,30	4,4	0,061	0,063	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	31,71	0,005	0,005	27,451	31,707	
3	2+300	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,50	4,4	0,065	0,067	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	33,09	0,005	0,005	27,451	33,088	
4	2+350	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,4	0,068	0,067	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	33,09	0,005	0,005	27,451	33,088	
5	2+400	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,50	4,4	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	32,35	0,005	0,005	27,451	32,342	
6	2+450	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,065	0,064	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,38	0,005	0,005	27,451	30,380	
7	2+500	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,1	0,063	0,064	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,02	0,005	0,005	27,451	30,014	
8	2+550	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,2	0,065	0,064	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,38	0,005	0,005	27,451	30,380	
9	2+600	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,063	0,066	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	31,47	0,005	0,005	27,451	31,467	
10	2+650	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,068	0,068	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	32,43	0,005	0,005	27,451	32,428	
11	2+700	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,3	0,067	0,066	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	32,09	0,005	0,005	27,451	32,084	
12	2+750	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,30	4,3	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	31,60	0,005	0,005	27,451	31,598	
13	2+800	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,065	0,064	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,51	0,005	0,005	27,451	30,506	
14	2+850	FULL	4,0		0,06		4,20		0,062			2,288		0,058									
JUMLAH											**650,0**					20,702	356,93	409,04	0,062	0,062	**356,866**	**408,978**	TON
																			62,105	**62,105**			

Diketahui oleh,
Pihak Staf Teknis Dinas PU

AW.HANGDIKA
Pengawas Lapangan

Diperiksa Oleh,
Pihak Konsultan **CV. LATITUDE 79 NUSANTARA**

ASMA HENDRA, ST
Inspector

Pihak Pelaksana,
Kontraktor Pelaksana **PT. STAR MITRA SULAWESI**

SUDARMONO, ST
Mnager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

NAMA PAKET : **PEMBANGUNAN JALAN**
NAMA RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN : **Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)**
NO. ITEM : 6.5.(2)
SATUAN : Ton

NO	STATION	Posisi	CCO				TERPASANG				Panjang	Density	Rata2	Kadar Aspal Minyak	Rata2	Aspal Minyak (Ton)	RUAS 01 : DESA KAWATA				RUAS . 01		KET.
			Lebar	Rata2	Tebal	Rata2	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2							Volume (Ton)		Aditif (Kg)		AC - BC (Ton)		
																	RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	
1	2+850	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,062	0,064	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,51	0,005	0,005	27,451	30,506	
2	2+900	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,3	0,065	0,064	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	31,12	0,005	0,005	27,451	31,112	
3	2+950	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,30	4,2	0,063	0,063	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,27	0,005	0,005	27,451	30,265	
4	3+000	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,2	0,063	0,064	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,38	0,005	0,005	27,451	30,380	
5	3+050	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,065	0,063	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,27	0,005	0,005	27,451	30,265	
6	3+100	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,061	0,059	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	28,35	0,005	0,005	27,451	28,344	
7	3+150	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,3	0,057	0,061	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,66	0,005	0,005	27,451	29,653	
8	3+200	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,30	4,3	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	31,97	0,005	0,005	27,451	31,970	
9	3+250	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,30	4,3	0,065	0,060	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,52	0,005	0,005	27,451	29,510	
10	3+300	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,30	4,3	0,055	0,058	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	28,53	0,005	0,005	27,451	28,527	
11	3+350	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,30	4,3	0,061	0,063	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,39	0,005	0,005	27,451	30,383	
12	3+400	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,3	0,064	0,062	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,25	0,005	0,005	27,451	30,248	
13	3+450	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,40	4,3	0,059	0,062	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,14	0,005	0,005	27,451	30,140	
14	3+500	FULL	4,0		0,06		4,10		0,065			2,288		0,058									
JUMLAH											**650,0**					20,702	356,93	391,37	0,062	0,062	**356,866**	**391,303**	TON
																			62,105	**62,105**			

Diketahui oleh,
Pihak Staf Teknis Dinas PU

AW. HANGDIKA
Pengawas Lapangan

Diperiksa Oleh,
Pihak Konsultan **CV. LATITUDE 79 NUSANTARA**

ASMA HENDRA, ST
Inspector

Pihak Pelaksana,
Kontraktor Pelaksana **PT. STAR MITRA SULAWESI**

SUDARMONO, ST
Mnager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

NAMA PAKET : **PEMBANGUNAN JALAN**
NAMA RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN : **Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)**
NO. ITEM : 6.5.(2)
SATUAN : Ton

NO	STATION	Posisi	CCO				TERPASANG				Panjang	Density	Rata2	Kadar Aspal Minyak	Rata2	Aspal Minyak (Ton)	RUAS 01 : DESA KAWATA				RUAS . 01		KET.
																	Volume (Ton)		Aditif (Kg)		AC - BC (Ton)		
			Lebar	Rata2	Tebal	Rata2	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2							RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	
1	3+500	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,1	0,065	0,064	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,02	0,005	0,005	27,451	30,014	
2	3+550	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,2	0,063	0,066	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	31,47	0,005	0,005	27,451	31,467	
3	3+600	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,30	4,3	0,068	0,063	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,63	0,005	0,005	27,451	30,626	
4	3+650	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,058	0,314	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	149,07	0,005	0,005	27,451	149,070	
5	3+700	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,2	0,570	0,314	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	150,63	0,005	0,005	27,451	150,626	
6	3+750	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,30	4,3	0,057	0,060	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	28,93	0,005	0,005	27,451	28,924	
7	3+800	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,20	4,2	0,062	0,060	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	28,25	0,005	0,005	27,451	28,243	
8	3+850	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,1	0,057	0,059	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	27,10	0,005	0,005	27,451	27,099	
9	3+900	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,060	0,059	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	27,00	0,005	0,005	27,451	26,994	
10	3+950	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,058	0,059	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	27,00	0,005	0,005	27,451	26,994	
11	4+000	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,1	0,060	0,063	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	28,96	0,005	0,005	27,451	28,953	
12	4+050	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,1	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,07	0,005	0,005	27,451	30,064	
13	4+100	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,05	4,1	0,064	0,061	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	28,37	0,005	0,005	27,451	28,362	
14	4+150	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,08	4,1	0,058	0,058	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	26,90	0,005	0,005	27,451	26,899	
15	4+200	FULL	4,0		0,06		4,10		0,057			2,288		0,058									
JUMLAH											**700,0**					22,294	384,38	644,40	0,067	0,067	**356,866**	**617,435**	TON
																			66,883	**66,883**			

Diketahui oleh,
Pihak Staf Teknis Dinas PU

AW. HANGDIKA
Pengawas Lapangan

Diperiksa Oleh,
Pihak Konsultan **CV. LATITUDE 79 NUSANTARA**

ASMA HENDRA, ST
Inspector

Pihak Pelaksana,
Kontraktor Pelaksana **PT. STAR MITRA SULAWESI**

SUDARMONO, ST
Mnager Teknik

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)**
SATUAN : Ton
NO. DIV. : 6.5.(2)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+000	s.d	0+650	FULL	650.00	356.87	389.63	**RUAS. 2**
2	0+650	s.d	1+300	FULL	650.00	356.87	385.65	
3	1+300	s.d	1+650	FULL	350.00	178.43	192.06	
JUMLAH					**1,650.00**	**892.17**	**967.34**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	890.88	Ton
VOLUME USULAN CCO	.....	890.88	Ton

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	Ton
MC UNTUK BULAN INI	.....	890.88	Ton
MC SD BULAN INI	.....	890.88	Ton
SISA VOLUME	.....	-	Ton

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

NAMA PAKET : **PEMBANGUNAN JALAN**
NAMA RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN : **Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)**
NO. ITEM : 6.5.(2)
SATUAN : Ton

NO	STATION	Posisi	CCO				TERPASANG				Panjang	Density	Rata2	Kadar Aspal Minyak	Rata2	Aspal Minyak (Ton)	RUAS 02 : DESA LEDU - LEDU				RUAS . 02		KET.
																	Volume (Ton)		Aditif (Kg)		AC - BC (Ton)		
			Lebar	Rata2	Tebal	Rata2	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2							RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	
1	0+000	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,1	0,060	0,063	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	28,96	0,005	0,005	27,451	28,953	
2	0+050	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,1	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,12	0,005	0,005	27,451	30,111	
3	0+100	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,1	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,12	0,005	0,005	27,451	30,111	
4	0+150	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
5	0+200	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
6	0+250	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,1	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,12	0,005	0,005	27,451	30,111	
7	0+300	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,1	0,065	0,066	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,53	0,005	0,005	27,451	30,530	
8	0+350	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,05	4,0	0,066	0,066	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,16	0,005	0,005	27,451	30,155	
9	0+400	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,1	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,12	0,005	0,005	27,451	30,111	
10	0+450	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,1	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,49	0,005	0,005	27,451	30,483	
11	0+500	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,1	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,12	0,005	0,005	27,451	30,111	
12	0+550	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
13	0+600	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
14	0+650	FULL	4,0		0,06		4,00		0,065			2,288		0,058									
JUMLAH											**650,0**					20,702	356,93	389,70	0,062	0,062	**356,866**	**389,633**	TON
																			62,105	**62,105**			

Diketahui oleh,
Pihak Staf Teknis Dinas PU

AW. HANGDIKA
Pengawas Lapangan

Diperiksa Oleh,
Pihak Konsultan **CV. LATITUDE 79 NUSANTARA**

ASMA HENDRA, ST
Inspector

Pihak Pelaksana,
Kontraktor Pelaksana **PT. STAR MITRA SULAWESI**

SUDARMONO, ST
Mnager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

NAMA PAKET : **PEMBANGUNAN JALAN**
NAMA RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN : **Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)**
NO. ITEM : 6.5.(2)
SATUAN : Ton

NO	STATION	Posisi	CCO				TERPASANG				Panjang	Density	Rata2	Kadar Aspal Minyak	Rata2	Aspal Minyak (Ton)	RUAS 02 : DESA LEDU - LEDU				RUAS . 02		KET.
																	Volume (Ton)		Aditif (Kg)		AC - BC (Ton)		
			Lebar	Rata2	Tebal	Rata2	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2							RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	
1	0+650	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
2	0+700	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
3	0+750	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
4	0+800	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
5	0+850	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,93	0,005	0,005	27,451	29,925	
6	0+900	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,05	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,93	0,005	0,005	27,451	29,925	
7	0+950	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,063	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	28,71	0,005	0,005	27,451	28,702	
8	1+000	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,03	4,0	0,060	0,063	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	28,71	0,005	0,005	27,451	28,702	
9	1+050	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
10	1+100	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
11	1+150	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
12	1+200	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,93	0,005	0,005	27,451	29,925	
13	1+250	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,05	4,1	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,30	0,005	0,005	27,451	30,297	
14	1+300	FULL	4,0		0,06		4,10		0,065			2,288		0,058									
JUMLAH											**650,0**					20,702	356,93	385,71	0,062	0,062	**356,866**	**385,652**	TON
																			62,105	**62,105**			

Diketahui oleh,
Pihak Star Teknis Dinas PU

AW. HANGDIKA
Pengawas Lapangan

Diperiksa Oleh,
Pihak Konsultan **CV. LATITUDE 79 NUSANTARA**

ASMA HENDRA, ST
Inspector

Pihak Pelaksana,
Kontraktor Pelaksana **PT. STAR MITRA SULAWESI**

SUDARMONO, ST
Mnager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

NAMA PAKET : **PEMBANGUNAN JALAN**
NAMA RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA
ITEM PEKERJAAN : **Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)**
NO. ITEM : 6.5.(2)
SATUAN : Ton

NO	STATION	Posisi	CCO				TERPASANG				Panjang	Density	Rata2	Kadar Aspal Minyak	Rata2	Aspal Minyak (Ton)	RUAS 02 : DESA LEDU - LEDU				RUAS . 02		KET.
																	Volume (Ton)		Aditif (Kg)		AC - BC (Ton)		
			Lebar	Rata2	Tebal	Rata2	Lebar	Rata2	Tebal	Rata2							RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	
1	1+300	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,10	4,1	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	30,12	0,005	0,005	27,451	30,111	
2	1+350	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
3	1+400	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
4	1+450	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
5	1+500	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,065	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	29,74	0,005	0,005	27,451	29,739	
6	1+550	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,00	4,0	0,065	0,063	50,00	2,288	2,288	0,058	0,058	1,592	27,46	28,78	0,005	0,005	27,451	28,774	
7	1+600	FULL	4,0	4,0	0,06	0,060	4,05	4,1	0,060	0,061	50,00	2,288	1,144	0,058	0,029	0,398	13,73	14,22	0,001	0,001	13,727	14,217	
8	1+650	FULL	4,0		0,06		4,10		0,062														
JUMLAH											**350,0**					9,953	178,46	192,09	0,030	0,030	**178,434**	**192,059**	TON
																			29,858	**29,858**			

Diketahui oleh,
Pihak Staf Teknis Dinas PU

AW. HANGDIKA
Pengawas Lapangan

Diperiksa Oleh,
Pihak Konsultan **CV. LATITUDE 79 NUSANTARA**

NUSANTARA

ASMA HENDRA, ST
Inspector

Pihak Pelaksana,
Kontraktor Pelaksana **PT. STAR MITRA SULAWESI**

STAR MITRA SULAWESI

SUDARMONO, ST
Manager Teknik

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Beton strukur, fc'20 MPa (Rabat Bahu Jalan)**
SATUAN : m3
NO. DIV. : 7.1 (7a)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	0+915	s.d	1+650	KANAN	735.00	137.81	150.98	
2	1+650	s.d	2+325	KANAN	675.00	126.56	135.11	
3	2+325	s.d	3+000	KANAN	675.00	101.25	118.51	
4	3+000	s.d	3+675	KANAN	675.00	81.00	88.61	
5	3+675	s.d	4+212	KANAN	537.00	80.55	82.84	
1	0+915	s.d	1+575	KIRI	660.00	108.90	118.80	
2	1+575	s.d	2+250	KIRI	675.00	111.38	109.54	
3	2+250	s.d	2+925	KIRI	675.00	103.13	105.53	
4	2+925	s.d	3+600	KIRI	675.00	103.13	89.29	
5	3+600	s.d	4+212	KIRI	612.00	73.44	79.80	
JUMLAH					**6,594.00**	**1,052.92**	**1,079.01**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	1,052.92	m3
VOLUME USULAN CCO	.....	1,052.92	m3

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m3
MC UNTUK BULAN INI	.....	1,052.92	m3
MC SD BULAN INI	.....	1,052.92	m3
SISA VOLUME	.....	-	m3

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Beton Mutu Rendah f'c 20 Mpa (Bahu Jalan)
Nomor Divisi : 7.1 (8)
Satuan : m3

SKETS :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI CCO Lebar	DIMENSI CCO Tebal	DIMENSI TERPASANG L.1	DIMENSI TERPASANG t.1	DIMENSI TERPASANG L.2	DIMENSI TERPASANG t.2	PANJANG	LUASAN CCO	LUASAN PASANG	VOLUME CCO	VOLUME PASANG	KETERANGAN
1	0+915	Kanan	1,25	0,15	0,95	0,15	0,25	0,12	35,00	0,19	0,17	6,56	6,04	
2	0+950	Kanan	1,25	0,15	0,90	0,15	0,20	0,12	50,00	0,19	0,16	9,38	7,95	
3	1+000	Kanan	1,25	0,15	0,95	0,15	0,20	0,12	50,00	0,19	0,17	9,38	8,33	
4	1+050	Kanan	1,25	0,15	0,90	0,15	0,20	0,12	25,00	0,19	0,16	4,69	3,98	
5	1+075	Kanan	1,25	0,15	0,90	0,15	0,35	0,12	25,00	0,19	0,18	4,69	4,43	
6	1+100	Kanan	1,25	0,15	1,05	0,15	0,45	0,12	25,00	0,19	0,21	4,69	5,29	
7	1+125	Kanan	1,25	0,15	1,24	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,25	4,69	6,15	
8	1+150	Kanan	1,25	0,15	1,07	0,15	0,37	0,12	25,00	0,19	0,20	4,69	5,12	
9	1+175	Kanan	1,25	0,15	1,10	0,15	0,45	0,12	25,00	0,19	0,22	4,69	5,48	
10	1+200	Kanan	1,25	0,15	1,05	0,15	0,40	0,12	25,00	0,19	0,21	4,69	5,14	
11	1+225	Kanan	1,25	0,15	1,14	0,15	0,40	0,12	25,00	0,19	0,22	4,69	5,48	
12	1+250	Kanan	1,25	0,15	1,14	0,15	0,40	0,12	25,00	0,19	0,22	4,69	5,48	
13	1+275	Kanan	1,25	0,15	1,10	0,15	0,40	0,12	25,00	0,19	0,21	4,69	5,33	
14	1+300	Kanan	1,25	0,15	0,95	0,15	0,45	0,12	25,00	0,19	0,20	4,69	4,91	
15	1+325	Kanan	1,25	0,15	1,10	0,15	0,45	0,12	25,00	0,19	0,22	4,69	5,48	
16	1+350	Kanan	1,25	0,15	1,00	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,21	4,69	5,25	
17	1+375	Kanan	1,25	0,15	0,97	0,15	0,47	0,12	25,00	0,19	0,20	4,69	5,05	
18	1+400	Kanan	1,25	0,15	1,00	0,15	0,45	0,12	25,00	0,19	0,20	4,69	5,10	
19	1+425	Kanan	1,25	0,15	1,00	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,21	4,69	5,25	
20	1+450	Kanan	1,25	0,15	1,14	0,15	0,45	0,12	25,00	0,19	0,23	4,69	5,63	
21	1+475	Kanan	1,25	0,15	1,13	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,23	4,69	5,74	
22	1+500	Kanan	1,25	0,15	1,30	0,15	0,45	0,12	25,00	0,19	0,25	4,69	6,23	
23	1+525	Kanan	1,25	0,15	1,20	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,24	4,69	6,00	
24	1+550	Kanan	1,25	0,15	1,03	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,21	4,69	5,36	
25	1+575	Kanan	1,25	0,15	1,05	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,22	4,69	5,44	
26	1+600	Kanan	1,25	0,15	1,13	0,15	0,45	0,12	25,00	0,19	0,22	4,69	5,59	
27	1+625	Kanan	1,25	0,15	1,15	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,23	4,69	5,81	
28	1+650	Kanan	1,25	0,15	1,15	0,15	0,45	0,12		0,19	0,23			
								Jumlah	**735,0**			**137,8**	**151,0**	m3

Pihak PUPR Kab.Lutim	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
Bidang Bina marga	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
Pengawas Lapangan	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Beton Mutu Rendah f'c 20 Mpa (Bahu Jalan)
Nomor Divisi : 7.1 (8)
Satuan : m3

SKETS :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI RENCANA Lebar	DIMENSI RENCANA Tebal	DIMENSI CCO L.1	DIMENSI CCO t.1	DIMENSI CCO L.2	DIMENSI CCO t.2	PANJANG	LUASAN RENCANA	LUASAN CCO	VOLUME RENCANA	VOLUME CCO	KETERANGAN
1	1+650	Kanan	1,25	0,15	1,15	0,15	0,45	0,12	25,00	0,19	0,23	4,69	5,66	
2	1+675	Kanan	1,25	0,15	1,01	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,21	4,69	5,29	
3	1+700	Kanan	1,25	0,15	1,15	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,23	4,69	5,81	
4	1+725	Kanan	1,25	0,15	1,05	0,15	0,45	0,12	25,00	0,19	0,21	4,69	5,29	
5	1+750	Kanan	1,25	0,15	1,24	0,15	0,45	0,12	25,00	0,19	0,24	4,69	6,00	
6	1+775	Kanan	1,25	0,15	1,05	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,22	4,69	5,44	
7	1+800	Kanan	1,25	0,15	1,24	0,15	0,45	0,12	25,00	0,19	0,24	4,69	6,00	
8	1+825	Kanan	1,25	0,15	1,15	0,15	0,45	0,12	25,00	0,19	0,23	4,69	5,66	
9	1+850	Kanan	1,25	0,15	1,13	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,23	4,69	5,74	
10	1+875	Kanan	1,25	0,15	1,40	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,27	4,69	6,75	
11	1+900	Kanan	1,25	0,15	1,24	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,25	4,69	6,15	
12	1+925	Kanan	1,25	0,15	1,14	0,15	0,50	0,12	25,00	0,19	0,23	4,69	5,78	
13	1+950	Kanan	1,25	0,15	1,25	0,15	0,45	0,12	25,00	0,19	0,24	4,69	6,04	
14	1+975	Kanan	1,25	0,15	1,30	0,15	0,40	0,12	25,00	0,19	0,24	4,69	6,08	
15	2+000	Kanan	1,25	0,15	1,16	0,15	-	0,12	25,00	0,19	0,17	4,69	4,35	
16	2+025	Kanan	1,25	0,15	0,95	0,15	-	0,12	25,00	0,19	0,14	4,69	3,56	
17	2+050	Kanan	1,25	0,15	0,97	0,15	-	0,12	25,00	0,19	0,15	4,69	3,64	
18	2+075	Kanan	1,25	0,15	1,40	0,15	-	0,12	25,00	0,19	0,21	4,69	5,25	
19	2+100	Kanan	1,25	0,15	1,40	0,15	-	0,12	25,00	0,19	0,21	4,69	5,25	
20	2+125	Kanan	1,25	0,15	1,02	0,15	-	0,12	25,00	0,19	0,15	4,69	3,83	
21	2+150	Kanan	1,25	0,15	1,28	0,15	-	0,12	25,00	0,19	0,19	4,69	4,80	
22	2+175	Kanan	1,25	0,15	1,30	0,15	-	0,12	25,00	0,19	0,20	4,69	4,88	
23	2+200	Kanan	1,25	0,15	1,02	0,15	-	0,12	25,00	0,19	0,15	4,69	3,83	
24	2+225	Kanan	1,25	0,15	0,90	0,15	-	0,12	25,00	0,19	0,14	4,69	3,38	
25	2+250	Kanan	1,25	0,15	1,15	0,15	-	0,12	25,00	0,19	0,17	4,69	4,31	
26	2+275	Kanan	1,25	0,15	0,95	0,15	-	0,12	25,00	0,19	0,14	4,69	3,56	
27	2+300	Kanan	1,25	0,15	0,75	0,15	-	0,12	25,00	0,19	0,11	4,69	2,81	
28	2+325	Kanan	1,25	0,15	1,42	0,15	-	0,12		0,19	0,21			
								Jumlah	**675,0**			**126,6**	**135,1**	m3

Pihak PUPR Kab.Lutim	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
Bidang Bina marga	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
Pengawas Lapangan	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Beton Mutu Rendah f'c 20 Mpa (Bahu Jalan)
Nomor Divisi : 7.1 (8)
Satuan : m3

SKETS :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI RENCANA Lebar	DIMENSI RENCANA Tebal	DIMENSI CCO L.1	DIMENSI CCO t.1	DIMENSI CCO L.2	DIMENSI CCO t.2	PANJANG	LUASAN RENCANA	LUASAN CCO	VOLUME RENCANA	VOLUME CCO	KETERANGAN
1	2+325	Kanan	1,00	0,15	0,98	0,15		0,12	25,00	0,15	0,15	3,75	3,68	
2	2+350	Kanan	1,00	0,15	1,05	0,15		0,12	25,00	0,15	0,16	3,75	3,94	
3	2+375	Kanan	1,00	0,15	0,98	0,15		0,12	25,00	0,15	0,15	3,75	3,68	
4	2+400	Kanan	1,00	0,15	1,00	0,15		0,12	25,00	0,15	0,15	3,75	3,75	
5	2+425	Kanan	1,00	0,15	1,12	0,15	0,40	0,12	25,00	0,15	0,22	3,75	5,40	
6	2+450	Kanan	1,00	0,15	1,02	0,15	0,30	0,12	25,00	0,15	0,19	3,75	4,73	
7	2+475	Kanan	1,00	0,15	1,40	0,15	0,45	0,12	25,00	0,15	0,26	3,75	6,60	
8	2+500	Kanan	1,00	0,15	0,70	0,15	0,35	0,12	25,00	0,15	0,15	3,75	3,68	
9	2+525	Kanan	1,00	0,15	0,98	0,15	0,30	0,12	25,00	0,15	0,18	3,75	4,58	
10	2+550	Kanan	1,00	0,15	0,95	0,15	0,45	0,12	25,00	0,15	0,20	3,75	4,91	
11	2+575	Kanan	1,00	0,15	0,77	0,15	0,40	0,12	25,00	0,15	0,16	3,75	4,09	
12	2+600	Kanan	1,00	0,15	1,12	0,15	0,48	0,12	25,00	0,15	0,23	3,75	5,64	
13	2+625	Kanan	1,00	0,15	1,05	0,15	0,40	0,12	25,00	0,15	0,21	3,75	5,14	
14	2+650	Kanan	1,00	0,15	0,82	0,15	0,40	0,12	25,00	0,15	0,17	3,75	4,28	
15	2+675	Kanan	1,00	0,15	1,08	0,15	0,47	0,12	25,00	0,15	0,22	3,75	5,46	
16	2+700	Kanan	1,00	0,15	0,95	0,15	0,43	0,12	25,00	0,15	0,19	3,75	4,85	
17	2+725	Kanan	1,00	0,15	0,90	0,15	0,35	0,12	25,00	0,15	0,18	3,75	4,43	
18	2+750	Kanan	1,00	0,15	0,90	0,15	0,35	0,12	25,00	0,15	0,18	3,75	4,43	
19	2+775	Kanan	1,00	0,15	1,00	0,15	0,43	0,12	25,00	0,15	0,20	3,75	5,04	
20	2+800	Kanan	1,00	0,15	0,65	0,15	0,40	0,12	25,00	0,15	0,15	3,75	3,64	
21	2+825	Kanan	1,00	0,15	0,72	0,15	0,35	0,12	25,00	0,15	0,15	3,75	3,75	
22	2+850	Kanan	1,00	0,15	0,80	0,15	0,42	0,12	25,00	0,15	0,17	3,75	4,26	
23	2+875	Kanan	1,00	0,15	0,67	0,15	0,40	0,12	25,00	0,15	0,15	3,75	3,71	
24	2+900	Kanan	1,00	0,15	0,80	0,15	0,42	0,12	25,00	0,15	0,17	3,75	4,26	
25	2+925	Kanan	1,00	0,15	0,70	0,15	0,32	0,12	25,00	0,15	0,14	3,75	3,59	
26	2+950	Kanan	1,00	0,15	0,70	0,15	0,32	0,12	25,00	0,15	0,14	3,75	3,59	
27	2+975	Kanan	1,00	0,15	0,68	0,15	0,30	0,12	25,00	0,15	0,14	3,75	3,45	
28	3+000	Kanan	1,00	0,15	0,62	0,15	0,30	0,12		0,15	0,13			
								Jumlah	**675,0**			**101,3**	**118,5**	m3

Pihak PUPR Kab.Lutim	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
Bidang Bina marga	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
Pengawas Lapangan	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Beton Mutu Rendah f'c 20 Mpa (Bahu Jalan)
Nomor Divisi : 7.1 (8)
Satuan : m3

SKETS :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI RENCANA Lebar	DIMENSI RENCANA Tebal	DIMENSI CCO L.1	DIMENSI CCO t.1	DIMENSI CCO L.2	DIMENSI CCO t.2	PANJANG	LUASAN RENCANA	LUASAN CCO	VOLUME RENCANA	VOLUME CCO	KETERANGAN
1	3+000	KANAN	0,80	0,15	0,62	0,15	0,30	0,12	25,00	0,12	0,13	3,00	3,23	
2	3+025	KANAN	0,80	0,15	0,40	0,15	0,20	0,12	25,00	0,12	0,08	3,00	2,10	
3	3+050	KANAN	0,80	0,15	0,60	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,09	3,00	2,25	
4	3+075	KANAN	0,80	0,15	0,92	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,14	3,00	3,45	
5	3+100	KANAN	0,80	0,15	0,65	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,10	3,00	2,44	
6	3+125	KANAN	0,80	0,15	0,85	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,13	3,00	3,19	
7	3+150	KANAN	0,80	0,15	0,90	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,14	3,00	3,38	
8	3+175	KANAN	0,80	0,15	0,88	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,13	3,00	3,30	
9	3+200	KANAN	0,80	0,15	0,95	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,14	3,00	3,56	
10	3+225	KANAN	0,80	0,15	1,20	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,18	3,00	4,50	
11	3+250	KANAN	0,80	0,15	1,06	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,16	3,00	3,98	
12	3+275	KANAN	0,80	0,15	1,00	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,15	3,00	3,75	
13	3+300	KANAN	0,80	0,15	1,00	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,15	3,00	3,75	
14	3+325	KANAN	0,80	0,15	0,60	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,09	3,00	2,25	
15	3+350	KANAN	0,80	0,15	0,65	0,15	0,25	0,12	25,00	0,12	0,13	3,00	3,19	
16	3+375	KANAN	0,80	0,15	0,55	0,15	0,40	0,12	25,00	0,12	0,13	3,00	3,26	
17	3+400	KANAN	0,80	0,15	0,80	0,15	0,40	0,12	25,00	0,12	0,17	3,00	4,20	
18	3+425	KANAN	0,80	0,15	0,82	0,15	0,40	0,12	25,00	0,12	0,17	3,00	4,28	
19	3+450	KANAN	0,80	0,15	0,80	0,15	0,35	0,12	25,00	0,12	0,16	3,00	4,05	
20	3+475	KANAN	0,80	0,15	0,80	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,12	3,00	3,00	
21	3+500	KANAN	0,80	0,15	0,82	0,15		0,12	25,00	0,12	0,12	3,00	3,08	
22	3+525	KANAN	0,80	0,15	0,88	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,13	3,00	3,30	
23	3+550	KANAN	0,80	0,15	0,80	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,12	3,00	3,00	
24	3+575	KANAN	0,80	0,15	0,83	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,12	3,00	3,11	
25	3+600	KANAN	0,80	0,15	0,85	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,13	3,00	3,19	
26	3+625	KANAN	0,80	0,15	0,80	0,15	-	0,12	25,00	0,12	0,12	3,00	3,00	
27	3+650	KANAN	0,80	0,15	0,52	0,15	0,30	0,12	25,00	0,12	0,11	3,00	2,85	
28	3+675	KANAN	0,80	0,15	1,35	0,15	0,45	0,12		0,12	0,26			
								Jumlah	**675,0**			**81,0**	**88,6**	m3

Pihak PUPR Kab.Lutim Bidang Bina marga	Pihak Konsultan CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	Pihak Penyedia Jasa PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika Pengawas Lapangan	Asma Hendra, ST Inspector	Sugiarmono, ST Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Beton Mutu Rendah f'c 20 Mpa (Bahu Jalan)
Nomor Divisi : 7.1 (8)
Satuan : m3

SKETS :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI RENCANA Lebar	DIMENSI RENCANA Tebal	DIMENSI CCO L.1	DIMENSI CCO t.1	DIMENSI CCO L.2	DIMENSI CCO t.2	PANJANG	LUASAN RENCANA	LUASAN CCO	VOLUME RENCANA	VOLUME CCO	KETERANGAN
1	3+675	KANAN	1,00	0,15	1,35	0,15	0,45	0,12	25,00	0,15	0,26	3,75	6,41	
2	3+700	KANAN	1,00	0,15	0,90	0,15	0,30	0,12	25,00	0,15	0,17	3,75	4,28	
3	3+725	KANAN	1,00	0,15	1,00	0,15	0,32	0,12	25,00	0,15	0,19	3,75	4,71	
4	3+750	KANAN	1,00	0,15	1,00	0,15	0,30	0,12	25,00	0,15	0,19	3,75	4,65	
5	3+775	KANAN	1,00	0,15	0,85	0,15	0,30	0,12	25,00	0,15	0,16	3,75	4,09	
6	3+800	KANAN	1,00	0,15	0,90	0,15	0,30	0,12	25,00	0,15	0,17	3,75	4,28	
7	3+825	KANAN	1,00	0,15	0,90	0,15	0,30	0,12	25,00	0,15	0,17	3,75	4,28	
8	3+850	KANAN	1,00	0,15	0,90	0,15	0,45	0,12	25,00	0,15	0,19	3,75	4,73	
9	3+875	KANAN	1,00	0,15	0,90	0,15	0,45	0,12	25,00	0,15	0,19	3,75	4,73	
10	3+900	KANAN	1,00	0,15	0,68	0,15	-	0,12	25,00	0,15	0,10	3,75	2,55	
11	3+925	KANAN	1,00	0,15	0,88	0,15	-	0,12	25,00	0,15	0,13	3,75	3,30	
12	3+950	KANAN	1,00	0,15	0,82	0,15	-	0,12	25,00	0,15	0,12	3,75	3,08	
13	3+975	KANAN	1,00	0,15	0,95	0,15	-	0,12	25,00	0,15	0,14	3,75	3,56	
14	4+000	KANAN	1,00	0,15	1,15	0,15	-	0,12	25,00	0,15	0,17	3,75	4,31	
15	4+025	KANAN	1,00	0,15	1,16	0,15	-	0,12	25,00	0,15	0,17	3,75	4,35	
16	4+050	KANAN	1,00	0,15	0,90	0,15	-	0,12	25,00	0,15	0,14	3,75	3,38	
17	4+075	KANAN	1,00	0,15	0,80	0,15	-	0,12	25,00	0,15	0,12	3,75	3,00	
18	4+100	KANAN	1,00	0,15	0,80	0,15	-	0,12	25,00	0,15	0,12	3,75	3,00	
19	4+125	KANAN	1,00	0,15	0,65	0,15	-	0,12	25,00	0,15	0,10	3,75	2,44	
20	4+150	KANAN	1,00	0,15	0,88	0,15	-	0,12	25,00	0,15	0,13	3,75	3,30	
21	4+175	KANAN	1,00	0,15	0,80	0,15		0,12	37,00	0,15	0,12	5,55	4,44	
22	4+212	KANAN	1,00	0,15	1,00	0,15	-	0,12		0,15	0,15			
								Jumlah	**537,0**			**80,6**	**82,8**	m3

Pihak PUPR Kab.Lutim Bidang Bina marga	Pihak Konsultan CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	Pihak Penyedia Jasa PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika Pengawas Lapangan	Asma Hendra, ST Inspector	Sudarmono, ST Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Beton Mutu Rendah f'c 20 Mpa (Bahu Jalan)
Nomor Divisi : 7.1 (8)
Satuan : m3

SKETS :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI						PANJANG	LUASAN		VOLUME		KETERANGAN
			RENCANA		CCO									
			Lebar	Tebal	L.1	t.1	L.2	t.2		RENCANA	CCO	RENCANA	CCO	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
								Jumlah	-			-	-	m3

Pihak PUPR Kab.Lutim
Bidang Bina marga

AW. Bangdika
Pengawas Lapangan

Pihak Konsultan
CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Asma Hendra, ST
Inspector

Pihak Penyedia Jasa
PT. STAR MITRA SULAWESI

Sudarmono, ST
Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Beton Mutu Rendah f'c 20 Mpa (Bahu Jalan)
Nomor Divisi : 7.1 (8)
Satuan : m3

SKETS :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI RENCANA Lebar	DIMENSI RENCANA Tebal	DIMENSI CCO L.1	DIMENSI CCO t.1	DIMENSI CCO L.2	DIMENSI CCO t.2	PANJANG	LUASAN RENCANA	LUASAN CCO	VOLUME RENCANA	VOLUME CCO	KETERANGAN
1	0+915	Kiri	1,10	0,15	1,10	0,15	-	-		0,17	0,17			
									10,00			1,65	1,65	
2	0+925	Kiri	1,10	0,15	1,12	0,15	-	-		0,17	0,17			
									25,00			4,13	4,20	
3	0+950	Kiri	1,10	0,15	1,10	0,15	-	-		0,17	0,17			
									25,00			4,13	4,13	
4	0+975	Kiri	1,10	0,15	1,18	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,43	
5	1+000	Kiri	1,10	0,15	1,20	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,50	
6	1+025	Kiri	1,10	0,15	1,20	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,50	
7	1+050	Kiri	1,10	0,15	1,20	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,50	
8	1+075	Kiri	1,10	0,15	1,25	0,15	-	-		0,17	0,19			
									25,00			4,13	4,69	
9	1+100	Kiri	1,10	0,15	1,18	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,43	
10	1+125	Kiri	1,10	0,15	1,16	0,15	-	-		0,17	0,17			
									25,00			4,13	4,35	
11	1+150	Kiri	1,10	0,15	1,22	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,58	
12	1+175	Kiri	1,10	0,15	1,20	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,50	
13	1+200	Kiri	1,10	0,15	1,20	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,50	
14	1+225	Kiri	1,10	0,15	1,25	0,15	-	-		0,17	0,19			
									25,00			4,13	4,69	
15	1+250	Kiri	1,10	0,15	1,25	0,15	-	-		0,17	0,19			
									25,00			4,13	4,69	
16	1+275	Kiri	1,10	0,15	1,22	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,58	
17	1+300	Kiri	1,10	0,15	1,16	0,15	-	-		0,17	0,17			
									25,00			4,13	4,35	
18	1+325	Kiri	1,10	0,15	1,17	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,39	
19	1+350	Kiri	1,10	0,15	1,12	0,15	-	-		0,17	0,17			
									25,00			4,13	4,20	
20	1+375	Kiri	1,10	0,15	1,18	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,43	
21	1+400	Kiri	1,10	0,15	1,22	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,58	
22	1+425	Kiri	1,10	0,15	1,25	0,15	-	-		0,17	0,19			
									25,00			4,13	4,69	
23	1+450	Kiri	1,10	0,15	1,25	0,15	-	-		0,17	0,19			
									25,00			4,13	4,69	
24	1+475	Kiri	1,10	0,15	1,22	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,58	
25	1+500	Kiri	1,10	0,15	1,20	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,50	
26	1+525	Kiri	1,10	0,15	1,27	0,15	-	-		0,17	0,19			
									25,00			4,13	4,76	
27	1+550	Kiri	1,10	0,15	1,27	0,15	-	-		0,17	0,19			
									25,00			4,13	4,76	
28	1+575	Kiri	1,10	0,15	1,23	0,15	-	-		0,17	0,18			
								Jumlah	**660,0**			**108,9**	**118,8**	m3

Pihak PUPR Kab.Lutim	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
Bidang Bina marga	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
Pengawas Lapangan	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Beton Mutu Rendah f'c 20 Mpa (Bahu Jalan)
Nomor Divisi : 7.1 (8)
Satuan : m3

SKETS :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI RENCANA Lebar	DIMENSI RENCANA Tebal	DIMENSI CCO L.1	DIMENSI CCO t.1	DIMENSI CCO L.2	DIMENSI CCO t.2	PANJANG	LUASAN RENCANA	LUASAN CCO	VOLUME RENCANA	VOLUME CCO	KETERANGAN
1	1+575	Kiri	1,10	0,15	1,23	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,61	
2	1+600	Kiri	1,10	0,15	1,20	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,50	
3	1+625	Kiri	1,10	0,15	1,20	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,50	
4	1+650	Kiri	1,10	0,15	1,20	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,50	
5	1+675	Kiri	1,10	0,15	1,26	0,15	-	-		0,17	0,19			
									25,00			4,13	4,73	
6	1+700	Kiri	1,10	0,15	1,18	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,43	
7	1+725	Kiri	1,10	0,15	1,16	0,15	-	-		0,17	0,17			
									25,00			4,13	4,35	
8	1+750	Kiri	1,10	0,15	1,20	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,50	
9	1+775	Kiri	1,10	0,15	1,15	0,15	-	-		0,17	0,17			
									25,00			4,13	4,31	
10	1+800	Kiri	1,10	0,15	1,10	0,15	-	-		0,17	0,17			
									25,00			4,13	4,13	
11	1+825	Kiri	1,10	0,15	0,98	0,15	-	-		0,17	0,15			
									25,00			4,13	3,68	
12	1+850	Kiri	1,10	0,15	0,95	0,15	-	-		0,17	0,14			
									25,00			4,13	3,56	
13	1+875	Kiri	1,10	0,15	0,75	0,15	-	-		0,17	0,11			
									25,00			4,13	2,81	
14	1+900	Kiri	1,10	0,15	0,70	0,15	-	-		0,17	0,11			
									25,00			4,13	2,63	
15	1+925	Kiri	1,10	0,15	0,75	0,15	-	-		0,17	0,11			
									25,00			4,13	2,81	
16	1+950	Kiri	1,10	0,15	0,93	0,15	-	-		0,17	0,14			
									25,00			4,13	3,49	
17	1+975	Kiri	1,10	0,15	0,93	0,15	-	-		0,17	0,14			
									25,00			4,13	3,49	
18	2+000	Kiri	1,10	0,15	1,06	0,15	-	-		0,17	0,16			
									25,00			4,13	3,98	
19	2+025	Kiri	1,10	0,15	1,04	0,15	-	-		0,17	0,16			
									25,00			4,13	3,90	
20	2+050	Kiri	1,10	0,15	1,00	0,15	-	-		0,17	0,15			
									25,00			4,13	3,75	
21	2+075	Kiri	1,10	0,15	0,93	0,15	-	-		0,17	0,14			
									25,00			4,13	3,49	
22	2+100	Kiri	1,10	0,15	1,30	0,15	-	-		0,17	0,20			
									25,00			4,13	4,88	
23	2+125	Kiri	1,10	0,15	1,20	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,50	
24	2+150	Kiri	1,10	0,15	1,28	0,15	-	-		0,17	0,19			
									25,00			4,13	4,80	
25	2+175	Kiri	1,10	0,15	1,33	0,15	-	-		0,17	0,20			
									25,00			4,13	4,99	
26	2+200	Kiri	1,10	0,15	1,20	0,15	-	-		0,17	0,18			
									25,00			4,13	4,50	
27	2+225	Kiri	1,10	0,15	1,00	0,15	-	-		0,17	0,15			
									25,00			4,13	3,75	
28	2+250	Kiri	1,10	0,15	1,12	0,15	-	-		0,17	0,17			
								Jumlah	**675,0**			**111,4**	**109,5**	m3

Pihak PUPR Kab.Lutim	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
Bidang Bina marga	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	Asma Hendra, ST	Sudarmono, ST
Pengawas Lapangan	Inspector	Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Beton Mutu Rendah f'c 20 Mpa (Bahu Jalan)
Nomor Divisi : 7.1 (8)
Satuan : m3

SKETS :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI RENCANA Lebar	DIMENSI RENCANA Tebal	DIMENSI CCO L.1	DIMENSI CCO t.1	DIMENSI CCO L.2	DIMENSI CCO t.2	PANJANG	LUASAN RENCANA	LUASAN CCO	VOLUME RENCANA	VOLUME CCO	KETERANGAN
1	2+250	Kiri	1,10	0,15	1,12	0,15	-	-	25,00	0,17	0,17	4,13	4,20	
2	2+275	Kiri	1,10	0,15	1,20	0,15	-	-	25,00	0,17	0,18	4,13	4,50	
3	2+300	Kiri	1,10	0,15	1,08	0,15	-	-	25,00	0,17	0,16	4,13	4,05	
4	2+325	Kiri	1,10	0,15	0,98	0,15	-	-	25,00	0,17	0,15	4,13	3,68	
5	2+350	Kiri	1,10	0,15	1,06	0,15	-	-	25,00	0,17	0,16	4,13	3,98	
6	2+375	Kiri	1,10	0,15	1,30	0,15	-	-	25,00	0,17	0,20	4,13	4,88	
7	2+400	Kiri	1,10	0,15	1,30	0,15	-	-	25,00	0,17	0,20	4,13	4,88	
8	2+425	Kiri	1,10	0,15	1,35	0,15	-	-	25,00	0,17	0,20	4,13	5,06	
9	2+450	Kiri	1,10	0,15	1,30	0,15	-	-	25,00	0,17	0,20	4,13	4,88	
10	2+475	Kiri	1,10	0,15	1,20	0,15	-	-	25,00	0,17	0,18	4,13	4,50	
11	2+500	Kiri	1,10	0,15	1,02	0,15	-	-	25,00	0,17	0,15	4,13	3,83	
12	2+525	Kiri	1,10	0,15	0,93	0,15	-	-	25,00	0,17	0,14	4,13	3,49	
13	2+550	Kiri	1,10	0,15	1,06	0,15	-	-	25,00	0,17	0,16	4,13	3,98	
14	2+575	Kiri	1,10	0,15	0,90	0,15	-	-	25,00	0,17	0,14	4,13	3,38	
15	2+600	Kiri	1,10	0,15	1,00	0,15	-	-	25,00	0,17	0,15	4,13	3,75	
16	2+625	Kiri	1,10	0,15	0,88	0,15	-	-	25,00	0,17	0,13	4,13	3,30	
17	2+650	Kiri	0,90	0,15	0,93	0,15	-	-	25,00	0,14	0,14	3,38	3,49	
18	2+675	Kiri	0,90	0,15	0,90	0,15	-	-	25,00	0,14	0,14	3,38	3,38	
19	2+700	Kiri	0,90	0,15	0,90	0,15	-	-	25,00	0,14	0,14	3,38	3,38	
20	2+725	Kiri	0,90	0,15	0,90	0,15	-	-	25,00	0,14	0,14	3,38	3,38	
21	2+750	Kiri	0,90	0,15	0,94	0,15	-	-	25,00	0,14	0,14	3,38	3,53	
22	2+775	Kiri	0,90	0,15	0,98	0,15	-	-	25,00	0,14	0,15	3,38	3,68	
23	2+800	Kiri	0,90	0,15	1,00	0,15	-	-	25,00	0,14	0,15	3,38	3,75	
24	2+825	Kiri	0,90	0,15	1,15	0,15	-	-	25,00	0,14	0,17	3,38	4,31	
25	2+850	Kiri	0,90	0,15	0,95	0,15	-	-	25,00	0,14	0,14	3,38	3,56	
26	2+875	Kiri	0,90	0,15	0,88	0,15	-	-	25,00	0,14	0,13	3,38	3,30	
27	2+900	Kiri	0,90	0,15	0,93	0,15	-	-	25,00	0,14	0,14	3,38	3,49	
28	2+925	Kiri	0,90	0,15	0,85	0,15	-	-		0,14	0,13			
								Jumlah	**675,0**			**103,1**	**105,5**	m3

Pihak PUPR Kab.Lutim Bidang Bina marga	Pihak Konsultan CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	Pihak Penyedia Jasa PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika Pengawas Lapangan	Asma Hendra, ST Inspector	Sudarmono, ST Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Beton Mutu Rendah f'c 20 Mpa (Bahu Jalan)
Nomor Divisi : 7.1 (8)
Satuan : m3

SKETS :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI RENCANA Lebar	DIMENSI RENCANA Tebal	DIMENSI CCO L.1	DIMENSI CCO t.1	DIMENSI CCO L.2	DIMENSI CCO t.2	PANJANG	LUASAN RENCANA	LUASAN CCO	VOLUME RENCANA	VOLUME CCO	KETERANGAN
1	2+925	Kiri	1,10	0,15	0,85	0,15	-	-		0,17	0,13			
2	2+950	Kiri	1,10	0,15	0,80	0,15	-	-	25,00	0,17	0,12	4,13	3,19	
3	2+975	Kiri	1,10	0,15	0,95	0,15	-	-	25,00	0,17	0,14	4,13	3,00	
4	3+000	Kiri	1,10	0,15	0,73	0,15	-	-	25,00	0,17	0,11	4,13	3,56	
5	3+025	Kiri	1,10	0,15	0,80	0,15	-	-	25,00	0,17	0,12	4,13	2,74	
6	3+050	Kiri	1,10	0,15	0,88	0,15	-	-	25,00	0,17	0,13	4,13	3,00	
7	3+075	Kiri	1,10	0,15	0,90	0,15	-	-	25,00	0,17	0,14	4,13	3,30	
8	3+100	Kiri	1,10	0,15	1,00	0,15	-	-	25,00	0,17	0,15	4,13	3,38	
9	3+125	Kiri	1,10	0,15	0,80	0,15	-	-	25,00	0,17	0,12	4,13	3,75	
10	3+150	Kiri	1,10	0,15	1,00	0,15	-	-	25,00	0,17	0,15	4,13	3,00	
11	3+175	Kiri	1,10	0,15	0,88	0,15	-	-	25,00	0,17	0,13	4,13	3,75	
12	3+200	Kiri	1,10	0,15	0,82	0,15	-	-	25,00	0,17	0,12	4,13	3,30	
13	3+225	Kiri	1,10	0,15	0,78	0,15	-	-	25,00	0,17	0,12	4,13	3,08	
14	3+250	Kiri	1,10	0,15	0,78	0,15	-	-	25,00	0,17	0,12	4,13	2,93	
15	3+275	Kiri	1,10	0,15	0,96	0,15	-	-	25,00	0,17	0,14	4,13	2,93	
16	3+300	Kiri	1,10	0,15	0,90	0,15	-	-	25,00	0,17	0,14	4,13	3,60	
17	3+325	Kiri	0,90	0,15	0,93	0,15	-	-	25,00	0,14	0,14	4,13	3,38	
18	3+350	Kiri	0,90	0,15	0,90	0,15	-	-	25,00	0,14	0,14	3,38	3,49	
19	3+375	Kiri	0,90	0,15	0,91	0,15	-	-	25,00	0,14	0,14	3,38	3,38	
20	3+400	Kiri	0,90	0,15	0,85	0,15	-	-	25,00	0,14	0,13	3,38	3,41	
21	3+425	Kiri	0,90	0,15	0,82	0,15	-	-	25,00	0,14	0,12	3,38	3,19	
22	3+450	Kiri	0,90	0,15	0,80	0,15	-	-	25,00	0,14	0,12	3,38	3,08	
23	3+475	Kiri	0,90	0,15	1,06	0,15	-	-	25,00	0,14	0,16	3,38	3,00	
24	3+500	Kiri	0,90	0,15	0,96	0,15	-	-	25,00	0,14	0,14	3,38	3,98	
25	3+525	Kiri	0,90	0,15	0,80	0,15	-	-	25,00	0,14	0,12	3,38	3,60	
26	3+550	Kiri	0,90	0,15	0,80	0,15	0,25	0,12	25,00	0,14	0,15	3,38	3,00	
27	3+575	Kiri	0,90	0,15	0,75	0,15	0,25	0,12	25,00	0,14	0,14	3,38	3,75	
28	3+600	Kiri	0,90	0,15	0,75	0,15	0,25	0,12	25,00	0,14	0,14	3,38	3,56	
								Jumlah	**675,0**			**103,1**	**89,3**	m3

Pihak PUPR Kab.Lutim Bidang Bina marga	Pihak Konsultan CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	Pihak Penyedia Jasa PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika Pengawas Lapangan	Asma Hendra, ST Inspector	Sudarmono, ST Manager Teknik

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

Paket : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
Pelaksana : PT. STAR MITRA SULAWESI
Konsultan : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

Item Pekerjaan : Beton Mutu Rendah f'c 20 Mpa (Bahu Jalan)
Nomor Divisi : 7.1 (8)
Satuan : m3

SKETS :



NO	STA.	POSISI	DIMENSI RENCANA Lebar	DIMENSI RENCANA Tebal	DIMENSI CCO L.1	DIMENSI CCO t.1	DIMENSI CCO L.2	DIMENSI CCO t.2	PANJANG	LUASAN RENCANA	LUASAN CCO	VOLUME RENCANA	VOLUME CCO	KETERANGAN
1	3+600	Kiri	0,80	0,15	0,75	0,15	0,25	-		0,12	0,11			
2	3+625	Kiri	0,80	0,15	0,93	0,15	0,25	-	25,00	0,12	0,14	3,00	2,81	
3	3+650	Kiri	0,80	0,15	0,93	0,15	-	-	25,00	0,12	0,14	3,00	3,49	
4	3+675	Kiri	0,80	0,15	0,95	0,15	-	-	25,00	0,12	0,14	3,00	3,49	
5	3+700	Kiri	0,80	0,15	0,85	0,15	-	-	25,00	0,12	0,13	3,00	3,56	
6	3+725	Kiri	0,80	0,15	0,85	0,15	-	-	25,00	0,12	0,13	3,00	3,19	
7	3+750	Kiri	0,80	0,15	0,90	0,15	-	-	25,00	0,12	0,14	3,00	3,19	
8	3+775	Kiri	0,80	0,15	0,88	0,15	-	-	25,00	0,12	0,13	3,00	3,38	
9	3+800	Kiri	0,80	0,15	0,92	0,15	-	-	25,00	0,12	0,14	3,00	3,30	
10	3+825	Kiri	0,80	0,15	0,90	0,15	-	-	25,00	0,12	0,14	3,00	3,45	
11	3+850	Kiri	0,80	0,15	0,83	0,15	-	-	25,00	0,12	0,12	3,00	3,38	
12	3+875	Kiri	0,80	0,15	0,85	0,15	-	-	25,00	0,12	0,13	3,00	3,11	
13	3+900	Kiri	0,80	0,15	0,80	0,15	-	-	25,00	0,12	0,12	3,00	3,19	
14	3+925	Kiri	0,80	0,15	0,84	0,15	-	-	25,00	0,12	0,13	3,00	3,00	
15	3+950	Kiri	0,80	0,15	0,80	0,15	-	-	25,00	0,12	0,12	3,00	3,15	
16	3+975	Kiri	0,80	0,15	0,88	0,15	-	-	25,00	0,12	0,13	3,00	3,00	
17	4+000	Kiri	0,80	0,15	0,90	0,15	-	-	25,00	0,12	0,14	3,00	3,30	
18	4+025	Kiri	0,80	0,15	1,00	0,15	-	-	25,00	0,12	0,15	3,00	3,38	
19	4+050	Kiri	0,80	0,15	0,80	0,15	-	-	25,00	0,12	0,12	3,00	3,75	
20	4+075	Kiri	0,80	0,15	1,00	0,15	-	-	25,00	0,12	0,15	3,00	3,00	
21	4+100	Kiri	0,80	0,15	0,88	0,15	-	-	25,00	0,12	0,13	3,00	3,75	
22	4+125	Kiri	0,80	0,15	0,82	0,15	-	-	25,00	0,12	0,12	3,00	3,30	
23	4+150	Kiri	0,80	0,15	0,78	0,15	-	-	25,00	0,12	0,12	3,00	3,08	
24	4+175	Kiri	0,80	0,15	0,78	0,15	-	-	25,00	0,12	0,12	3,00	2,93	
25	4+200	Kiri	0,80	0,15	0,96	0,15	-	-	25,00	0,12	0,14	3,00	2,93	
26	4+212	Kiri	0,80	0,15	0,95	0,15	-	-	12,00	0,12	0,14	1,44	1,73	
								Jumlah	**612,0**			**73,4**	**79,8**	m3

Pihak PUPR Kab.Lutim Bidang Bina marga	Pihak Konsultan CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	Pihak Penyedia Jasa PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika Pengawas Lapangan	Asma Hendra, ST Inspector	Sudarmono, ST Manager Teknik

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

RUAS : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Marka Jalan Termoplastik**
SATUAN : m2
NO. DIV. : 9.2.(1)

NO	STA.			POSISI	PANJANG	VOLUME		KETERANGAN
						CCO	TERPASANG	
1	1+000	s.d	2+300	TENGAH	1,250.0	162.00	162.00	Solid
2	2+300	s.d	3+650	TENGAH	1,350.0	168.00	168.00	Solid
3	3+650	s.d	4+200	TENGAH	550.0	72.00	72.00	Solid
4	0+900	s.d	1+200	TENGAH	150.0	11.25	11.25	Modul
1	0+000	s.d	1+150	TENGAH	450.0	33.75	33.75	Modul
2	0+250	s.d	1+650	TENGAH	1,200.0	150.00	150.00	Solid
JUMLAH					**5,050.0**	**606.00**	**606.00**	

VOLUME KONTRAK AWAL	.....	684.23	m2
VOLUME USULAN CCO	.....	604.62	m2

FINAL QUANTITY

MC UNTUK BULAN LALU	.....	-	m2
MC UNTUK BULAN INI	.....	604.62	m2
MC SD BULAN INI	.....	604.62	m2
SISA VOLUME	.....	-	m2

Diketahui Oleh,	Diperiksa & Disetujui Oleh,	Dibuat Oleh
Direksi Pekerjaan	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PPK	**CV. HEXA PERKASA KONSULTAN**	**PT. STAR MITRA SULAWESI**
S U L A N, ST	**SOPYAN AZIS, ST**	**ROSDANA ABUBEDA, ST**
NIP. 19790712 201001 1 017	Site Engineer	Site Manager

PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

NAMA PAKET : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Marka Jalan Termoplastik**
SATUAN : M2
NO. DIV. : 9.2.(1)

SKETS.
MODUL/EDGE
SOLID

NO	KM./STA	POSISI	UKURAN			VOLUME		KETERANGAN
			LEBAR	RATA2	PANJANG	CCO	TERPASANG	
								RUAS 01. DESA KAWATA
1	1+000	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
2	1+050	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
3	1+100	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
4	1+150	TENGAH	0,12					
		TENGAH						
1	1+200	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
2	1+250	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
3	1+300	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
4	1+350	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
5	1+400	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
6	1+450	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
7	1+500	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
8	1+550	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
9	1+600	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
10	1+650	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
11	1+700	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
12	1+750	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
13	1+800	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
14	1+850	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
15	1+900	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
16	1+950	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
17	2+000	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
18	2+050	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
19	2+100	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
20	2+150	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
21	2+200	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
22	2+250	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
23	2+300	TENGAH	0,12					
		JUMLAH			**1.250**	**162,00**	**162,00**	

Pihak PUPR Kab.Lutim	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
Bidang Bina marga	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Pengawas Lapangan	Inspector	Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

NAMA PAKET : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Marka Jalan Termoplastik**
SATUAN : M2
NO. DIV. : 9.2.(1)

SKETS.
MODUL/EDGE
SOLID

NO	KM./STA	POSISI	UKURAN			VOLUME		KETERANGAN
			LEBAR	RATA2	PANJANG	CCO	TERPASANG	
1	2+300	TENGAH	0,12					
2	2+350	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
3	2+400	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
4	2+450	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
5	2+500	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
6	2+550	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
7	2+600	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
8	2+650	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
9	2+700	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
10	2+750	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
11	2+800	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
12	2+850	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
13	2+900	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
14	2+950	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
15	3+000	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
16	3+050	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
17	3+100	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
18	3+150	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
19	3+200	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
20	3+250	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
21	3+300	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
22	3+350	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
23	3+400	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
24	3+450	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
25	3+500	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
26	3+550	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
27	3+600	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	SOLID
28	3+650	TENGAH	0,12					
		JUMLAH			**1.350**	**168,00**	**168,00**	

Pihak PUPR Kab.Lutim	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
Bidang Bina marga	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Pengawas Lapangan	Inspector	Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

NAMA PAKET : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Marka Jalan Termoplastik**
SATUAN : M2
NO. DIV. : 9.2.(1)

SKETS.

MODUL/EDGE

SOLID

NO	KM./STA	POSISI	UKURAN			VOLUME		KETERANGAN
			LEBAR	RATA2	PANJANG	CCO	TERPASANG	
1	3+650	TENGAH	0,12					
2	3+700	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
3	3+750	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
4	3+800	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
5	3+850	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
6	3+900	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
7	3+950	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
8	4+000	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
9	4+050	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
10	4+100	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
11	4+150	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
12	4+200	TENGAH	0,12					
		JUMLAH			**550**	**72,00**	**72,00**	

Pihak PUPR Kab.Lutim	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
Bidang Bina marga	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Pengawas Lapangan	Inspector	Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

NAMA PAKET : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Marka Jalan Termoplastik**
SATUAN : M2
NO. DIV. : 9.2.(1)

SKETS.
MODUL/EDGE
SOLID

NO	KM./STA	POSISI	UKURAN			VOLUME		KETERANGAN
			LEBAR	RATA2	PANJANG	CCO	TERPASANG	
								RUAS.01 DESA KAWATA
1	0+900	TENGAH	0,12	0,12	50,0	3,75	3,75	*MODUL*
2	0+950	TENGAH	0,12	0,12	50,0	3,75	3,75	*MODUL*
3	1+000	TENGAH	0,12					
1	1+150	TENGAH	0,12	0,12	50,0	3,75	3,75	*MODUL*
2	1+200	TENGAH	0,12					
		JUMLAH			**150**	**11,25**	**11,25**	

Pihak PUPR Kab.Lutim	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
Bidang Bina marga	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Pengawas Lapangan	Inspector	Pelaksana

NUSANTARA

PT. STAR MITRA SULAWESI

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

NAMA PAKET : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Marka Jalan Termoplastik**
SATUAN : M2
NO. DIV. : 9.2.(1)

SKETS.
MODUL/EDGE
SOLID

NO	KM./STA	POSISI	UKURAN			VOLUME		KETERANGAN
			LEBAR	RATA2	PANJANG	CCO	TERPASANG	
								RUAS.02 DESA LEDU LEDU
1	0+250	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
2	0+300	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
3	0+350	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
4	0+400	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
5	0+450	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
6	0+500	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
7	0+550	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
8	0+600	TENGAH	0,12					*SOLID*
								SOLID
1	0+700	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
2	0+750	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
3	0+800	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
4	0+850	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
5	0+900	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
6	0+950	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
7	1+000	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
8	1+050	TENGAH	0,12					*SOLID*
								SOLID
1	1+150	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
2	1+200	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
3	1+250	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
4	1+300	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
5	1+350	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
6	1+400	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
7	1+450	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
8	1+500	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
9	1+550	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
10	1+600	TENGAH	0,12	0,12	50,0	6,00	6,00	*SOLID*
11	1+650	TENGAH	0,12					
		JUMLAH			**1.200**	**150,00**	**150,00**	

Pihak PUPR Kab.Lutim	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
Bidang Bina marga	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asma Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Pengawas Lapangan	Inspector	Pelaksana

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME

NAMA PAKET : **PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU-LEDU (JALAN POROS KECAMATAN 2) DAK**
KONTRAKTOR : PT. STAR MITRA SULAWESI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. LATITUDE 79 NUSANTARA

ITEM PEKERJAAN : **Marka Jalan Termoplastik**
SATUAN : M2
NO. DIV. : 9.2.(1)

SKETS.
MODUL/EDGE
SOLID

NO	KM./STA	POSISI	UKURAN			VOLUME		KETERANGAN
			LEBAR	RATA2	PANJANG	CCO	TERPASANG	
								RUAS.02 DESA LEDU LEDU
1	0+000	TENGAH	0,12					
				0,12	50,0	3,75	3,75	*MODUL*
2	0+050	TENGAH	0,12					
				0,12	50,0	3,75	3,75	*MODUL*
3	0+100	TENGAH	0,12					
				0,12	50,0	3,75	3,75	*MODUL*
4	0+150	TENGAH	0,12					
				0,12	50,0	3,75	3,75	*MODUL*
5	0+200	TENGAH	0,12					
				0,12	50,0	3,75	3,75	*MODUL*
6	0+250	TENGAH	0,12					
1	0+600	TENGAH	0,12					
				0,12	50,0	3,75	3,75	*MODUL*
2	0+650	TENGAH	0,12					
				0,12	50,0	3,75	3,75	*MODUL*
3	0+700	TENGAH	0,12					
1	1+050	TENGAH	0,12					
				0,12	50,0	3,75	3,75	*MODUL*
2	1+100	TENGAH	0,12					
				0,12	50,0	3,75	3,75	*MODUL*
3	1+150	TENGAH	0,12					
		JUMLAH			**450**	**33,75**	**33,75**	

Pihak PUPR Kab.Lutim	Pihak Konsultan	Pihak Penyedia Jasa
Bidang Bina marga	CV. LATITUDE 79 NUSANTARA	PT. STAR MITRA SULAWESI
AW. Hangdika	**Asmi Hendra, ST**	**Sudarmono, ST**
Pengawas Lapangan	Inspector	Pelaksana

NUSANTARA

STAR MITRA SULAWESI
